Списък на документите, съдържащи се в офертата

***За обект**: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.*

Обособена позиция №48. Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. В, вх. Г и вх. Д, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Яне Сандански"

***Наименование на участника**: „СТИЛ КОМПЛЕКС" ООД*
***Име и фамилия на представителя на участника**: Иван Миладинов Достумски*
***Длъжност**: Управител*

1. ***Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (оригинал).***
2. ***Предложение, попълнено по образец - Образец № 1 (оригинал);***
3. ***Документ за регистрация (копие)** или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър **Образец №2***
4. ***Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а"- „д" /без б."е"/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП попълнена по образец - Образец №3 (оригинал).***
5. *Списък – Декларация на строителството **Образец №4***
6. *Референзии 3 бр.*
7. *Списък - Декларация на лицата, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката - **Образец №5**.*
8. *Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие - **Образец №6.***
9. *Документ за внесена гаранция за участие – екземпляр на вносната бележка*
10. *Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора – **Образец №9.***
11. *Декларация по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - **Образец №10***
12. *Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП **Образец №14***
13. *Декларация за липса на обстоятелства по чл. 56, ал. 1, т.11 от ЗОП - **Образец № 15***
14. *Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП. **Образец № 16***
15. *Списък на инженерно-техническия състав и екип от проектанти за изпълнението на поръчката - **Образец № 17***



-Копие от диплома, копие от трудова книжка, копие от обр. На УП-3,копие от осигурителна книжка,копие от референция от АУв България на инж. Иван Достумски

-Копие от Диплома , копие на сертификат № MS-IA-12074-Система за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа, сагл. Изискванията на БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2005, I BS OHSAS 18001:2007, декларация за ангажираност

-Удостоверение за ППП на арх. Димитър Захариев, застраховка,декларация за подновяване на застраховката, декларация за ангажираност

-Удостоверение за ППП на инж. Георги Чекуров, застраховка, декларация за подновяване на застраховката, декларация за ангажираност

-Удостоверения (2) броя за ППП на инж. Здравка Ненчева, застраховка, декларация за подновяване на застраховката, декларация за ангажираност

-Удостоверение за ППП на инж. Александър Чикалов, застраховка, декларация за подновяване на застраховката декларация за ангажираност,

-Удостоверение за ППП на инж. Кръсто Маркулев (2) бр., застраховка, декларация за подновяване на застраховката, декларация за ангажираност-2 бр.

-Удостоверение за ППП и сертификат на инж. Божидар Марков, застраховка декларация за подновяване на застраховката, декларация за ангажираност

16. Декларация за техническа спецификация на матириалите -**Образец № 18**

17. Сертификати за съответствие на материалите

18. *Декларация за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка -* ***Образец № 19***

19. *Декларация за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради -* ***Образец № 20***

20. *Застраховка по чл.* ***171 от ЗУТ***

21. *Декларация за подновяване на застраховка по чл.* ***171 от ЗУТ***

22. ***ISO 9001:2008***

23. ***ISO 14001:2008***

12.08.2016 год.

Изготвил:

/инж. Иван Достумски/

Образец №1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №48. Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. В, вх. Г и вх. Д, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Яне Сандански"

I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта е подадена от: „СТИЛ КОМПЛЕКС" ООД

/наименование на участника/

и подписана от: Иван Миладинов Достумски

/три имена/

в качеството му/им на УПРАВИТЕЛ

/длъжност/

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес 2700, гр. Благоевград, общ. Благоевград, , ул. „Даме Груев" № 21

/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./

Телефон №: 073/887740
факс №: 073/881026
e-mail: office@stilkompleks.com
2. Лице за контакти: Иван Достумски
Длъжност: Управител
Лична карта л. к. № 645149912, издадена на 19.05.2014 г. от МВР – гр. Благоевград
телефон / факс: 073/887740 ; 073/881026
3. Обслужваща банка: Първа инвестиционна банка АД
Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:

IBAN BG98FINV91501016045135
BIC FINVBGSF
Титуляр на сметката „СТИЛ КОМПЛЕКС" ООД
Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:

IBAN BG98FINV91501016045135
BIC FINVBGSF
Титуляр на сметката „СТИЛ КОМПЛЕКС" ООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет при условията, обявени в тази документация и приети от нас.

2. Заявяваме, че представяме оферта за участие в процедурата с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград** по обособени позиции за Сграда с административен адрес ж. к. «Струмско», ул. «Яне Сандански» блок № 3 вх. В, вх. Г и вх. Д

3. Запознати сме и се задължаваме да спазваме условията за участие в процедурата.

4. Запознати сме и се задължаваме да спазваме етичните клаузи на настоящата процедура.

5. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

6. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в откритата процедура.

7. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 180 календарни дни, но не по-малко от **180 календарни дни** от датата на получаване на офертата и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

8. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Като неразделна част от настоящата оферта, представяме **Списък на документите съдържащи се в офертата** в подписан и подпечатан вид.

/Описват се всички представени от участника документи (задължителни и други - по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника и относно подизпълнителите - ако такива се предвиждат, документи относно икономическото и финансово състояние на участника, доказателства за техническите възможности и/или професионална квалификация на участника, които съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП и настоящата документация следва да бъдат поставени в плик № 1 „Документи за подбор"/.

Дата: 05.08.2016 г.

.....

(Подпис и печат)

**** Когато Участник в процедурата е обединение, настоящия образец на оферта се представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението/договорът за създаване на обединение.*

Образец №2

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Подписаният: Иван Миладинов Достумски
(трите имена)
Данни по документ за самоличност Лична карта № 645149912, издадена на 19.05.2014 г. от МВР – гр. Благоевград
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Управител.
(длъжност)

На **„СТИЛ КОМПЛЕКС" ООД** Участник, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**
Обособена позиция №48. Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. В, вх. Г и вх. Д, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Яне Сандански"

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: 101618538

Дата: 05.08.2016 г.
гр. Благоевград

ДЕКЛАРАТОР:
.....
(подпис, печат)


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

КАРТА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ

№ 1001254

Булстат

ИЗДАДЕНА НА 29072002

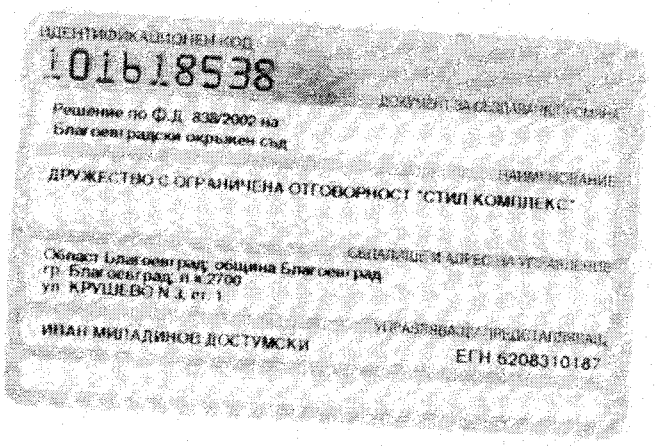
ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД

101618538

ДОКУМЕНТ ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВЕНА ПРОВЕРКА

Решение по Ф.Д. 838/2002 на Благоевградски окръжен съд

НАИМЕНОВАНИЕ

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "СТИЛ КОМПЛЕКС"

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Област Благоевград, община Благоевград
гр. Благоевград, п.к.2700
ул. КРУШЕВО N 3, ет. 1

ИВАН МИЛАДИНОВ ДОСТУМСКИ

УПРАВЛЯВАЩ/ПРЕДСТАВЛЯВАЩ

ЕГН 6208310187

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА.



6

Образец №3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Подписаният: Иван Миладинов Достумски
(три имена)
Данни по документ за самоличност Лична карта № 645149912, издадена на 19.05.2014 г. от МВР – гр. Благоевград

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Управител
(длъжност)

на Участник: **„СТИЛ КОМПЛЕКС” ООД** , в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №48. Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. В, вх. Г и вх. Д, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Яне Сандански”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** осъден с влязла в сила присъда (невярното се зачертава) за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

1. **Не съм** свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
2. **Представляваният от мен участник не е** обявен в несъстоятелност;
3. **Представляваният от мен участник не е** в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
4. **Представляваният от мен участник не се намира** в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;
5. **Не е** виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,
6. **Представляваният от мен участник няма парични задължения** към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.

СТИЛ КОМПЛЕКС Благоевград

7. **Не съм осъден** с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;

8. **Представляваният от мен участник не е** в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 05.08.2016 г.
гр.Благоевград

ДЕКЛАРАТОР: _____

(Подпис и печат)

** Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.*

** Декларацията се попълва от участника съгласно чл.47, ал. 4 от ЗОП, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.*

Образец №4

СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП

на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата с обекти еднакви или сходни с предмета на поръчката.

Подписаният: Иван Миладинов Достумски

(три имена)

Данни по документ за самоличност Лична карта № 645149912, издадена на 19.05.2014 г. от МВР – гр. Благоевград

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Управител

(длъжност)

на „СТИЛ КОМПЛЕКС" ООД

(наименование на участника)

участник: „СТИЛ КОМПЛЕКС" ООД в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №48. Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. В, вх. Г и вх. Д, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Яне Сандански"

ДЕКЛАРИРАМ:

През последните пет години, считано от датата на подаване на офертите, представляваният от мен участник е изпълнил следното строителство еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка:

№ по ред	*строителство (кратко описание)*	*Възложител*	*Период на изпълнение*	*Стойност /лева/*
1	**„Жилищно страда" находяща се в гр. Благоевград, ул. „Даме Груев" № 21- строителство на сграда от изкоп до въвеждане в експлоатация на обекта – изкопни и кофражни работи, бетонови работи, замазки и мазилки, топло и хидроизолации, поставяне на дограма, довършителни работи**	**„Мастърс Инвест Инженеринг" ООД**	**06.01.2010 год. до 30.09.2011 год.**	**698571.00 лв.**
2	**Строително монтажни работи по въвеждане на мерки за енергийна ефективност в пет обекта от образователната инфраструктура на гр. Кюстендил - ЦДГ „Първи**	**Община Кюстендил**	**25.02.2013 год. до 12.09.2013 год.**	**846191.60 лв.**

Стил Комплекс Благоевград

	юни", ОДЗ „Еделвайс"-филиал, ОДЗ „Мечта" – филиал и IV ОУ „Иван Вазов" – топлоизолационна система по фасади, подмяна на дограма, направа на хидроизолазия,			
3	**„Медико-балнеологичен комплекс „Св. Иван Рилски" – Кюстендил, самостоятелно обособена група – Хотел „Кюстендил" , реконструкция на съществуващи сгради" – етап 2 – спа , ресторант, разширение, обслужващи помещения"- земни работи, груб строеж, полагане на бетон, направа на покриви, направа на метални конструкции, довършителни работи, топлоизолация, подмяна на дограма, ел. инсталация, изгр. На ОиВК инсталачии и оборудване довършителни работи до ключ**	**Община Кюстендил**	**18.03.2014 год. до 30.03.2015 год.**	**1337383.11 лв.**

Изпълнението на изискването се доказва с:

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

За „строителство с предмет, сходен с предмета на поръчката", възложителят ще приема: ***СМР по полагане на хидро и топло изолация и поставяне на дограма на сгради.***

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

05.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(Подпис и печат)

Вх.№ 58 / 03.07.2015 год.

Р Е Ф Е Р Е Н Ц И Я

за

СТРОИТЕЛНА ФИРМА "СТИЛ КОМПЛЕКС" ООД – БЛАГОЕВГРАД,
с управител инж. Иван Достумски, за да й послужи за участие в търгове

Управителя на „Мастърс Инвест Инженеринг " ООД издава настоящата референция на фирма "СТИЛ КОМПЛЕКС" ООД - гр. Благоевград, с управител инж. Иван Достумски, като Главен изпълнител на строителен обект „Жилищна сграда" находяща се в гр. Благоевград, ул. „Даме Груев" № 21.

Стойността на проекта е 698 571 лв. Строителството включи изграждане на сграда от изкоп до въвеждане в експлоатация, като бяха извършени следните видове дейности: изкопни работи с обем 3 500,00 м3 на стойност 19 000 лв, кофражни работи с обем 5 700,00 м2 на стойност 98 000 лв, полагане на армировка с обем 85 000,00 гк. на стойност 120 000 лв, бетонови работи с обем 980,00 м3 на стойност 92 000 лв, стенни мазилки и облицовки с обем 2 800,00 м2 на стойност 34 000 лв, подови настилки и замазки с обем 1 800,00 м2 на стойност 24 000 лв, бояджийски работи с обем 2 200,00 м2 на стойност 16 000 лв, хидро- и топлоизолации по фасади с обем 1 480,00 м2 ,покриви и подове с обем 1 050,00 м2 на стойност 68 000 лв. покривна конструкция и покривни работи на стойност 42 171 лв, Отопление, вентилация и климатизация и газификация на стойност 40 400 лв, монтаж на дограма на стойност 75 000 лв, изграждане на ел. инсталация на стойност 24 000 лв, структурно окабеляване на стойност 6 000 лв, изграждане на водопровод и канализация на стойност 22 000 лв, вертикална планировка и озеленяване на стойност 18 000 лв. Строителните работи бяха извършени в периода от 06.01.2010 г. до 30.09.2011 г. с отлично качество от фирма „СТИЛ КОМПЛЕКС" ООД.

Като главен изпълнител на обекта, фирмата спазва точно и коректно договорните си задължения, отлично познава съвременните технологии и материали в строителството и умело ги прилага при изграждането му.

Строително-монтажните работи се изпълниха съгласно нормативните изисквания и високо качество, спазвайки договорените срокове. Всичко това се постига благодарение на високата квалификация на ръководния и технически състав на "СТИЛ КОМПЛЕКС" ООД, които са изградили много добра организация на работа на обекта и съвестно изпълняват своите задължения.

Лице за контакт: Христо Конов – Управител ; тел. 0885/81 80 02

Христо Конов:
Управител

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

11

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
Пкод 2500 Кюстендил
площад „ВЕЛБЪЖД" №1
Регистрационен индекс и дата
№ 35 / 23.06.15

РЕФЕРЕНЦИЯ

От община Кюстендил
гр.Кюстендил,пл."Велбъжд" №1

ЗА ДЕЙНОСТТА НА "СТИЛ КОМПЛЕКС" ООД – БЛАГОЕВГРАД

Настоящата референция е относно договорени и извършени строително- монтажни работи от "СТИЛ КОМПЛЕКС" ООД Благоевград. С дружеството работим съвместно и ползотворно от 2013 г. През целия период отношенията ни се градят на доверие, взаимно разбирателство и уважение. "СТИЛ КОМПЛЕКС" ООД е изпълнител на обект : „Строително монтажни работи по въвеждане на мерки за енергийна ефективност в пет обекта от образователната инфраструктура на гр.Кюстендил – ЦДГ „Първи Юни", ОДЗ „Еделвайс"- централна сграда, ОДЗ „Еделвайс" – филиал, ОДЗ "Мечта"- филиал и IV ОУ "Иван Вазов" изграден за периода от 25.02.2013 г. до 12.09.2013 год. на обща стойност за всички обекти 846 191,60 лв. По време на строителството бяха извършени следните видове работи по обекти:

ЦДГ ПЪРВИ ЮНИ, УПИ I-2272, кв.384

Изпълнение на топлоизолационна система по фасади с обем от 1385 м2 на стойност 63 000,00 лв ; Подмяна на дограма; Направа на топлоизолация на покрив с обем от 1580 м2 на стойност 38 000,00 лв.; Направа на хидроизолация на покрив с обем 1680 м2 на стойност 38 000, 00 лв.; Направа на армирани замазки на покрив с обем 1580 м2; тенекиджийски работи и отводняване на плоски покриви на обща стойност за целия обект 187 363,22 лв.

ОДЗ ЕДЕЛВАЙС ул. Бенковски, УПИ II, кв. 163

Изпълнение на топлоизолационна система по фасади с обем 1240 м2 на стойност 58 000,00 лв. ; Изпълнение на топлоизолации, хидроизолации, армирани замазки, тенекиджийски работи и отводняване на плоски покриви

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

2500, гр. Кюстендил
пл. "Велбъжд" №1
тел. 078/55 11 66
факс: 078/55 10 04
e-mail: obshtina@kustendil.bg

Изграждане на вътрешна отоплителна инсталация на обща стойност за обект 143 907,94 лв.

ДГ ЕДЕЛВАЙС ул. Спартак, УПИ III, кв. 108

Изпълнение на топлоизолационна система по фасади с обем 770 м2 на стойност 31 000,00 лв.; Изграждане на вътрешна отоплителна инсталация на обща стойност за целия обект 68 938,98 лв.

ДГ "МЕЧТА", ПИ 5576, кв. 1

Изпълнение на топлоизолационна система по фасади с обем 1280 м2 на стойност 60 000,00 лв.; изпълнение на топлоизолации на покрив с обем 1080 м2 на стойност 26 000,00 лв, хидроизолации, армирани замазки с обем 1080 м2 на стойност 24 000,00 лв. , тенекиджийски работи и отводняване на плоски покриви; Изграждане на вътрешна отоплителна инсталация; Изграждане на вътрешна газова инсталация; Ремонт на осветителна инсталация за 3 800,00 лв. на обща стойност за целия обект 186 924,65 лв.

IV ОУ "ИВАН ВАЗОВ", УПИ I - за училище, кв. 1

Изпълнение на топлоизолационна система по фасади с обем 980 м2 на стойност 39 000,00 лв.; Изпълнение на дървена конструкция; топлоизолации, хидроизолации, полагане на керемиди, тенекиджийски работи и отводняване на скатни покриви; Изграждане на вътрешна отоплителна инсталация; Изграждане на вътрешна газова инсталация; Ремонт на осветителна инсталация за 3 500 лв.; Подмяна на дограма на обща стойност за целия обект 259 056,81 лв.

Изборът ни се спря на "СТИЛ КОМПЛЕКС" ООД не само поради разумните търговски условия. От огромно значение бе и практическия опит на фирмата в строителството. Тя привлече нашето внимание и с отзивчивостта и професионализма на своите експерти. Фирмата разполага с високо квалифициран и отговорно изпълняващ задълженията си работен персонал.

Строителството на всички обекти е изпълнено в съответствие на нормативните изисквания.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА.

Дружеството се справя с поетите задължения професионално и в уговорените срокове. Работата на "СТИЛ КОМПЛЕКС" ООД се характеризира с акуратност и високо качество.

Като изпълнител на обекта, фирмата отлично познава съвременните технологии и материали в строителството и умело ги прилага при изграждането му.

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
КМЕТ

Петър Паунов
Кмет на Община Кюстендил

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Стилкомплекс
Благоевград

17

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
Р.код 2500 Кюстендил
площад „ВЕЛБЪЖД" №1
Регистрационен индекс и дата
[illegible]

РЕФЕРЕНЦИЯ

От община Кюстендил
гр.Кюстендил,пл."Велбъжд" №1

ЗА ДЕЙНОСТТА НА "СТИЛ КОМПЛЕКС" ООД – БЛАГОЕВГРАД

Настоящата референция е относно договорени и извършени строително- монтажни работи от "СТИЛ КОМПЛЕКС" ООД Благоевград. С дружеството работим съвместно и ползотворно от 2013 г. През целия период отношенията ни се градят на доверие, взаимно разбирателство и уважение. "СТИЛ КОМПЛЕКС" ООД е изпълнител на обект "Медико - балнеологичен комплекс "Св. Иван Рилски" – Кюстендил, самостоятелно обособена група - Хотел "Кюстендил", реконструкция на съществуващи сгради"; – Етап 2 – спа, ресторант – разширение, обслужващи помещения" изграден за периода от 18.03.2014 г. до 30.03.2015 год. на обща стойност за всички обекти 1 337 383,11 лв. По време на строителството бяха извършени следните видове работи: Земни работи; Груб строеж - Изпълнение на кофражни работи, Армировъчни работи, Полагане на бетони, Направа на покриви; Направа на метална конструкция; Довършителни работи – Зидарии, Мазилки шпакловки и облицовки по стени, Топлоизолация и мазилки по фасади с обем 860 м2 на стойност 28 000,00 лв., Топлоизолация на под с обем 1500 м2 на стойност 32 000,00 лв., Подови настилки, Подмяна на вътрешни и фасадни дограми, Боядисване: Ремонт и изграждане на ВиК инсталации и оборудване; Ремонт и изграждане на Електро /силови, осветителни и слаботокови/ инсталации и оборудване, /в това число 280 бр. осветителни тела/ на стойност 75 000,00 лв.; Изграждане на ОиВК и газови инсталации и оборудване; Доставка и монтаж

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

2500, гр. Кюстендил
пл. " Велбъжд " №1
тел. 078/55 11 66
Факс: 078/55 10 04
e-mail: obshtina@kustendil.bg
http://www.kustendil.bg

ОБЩИНА
гр. БЛАГОЕВГРАД

на товарни асансьори и платформи за инвалиди; Доставка и монтаж на технологично оборудване за кухня, ресторант и перално; Доставка и монтаж на обзавеждане.

Строителството на обекта е изпълнено в съответствие на нормативните изисквания.

Изборът ни се спря на "СТИЛ КОМПЛЕКС" ООД не само поради разумните търговски условия. От огромно значение бе и практическия опит на фирмата в строителството. Тя привлече нашето внимание и с отзивчивостта и професионализма на своите експерти. Фирмата разполага с високо квалифициран и отговорно изпълняващ задълженията си работен персонал.

Дружеството се справя с поетите задължения професионално и в уговорените срокове. Работата на "СТИЛ КОМПЛЕКС" ООД се характеризира с акуратност и високо качество.

Като изпълнител на обекта, фирмата отлично познава съвременните технологии и материали в строителството и умело ги прилага при изграждането му.

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ КМЕТ

Петър Паунов
Кмет на Община Кюстендил

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Стил Благо

16

Образец №5

СПИСЪК -ДЕКЛАРАЦИЯ
на квалифицираните работници, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката

Подписаният: Иван Миладинов Достумски

(три имена)

Данни по документ за самоличност . Лична карта № 645149912, издадена на 19.05.2014 г. от МВР – гр. Благоевград

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Управител

(длъжност)

на „СТИЛ КОМПЛЕКС" ООД , ЕИК 101618538

(наименование на участника)

участник: „СТИЛ КОМПЛЕКС" ООД , в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №48. Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. В, вх. Г и вх. Д, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Яне Сандански"

Д Е К Л А Р И Р А М:

На основане чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП ще използваме следния екип за изпълнение на поръчката:

Име, презиме и фамилия	Заемана длъжност	Години проф. стаж	
Александър Кирилов Тодоров	**Работник топлоизолация**	**14 год.**	**Трудов договор**
Занко Чавдаров Кюртов	**Работник топлоизолация**	**15 год.**	**Трудов договор**
Димитър Атанасов Сираков	**Работник топлоизолация**	**4 год.**	**Трудов договор**
Асен Юлиев Кюртов	**Работник топлоизолация**	**16 год.**	**Трудов договор**
Антон Николов Чучуков	**Работник топлоизолация**	**3 год.**	**Трудов договор**
Бисер Росенов Караабов	**Работник топлоизолация**	**8 год.**	**Трудов договор**
Борислав Николов Сотиров	**Работник топлоизолация**	**12 год.**	**Трудов договор**
Васил Димитров Коцелов	**Работник топлоизолация**	**13 год.**	**Трудов договор**

Стил Комплекс Благоевград

17

Асен Киров Христов	Работник топлоизолация	18 год.	Трудов договор
Благой Владимиров Марушкин	Работник топлоизолация	16 год.	Трудов договор
Димитър Георгиев Елинов	Работник хидроизолация	14 год.	Трудов договор
Андон Георгиев Владиков	Работник хидроизолация	6 год.	Трудов договор
Атанас Вангелов Георгиев	Работник хидроизолация	14 год.	Трудов договор
Бенко Яворов Каменов	Работник хидроизолация	9 год.	Трудов договор
Антон Събев Кландов	Работник хидроизолация	2 год.	Трудов договор
Банко Альошев Анев	Ел. работник	14 год.	Трудов договор
Бойко Йорданов Лазарски	Ел. работник	15 год.	Трудов договор
Кирил Николов Георгиев	Работник настилки	26 год.	Трудов договор
Ангел Петров Атанасов	Работник настилки	19 год.	Трудов договор
Занко Каменов Пляков	Работник монтаж дограма	16 год.	Трудов договор
Димитър Благоев Стоилов	Работник монтаж дограма	18 год.	Трудов договор
Васил Димитров Майсторски	Работник монтаж дограма	12 год.	Трудов договор
Владимир Иванов Митов	Работник монтаж дограма	5 год.	Трудов договор
Димитър Альошов Глушинов	Работник монтаж дограма	14 год.	Трудов договор
Бойко Спасов Габерски	Работник монтаж дограма	13 год.	Трудов договор
Драгийчо Крумов Тасев	Бояджия	28 год.	Трудов договор
Славейко Стефанов Марков	Бояджия	15 год.	Трудов

			договор
Димитър Иванов Чифутски	**Бояджия**	**18 год.**	**Трудов договор**
Даниел Мирчев Василев	**Общ работник в строителството**	**22 год.**	**Трудов договор**
Иван Киров Стоянов	**Общ работник в строителството**	**18 год.**	**Трудов договор**
Иван Кръстев Иванов	**Общ работник в строителството**	**21 год.**	**Трудов договор**
Иван Василев Ангелов	**Общ работник в строителството**	**32 год.**	**Трудов договор**
Петко Христов Велчев	**Общ работник в строителството**	**22 год.**	**Трудов договор**
Боян Борисов Георгиев	**Общ работник в строителството**	**25 год.**	**Трудов договор**
Боян Лазаров Шушев	**Общ работник в строителството**	**19 год.**	**Трудов договор**

При необходимост фирмата ще наеме допълнително работници съобразно диаграмата на работната ръка.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

05.08.2016 **г.**
(дата на подписване)

Декларатор: .....
(Подпис и печат)

Образец №6

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за участието или неучастието на подизпълнители
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният Иван Миладинов Достумски , с лична карта № 645149912, издадена на 19.05.2014 г. от МВР – гр. Благоевград с ЕГН 6208310187, в качеството ми на Управител на - *(посочете длъжността)* „СТИЛ КОМПЛЕКС" ООД *(посочете фирмата на участника)* **участник в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №48. Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. В, вх. Г и вх. Д, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Яне Сандански"

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът „СТИЛ КОМПЛЕКС" ООД
(посочете фирмата на участника),
когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използва подизпълнители;
2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:.....,
(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),
които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;
3. Видът на работите и дейностите, които ще извършва подизпълнителя са следните: .....
.....
4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчата ще бъде .....% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

05.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
(Подпис и печат)

* *Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.*

Банкадск

До клон Благоевград

адрес

Уникален регистрационен номер:

Дата на подаване

подпис на нареждащото лице

Платец на - име на получателя

Чуждестранно лице по смисъла на Валутния закон

IBAN на получателя

BIC на банката на получателя

При банка - име на банката на получателя

Вид плащане***

ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ / ВНОСНА БЕЛЕЖКА
за плащане от/към бюджета

Вид валута BGN Сума

Сума с думи

Основание за плащане

Още пояснения

Вид док.* | Номер на документа, по който се плаща | Дата(ддммгггг) на документа

Период, за който се плаща
От дата (ддммгггг) До дата (ддммгггг)

Задължено лице - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице

Чуждестранно лице по смисъла на Валутния закон

БУЛСТАТ на задълженото лице | ЕГН на задълженото лице | ЛНЧ на задълженото лице

Наредител - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице

IBAN на наредителя
BG 87 STSA 9300 0019137691

BIC на банката на наредителя
STSABGSF

Платежна система | Такси** | Дата за изпълнение | Вид плащане***

15.08.2016

Счетоводител | Касиер

чл. 21 ал. 2 ЗПИ

***Вид документ:**
1 - декларация
2 - ревизионен акт
3 - наказ. постановление
4- авансова вноска
5- парт. номер на имот
6. постановление за принуд. събиране
9 - други

****Такси:**
за сметка на наредителя
2 - споделени (стандарт за местни преводи)
3 - за сметка на получателя

*****Вид плащане** - попълва се за сметки на администратори на приходи и на Централния бюджет

Образец №9

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: Иван Миладинов Достумски
(три имена)
Данни по документ за самоличност л.к. № 645149912, издадена на 19.05.2014 г. от МВР – гр. Благоевград
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Управител
(длъжност)
на „СТИЛ КОМПЛЕКС" ООД
(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.
Обособена позиция № 48. Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. В, вх. Г и вх. Д, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Яне Сандански"

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

05.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
(Подпис и печат)

СтилКомплекс ООД Благоевград

22

Образец №10

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: Иван Миладинов Достумски

(три имена)

Данни по документ за самоличност № 645149912, издадена на 19.05.2014 г. от МВР – гр. Благоевград

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Управител

(длъжност)

на „СТИЛ КОМПЛЕКС" ООД

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции

Обособена позиция №48. Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. В, вх. Г и вх. Д, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Яне Сандански"

Д Е К Л А Р И Р А М:

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на хипотезата по чл. 5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от процедурата по възлагане на обществената поръчка.

05.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(Подпис и печат)

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №14

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Подписаният Иван Миладинов Достумски
(трите имена)
ЕГН 6208310187, л.к. № 645149912, издадена на 19.05.2014 г. от МВР – гр. Благоевград

(данните от документа за самоличност)
в качеството си на Управител (длъжност)
на участник: „СТИЛ КОМПЛЕКС" ООД
с адрес: гр. Благоевград ул. „Даме Груев" № 21,
тел.: 073/887740 , факс: 073/881026, e-mail: office@stilkompleks.com
регистриран по ф.д. № 838/2002 г. по описа на Благоевградски окръжен съд,
ЕИК / Булстат: 101618538,
(наименование и данни на участника)
Във връзка с участието на „СТИЛ КОМПЛЕКС" ООД (наименование на участника)
в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции

Обособена позиция № 48. Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. В, вх. Г и вх. Д, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Яне Сандански"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** свързано лице или свързано предприятие с кандидати или участници, подали самостоятелни оферти в процедурата.
2. **Не съм** участвал като външен експерт в разработването на документацията за участие в настоящата процедура.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 05.08.2016 г.

гр.Благоевград

ДЕКЛАРАТОР: _____
(Подпис и печат)

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №15

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Долуподписаният Иван Миладинов Достумски лична карта № 645149912, издадена на 19.05.2014 г. от МВР – гр. Благоевград , с ЕГН 6208310187, в качеството ми на Управител
(посочете длъжността)

на „СТИЛ КОМПЛЕКС" ООД

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**, по обособени позиции

Обособена позиция № 48. Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. В, вх. Г и вх. Д, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Яне Сандански"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

при определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията за минимална цена на труда, определени съгласно §1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 05.08.2016 год.
Име и фамилия Иван Достумски
Длъжност Управител
Подпис и печат

СтилКомплекс Благоевград

Образец № 16

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 51, ал. 1,т. 9 от ЗОП

Долуподписаният Иван Миладинов Достумски , в качеството си на Управител на „СТИЛ КОМПЛЕКС" ООД

/посочване на наименованието на участника/,

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград, по обособени позиции

Обособена позиция № 48. Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. В, вх. Г и вх. Д, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Яне Сандански"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Техническото оборудване, с което разполагаме е следното :

1. Заваръчен апарат –	1 бр. - собствен
2. Оградни пана –	300 м.л. - собствени
3. Тръбно скеле -	3000 м2, - собствени
4. Пробивна техника -	5 бр., - собствени
5. Лекотоварни автомобили -	2 бр. - собствени

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:. 05.08.2016 г.

ПОДПИСИ: . . . . . .

(Подпис и печат)

Образец № 17

СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

„СТИЛ КОМПЛЕКС" ООД /посочете фирмата на участника/, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**, по обособени позиции

Обособена позиция №48. Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. В, вх. Г и вх. Д, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Яне Сандански"

открита с решение РП № - 16 от 07.04.2016 год. и решение за промяна № РП-23/29.07.2016 г. на Кмета на Община Благоевград

Участникът „СТИЛ КОМПЛЕКС" ООД (посочете наименованието на участника), който представлявам, ще използва следният екип за изпълнение на поръчката:

№ по ред	СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Квалификация	Общ професионален опит
1.	***Строителен инженер***	*Иван Миладинов Достумски*	*Диплома №01488/1986 г. Рег. № 1433-ВНВСУ"Ген. Благой Иванов" -София*	***30 год.**- Технически ръководител,Главен инженер, Технически директор, Началник строителен обект*
2.	***Контрол по качеството***	*Стоян Димитров Вретенаров*	*Диплома № 002432/1990 год. Рег. № 0379-ВВИСУ"Любен Каравелов" -София*	***26 год.** – Технически ъководител, Началник обект, Контрол по качеството, Главен инженер*

**общ проф.опит е опита по специалността*

№ по ред	СПИСЪК НА ПРОЕКТАНТСКИЯ ЕКИП			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Проектантска правоспособност	Общ професионален опит

	Ръководител екип-Архитект	*Арх. Димитър Йорданов Захариев*	*Удостоверение за ППП № 01277*	*12 год.*
	Конструктор	*Инж. Георги Николов Чекуров*	*Удостоверение за ППП № 41295*	*10 год.*
	Проектант по част „Енергийна ефективност”	*Инж. Здравка Славчева Ненчева*	*Удостоверение за професионална квалификация № ЕЪ 574/30 април 2010 год.*	*10 год.*
	Проектант по част „ОВК”	*Инж. Здравка Славчева Ненчева*	*Удостоверение за ППП № 01242*	*10 год.*
	Проектант по част „Електро”	*Инж. Александър Георгиев Чикалов*	*Удостоверение за ППП № 12231*	*10 год.*
	Специалист по здравословни и безопасни условия на труд	*Инж.Кръсто Янев Маркулев*	*Удостоверение ПБЗ-№00330*	*10 год.*
	Проектант по част „Пожарна безопасност”	*Инж. Божидар Първанов Марков*	*Удостоверение за ППП № 00708*	*10 год.*
	Проектант по част „ПБЗ”	*Инж.Кръсто Янев Маркулев*	*Удостоверение ПБЗ-№00330*	*10 год.*
	Проектант по част „Управление на отпадъците”	*Инж. Божидар Първанов Марков*	*Сертификат № 00098/19.11.2013 год.*	*10 год.*

1. През целия период на изпълнение на обществената поръчка ще осигуря активното участие на горепосочените експерти.
2. Прилагам 7 (седем) броя декларации за ангажираност на еспертите.

Дата: 12.08.2016 год. Декларатор : .....

(Подпис и печат)

28

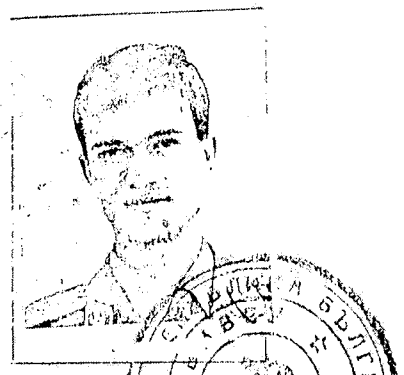

(саморъчен подпис)

НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВИВСУ „ГЕН. БЛАГОЙ ИВАНОВ"
носител на орден „Народна Република България" I степен

ДИПЛОМА

ЗА ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
№ 01488

Притежателят на тази диплома лейт. инженер Иван Николаев Костунски роден на 31.08.1962 г. в гр. (с) Благоевград окръг Благоевградски постъпил през 1981 г. и завършил през 1986 г. пълния курс на ВИВСУ „Ген. Бл. Иванов" по специалността ПРОМИШЛЕНО И ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО със среден успех от изпитите през курса на следването Добър 4,10 и успех от държавните изпити Мн. добър 4,75

С решение на Държавната изпитна комисия от 1986 г. му се присвоява военна квалификация военен инженер по технология на строителството

На основание указ № 1815 от 16 август 1973 г. му се признава висше образование и има приравнена гражданска квалификация строит. инженер по технология на строителството

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА ИЗПИТНА КОМИСИЯ
ген.-лейт. /Петров/
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ВИВСУ „ГЕН. БЛ. ИВАНОВ"
ген.-полковник /Маунов/

гр. София 1986

Регистрационен № 1433

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

1 – 660 Обр. УП – № 30

Наименование и адрес на учреждението, предприятието, организацията и др.
Строителни войски – поделение 62560

№ 992 | дата 02.08. 1995 г. | гр. София

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Наименование и адрес на учреждението, предприятието
Строителни войски – под. 62560 – София

Удостоверява се (трите имена по паспорт)
Иван Миладинов Достумски

Роден(а) на 31.08 1962 г. | в гр. (се) Благоевград | област

е служил(а) при същото, както е означено

№ по ред	Наименование на длъжностите, които е заемало лицето	Трудов стаж, начислен по реда на § 96, 97 или 99 от Правилника за прилагане на Закона за пенсиите: от ден, мес. година	до ден, мес. година	Всичко: година	месеци	дни
1	2	3	4	5		
	Офицер	30.8.86	19.1.94	7	4	19
	Словом: седем години, четири месеца и деветнадесет дни					

Настоящото се издава на основание изплащателните документи, намиращи се в _____ за да послужи при пенсиониране, съгласно чл.101 от ПЛЗН и Инструкцията за реда и начина за издаване на документи за трудов стаж (ДВ бр.20/1968 г.). За невярно описания длъжностни лица, подписали удостоверението, както и ползуващите го, носят отговорност по Наказателния кодекс.

Изготвил: _____ Гл. счетоводител: _____ Ръководител: _____

УПЪТВАНЕ

за попълване на удостоверение обр. УП – 30, съгласно Инструкцията за реда и начина за издаване на документи за трудов стаж (Д. В. бр. 20 от 12 март 1968 год., допълнение Д. В., бр. 48, 75 год.).

1. В графа 2 се вписва длъжността, която лицето е заемало, или работата която е извършвало. В тази графа на отделен ред се посочва причината, поради която през известен период лицето не е работило, ако това време се счита за трудов стаж по Закона за пенсиите, напр. при ползуване на отпуск по болест, поради бременност и раждане, платен или неплатен отпуск.

Точното означаване на длъжността или извършената работа е от значение за правилното определяне категорията на труда при пенсиониране за изслужено време и старост, съгласно Правилника за категоризиране на труда при пенсиониране.

2. В графа 3 се вписва датата (ден, месец и година), на която лицето е постъпило на работа или преустановило ползуването на неплатен отпуск, ако този отпуск не се зачита за трудов стаж.

3. В графа 4 се вписват датата (ден, месец и година), на която лицето е напуснало работа или е започнало ползуването на неплатен отпуск, ако този отпуск не се зачита за трудов стаж.

4. В графа 5 се вписва трудовия стаж за времето, посочено в графи 3 и 4, изчислен по начина, посочен в §§ 95 и 98 от Правилника за прилагане на Закона за пенсиите (публикуван в „Известия" бр. 4, 1958 г., изменен и допълнен – ДВ бр. 102 ,1967 г.).

Трудовият стаж се изчислява в години, месеци и дни. За един месец трудов стаж се зачита календарният месец, през който са изработени най-малко 25 дни. При изработени по-малко от 25 дни месечно, трудовият стаж се признава за толкова месеца, колкото се получават като се разделя общия брой на изработените дни на 25. Изискването за изработени най-малко 25 дни не се отнася за календарните месеци, които имат по-малко работни дни. Те се зачитат за пълни месеци, ако са изработени всичките им работни дни. Трудовият стаж на работилите в производства, където е въведена работна седмица по-малко от 6 дни се изчислява, като се разделя общия брой на изработените дни на 21. Месеците през които са изработени 21 и повече дни, се считат за пълни месеци. В случаите, когато лицето е работило непълен календарен месец, в удостоверението се вписва: съответния брой на календарните дни – за работниците и служителите, заплащани месечно и броя на изработените дни – за останалите работници. Трудовият стаж на работниците и служителите, заплащани месечно, се изчислява, като календарните дни се делят на 30.

Строителни войски София Благоевград

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

36

1 – 660 Обр УП – № 30

Наименование и адрес на учреждението, предприятието, организацията и др.
Об. Т.Т.Ч. бул 62 бр

№ 1634 | дата 12.12.1995 г. | гр. София

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Наименование и адрес на учреждението, предприятието
Об. Т.Т.Ч. бул 62 бр - София бул - цар Борис III № 54

Удостоверява че (трите имена по паспорт)
Иван Николаев Добрински

Роден(а) на 31.08.1962 г. | в гр. (с) Благоевград | област Софийска

е служил(а) при същото, както е означено:

№ по ред	Наименование на длъжностите, които е заемало лицето *	Трудов стаж, начислен по реда на § 96, 97 или 99 от Правилника за прилагане на Закона за пенсиите: от ден, мес. година	до ден, мес. година	Всичко: година	месеци	дни
1	2	3	4	5		
1.	Техническа ръководителка	19.01.94	31.05.95	1	4	12
	Общо: една година, четири месеца и дванадесет дни.					

Настоящото се издава на основание изплащателните документи, намиращи се в _____ за да послужи при пенсиониране, съгласно чл. 101 от ППЗП и Инструкцията за реда и начина за издаване на документи за трудов стаж (ДВ бр.20/1968 г.). За неверни вписания длъжностни лица, подписали удостоверението, както и ползващите го, носят отговорност по Наказателния кодекс.

Изготвил: _____ Гл. счетоводител: _____ Ръководител: _____

УПЪТВАНЕ

за попълване на удостоверение обр. УП – 30, съгласно Инструкцията за реда и начина за издаване на документи за трудов стаж (Д. В. бр. 20 от 12 март 1968 год., допълнение Д. В., бр. 48, 75 год.)

1. В графа 2 се вписва длъжността, която лицето е заемало, или работата която е извършвало. В тази графа на отделен ред се посочва причината, поради която през известен период лицето не е работило, ако това време се счита за трудов стаж по Закона за пенсиите, напр. при ползуване на отпуск по болест, поради бременност и раждане, платен или неплатен отпуск.

Точното означаване на длъжността или извършената работа е от значение за правилното определяне категорията на труда при пенсиониране за изслужено време и старост, съгласно Правилника за категоризиране на труда при пенсиониране.

2. В графа 3 се вписва датата (ден, месец и година), на която лицето е постъпило на работа или преустановило ползуването на неплатен отпуск, ако този отпуск не се зачита за трудов стаж.

3. В графа 4 се вписват датата (ден, месец и година), на която лицето е напуснало работа или е започнало ползуването на неплатен отпуск, ако този отпуск не се зачита за трудов стаж.

4. В графа 5 се вписва трудовия стаж за времето, посочено в графи 3 и 4, начислен по начина, посочен в §§ 96 и 98 от Правилника за прилагане на Закона за пенсиите (публикуван в „Известия" бр. 5, 1958 г., изменен и допълнен – ДВ бр. 102 ,1967 г.).

Трудовият стаж се изчислява в години, месеци и дни. За един месец трудов стаж се зачита календарният месец, през който са изработени най-малко 25 дни. При изработени по-малко от 25 дни месечно, трудовият стаж се признава за толкова месеца, колкото се получават като се раздели общия брой на изработените дни на 25. Изискването за изработени най-малко 25 дни не се отнася за календарните месеци, които имат по-малко работни дни. Те се зачитат за пълни месеци, ако са изработени всичките им работни дни. Трудовият стаж на работилите в производства, където е въведена работна седмица по-малко от 6 дни се изчислява, като се раздели общия брой на изработените дни на 21. Месеците през които са изработени 21 и повече дни, се считат за пълни месеци. В случаите, когато лицето е работило непълен календарен месец, в удостоверението се вписва: съответния брой на календарните дни – за работниците и служителите, заплащани месечно и броя на изработените дни – за останалите работници. Трудовият стаж на работниците и служителите, заплащани месечно, се изчислява, като календарните дни се делят на 30.

СтилКомплект Благоевград

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Име Иван (собствено) Милчаков (бащино) Досумов (фамилно) 6208310187 (ЕГН)

Наименование (фирма) на работодателя	Организационно звено (бригада, отдел, цех, служба и др.)	Длъжност, шифров номер на професията, квалификационно равнище, (степен, група, разряд).	Дневно /месечно/ основно трудово възнаграждение. Продължителност на работното време.*
1	2	3	4
Галеев Ко-оп		Ръководител	170 000 лв
			350 лв
Всичко прослужено време в календарни месеци: 01 год. 04 мес. 19 дни			
На основание: Еднолично акционерно дружество с ограничена отговорност			

Дата на постъпване	Подпис и печат на работодателя.	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение.	Основание за прекратяване на трудовото правоотношение.	Подпис и печат на работодателя.
5	6	7	8	9
01.01.1999 г.		31.12.2000 г.	чл. 119 от КТ	
01.01.2000 г.		31.12.2000 г.	чл. 119 от КТ	
2000 г.			1 ед. годишно възнаграждение	

* Попълва се, когато е за непълно работно време.

6 7

Име Иван (собствено) Милчаков (бащино) Досумов (фамилно) ЕГН

Наименование (фирма) на работодателя	Организационно звено (бригада, отдел, цех, служба и др.)	Длъжност, шифров номер на професията, квалификационно равнище, (степен, група, разряд).	Дневно /месечно/ основно трудово възнаграждение. Продължителност на работното време.*
1	2	3	4
Галеев инженерингс Груп ЕАД		Изп. директор	250 лв
		Прокурист	250 лв
		Технически директор	500 лв
Всичко прослужено време в календарни месеци: 1 година 9 месеца 1 мес.			
На основание: Устав			

Дата на постъпване	Подпис и печат на работодателя.	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение.	Основание за прекратяване на трудовото правоотношение.	Подпис и печат на работодателя.
5	6	7	8	9
01.09.2000 г.		01.04.2001 г.	прекратен	
2000 г.		31.12.2000 г.		
01.09.2001 г.		31.10.2001 г.	прекратен	
2001 г.				
01.10.2001 г.			прекратен	
2001 г.				
в Галеев инженерингс Груп ЕАД				

* Попълва се, когато е за непълно работно време.

8 Серия И, № 313796

Серия И, № 313796

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Стилкомплект Благоевград

32

Име .... **ЕГН**

собствено бащино фамилно

Наименование (фирма) на работодателя	Организационно звено (бригада, отдел, цех, служба и др.)	Длъжност, шифров номер на професията, квалификационно равнище, (степен, група, разряд).	Дневно /месечно/ основно трудово възнаграждение. Продължителност на работното време.*
1	2	3	4
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

* Попълва се, когато е за непълно работно време.

10

Дата на постъпване	Подпис и печат на работодателя.	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение.	Основание за прекратяване на трудовото правоотношение.	Подпис и печат на работодателя.
5	6	7	8	9
26.06.01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

11

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА.

СтилКомпарс Благоевград

33

Осигурителна книжка No . . . . . на . . . . . .

No по рег	Наименование на предприятието, фирмата, домакинството или лицето, при което работи осигуреният.	№ на осигури-теля	град, село	Адрес, ул. №, тел. №
1	2	3	4	5
1	ЕР "Галев-Б"	Е1-1829	Бя-9	Ивов Кирил Методиев"
2	„Галев и Ко" ООД	116622	Бя. гр.	ул. „Кр. Кирилова" 19, 3 16

Забележка: Колони 11 и 12 се попълват само при прекратяване

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

34

Младенов Костинков

ЕГН	6	2	0	8	3	1	0	0	5	8

Каква работа извършва. Длъжност и квалификация	Дата на започване на работа	Подпис и печат на работодателя	Дата на прекратяване на работа	Подпис и печат на работодателя	Общ трудов стаж в предприятието, фирмата	Подпис на фин. ревизор и печат на ДОО
6	7	8	9	10	11	12
Н-к автобаза	01.06.95		030598		2 год 5 дни	
Сервизен	09.05.1998		010194			
Ел					0 год 15 дни	

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

на осигуровката преди края на календарната година.

37

АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ

Отдел Недвижимо имущество

Благоевград, тел:(359) 73 2 90 56
факс:(359) 73 2 24 17

РЕФЕРЕНЦИЯ

Инж. Иван Миладинов Достумски участвува в строителството на "Университетско общежитие на АУБ - I етап" гр. Благоевград като началник обект. Той успя да създаде необходимата организация на работа на обекта, което допринесе за неговото успешно завършване. Ръководените от инж. Достумски инженерен състав и работници изпълняваха съвестно, качествено и в срок поставените задачи.

Съвместната ни работа се отличаваше с яснота, коректност и точност при изпълнение на работите на обекта.

Американски университет в България Благоевград

/инж. Георги Третьов/
Директор отдел Недвижимо имущество

07.11.2002г.
гр.Благоевград

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

СтилКомплект ООД Благоевград

38

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ВИСШЕ ВОЕННО ИНЖЕНЕРНО СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - СОФИЯ



Саморъчен подпис

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ВИСШЕ ВОЕННО ИНЖЕНЕРНО СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - СОФИЯ

ДИПЛОМА

за ВИСШЕ образование

серия ЛК № 002432

Стоян Димитров Фретенаров

роден на 30.12.1971 година в гр./с./ Петрич
област Софийска държава Р. България
ЕГН 7112300084 е постъпил през 19 90 година и е
завършил през 1995 година ПЪЛНИЯ ПЕТГОДИШЕН КУРС на
ВВИСУ "Любен Каравелов" по специалността ПРОМИШЛЕНО
И ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО със среден успех от курса на
обучение Добър (3,68), и успех от държавните
изпити Добър (4,38)

С протокол № 4 на държавната изпитна комисия от
28.07 1995 год. му се присвоява военна квалификация
"ВОЕНЕН ИНЖЕНЕР ПО ПРОМИШЛЕНО И ГРАЖДАНСКО
СТРОИТЕЛСТВО".

На основание Указ № 1815 от 16 август 1973 г. му се
признава ВИСШЕ образование и гражданска квалификация
"СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР ПО ПРОМИШЛЕНО И ГРАЖДАНСКО
СТРОИТЕЛСТВО" - конструктор

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА ИЗПИТНА КОМИСИЯ
/Крумов/

НАЧАЛНИК НА ВВИСУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"
/Кичуков/

София, 1995 г. Регистрационен № 0379

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Строителен комплекс Благоевград

СЕРТИФИКАТ

№ MSHA-12074

на

инж. СТОЯН ДИМИТРОВ ВРЕТЕНАРОВ

роден на 30.12.1971 г.

за преминато обучение и успешно положен изпит в курс на тема

Системи за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа, съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2005 и BS OHSAS 18001:2007. Одити. Изисквания на БДС EN ISO 19011:2011

проведен на 29 и 30 октомври 2012 г.

Съдържание на обучението:

- Преглед на изискванията на стандартите БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2005 и BS OHSAS 18001:2007. Изисквания за документацията на системата. Изискани програми.
- Изискания към политиката. Общи и конкретни цели и програми. Законови и други изисквания.
- Аспекти, опасности. Компетентност, осъзнаване, обучение. Вътрешни и външни комуникации. Консултиране. Управление на документи.
- Готовност за аварийни и извънредни ситуации. Управление на процеси и дейности. Мониторинг. Средства за наблюдение и измерване. Оценка на съответствието със законовите и други изисквания. Несъответствия, коригиране и превантивни действия.
- Вътрешни одити. Записи. Преглед от ръководството.
- Стъпки при внедряване на система за управление на околната среда и здравето и безопасността при работа.
- Изисквания на стандарта БДС EN ISO 19011:2011. Одити на система за управление на околна среда. Необходими термини и определения. Управление на програми за одит.
- Дейности, свързани с одита. Преглед на документацията на системата за управление. Подготовка на одита. Одитна на място. Документиране на резултатите от одита.
- Разпространение на доклада. Завършване на одита. Последващи действия.
- Предпоставки за осъществяване на одит.
- Изисквания при одитирането на система за управление.

Лектори: д-р инж. Людмил Стоянов
инж. Георги Димитров

Верификация ЕООД

Ръководител:
Стефка Христова

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

СтилКомплекс
Благоевград

38

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От инж. Стоян Димитров Вретенаров

Заемана позиция – Контрол по качеството

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №48. Многофамилна жилищна сграда – блок № 3, вх. В, вх. Г и вх. Д, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Яне Сандански";

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис,печат/

СтилКомплект
Благоевград

89

КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за пълна проектантска правоспособност

архитект

Димитър Йорданов Захариев

регистрационен номер 01277

валидност: 01/01/2016 – 31/12/2016

Председател на КР
арх. Весела Георгиева

Председател на УС
арх. Владимир Дамянов

място за личен печат и подпис

Архитектите с пълна проектантска правоспособност, вписани в регистъра на Камарата на архитектите в България, в съответствие с придобитата проектантска квалификация могат да предоставят проектантски услуги в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране без ограничения по вид и размер, да договарят участие в инженеринг на строежи и да упражняват контрол по изпълнението на проектите им. **(чл.7, ал.7, изр.1 от ЗКАИП)**

Архитектите с пълна проектантска правоспособност, към гореописаните проекти могат да изработват и „Генерален план", „Интерес[illegible]", „Благоустройство", „Пожарна безопасност", „План за безопасност и здраве", „Енергийна ефективност", „[illegible] управление на строителните отпадъци" и други в съответствие с придобитата им професионална квалификация.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

40

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
гр. София, ул. "Г. Бенковски" № 3
Разрешение № 3 и № 77на НСЗ
ЕИК:121718407
Агенция Изток
Адрес: София, бул."Евлоги Георгиев" 98-102

ДЗИ

Национален номер 0700 16 166
www.dzi.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 212216217000007 / 15.02.2016
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА
"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна агенция София, АДРЕС гр.София, ул. "Г.Бенковски" 3 НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАН:	Име: ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЗАХАРИЕВ ЕГН: 7103070081 Адрес: Домашен: гр.София, ул. "Шейново" № 25 Представлявано от:
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на проектанта"
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Изработване на инвестиционни проекти за обекти от трета категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:	Лимит за едно събитие: 50,000 лв. Агрегатен лимит: 100,000 лв.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по - малко от 500 лв.
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	1 година **НАЧАЛО:** 00:00 часа на 16.02.2016 г. **КРАЙ:** 24:00 часа на 15.02.2017 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	16.02.2011
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	100.00 лв. *Словом:* сто лв.

ВНОСКИ:	I-ва вноска	II-ра вноска
ДАТА:	15.02.2016	15.08.2016
РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:	50.00 лв.	50.00 лв.
ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:	1.00 лв.	1.00 лв.
ОБЩА СУМА: (ВНОСКА + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	51.00 лв.	51.00 лв.

ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗП:	2.00 лв.	*Словом:* две лв.
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: (ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	102.00 лв.	*Словом:* сто две лв.

СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ:	Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строежи, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно т.15.2.от ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.

При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия на падежа, застрахователната полица се прекратява след изтичането на 15 - дневен срок от датата на падежа на разсрочената вноска.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
15-02-2016 13:34:22 JA09528



ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният: Димитър Йорданов Захариев, ЕГН: 7103070081
в качеството си на **Ръководител екип – Архитект**

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №48. Многофамилна жилищна сграда – блок № 3, вх. В, вх. Г и вх. Д, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Яне Сандански"

ДЕКЛАРИРАМ:

В случай,че представената от мен Застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ изтече преди срока на договора, то действието и ще бъде подновено/продължено със срок не по-малък от срока на строителството и договора и 30 дни след изтичането му..

ДЕКЛАРАТОР:

Дата:27.07.2016 г. .....

(подпис, печат)

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От арх. Димитър Йорданов Захариев
Заемана позиция : ръководител екип и проектант по част Архитектура

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №48. Многофамилна жилищна сграда – блок № 3, вх. В, вх. Г и вх. Д, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Яне Сандански"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Дата: 27.04.2016 г
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 41295

Важи за 2016 година

инж. ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧЕКУРОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 74/26.11.2010 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Председател на РК
инж. Г. Кордов

Председател на КР
инж. И. [illegible]

Председател на УС на КИИП
инж. Ст. Кинарев

2016

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

0.2016

Алианц България
Застрахователно акционерно дружество

Общо застраховане

ФЛ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 13180163950000014

"Алианц България" – Застрахователно Акционерно Дружество на основание предложение от Застрахования и срещу платена застрахователна премия застрахова професионалната отговорност на Застрахования по начин и условия, както следва:

ВИД ЗАСТРАХОВКА:	Професионална отговорност В проектирането и строителството
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:	ЗАД "Алианц България", бул. "Княз Дондуков" № 59, 1504 София ДДС № BG040638060, ЕИК : 040638060
ЗАСТРАХОВАН:	ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧЕКУРОВ ЕГН: 8410027266 Адрес : гр./с. СОФИЯ, п. код 1000, Ж.к./Бул./Ул.ДЪРВЕНИЦА, ЗЕЛЕНА ПОЛЯНА, No9, Ет.2, Ап.4
ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Проектант , Категория строежи: III
СРОК НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР:	1 година от 00:00 часа на 09.06.2016г. до 24:00 часа на 08.06.2017 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	08.06.2011 г.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно действащата нормативна уредба и приложимите Общи условия по застраховката
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ:	50,000.00 BGN за Всяко едно събитие. 100,000.00 BGN В агрегат за срока на застраховката.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	10.00 % (десет процента), но не по-малко от 1,000.00 BGN (хиляда BGN) от Всяка щета.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	100.00 BGN (сто BGN)
ДАНЪК ПО ЗДЗП:	2.00 BGN(два BGN)
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА:	102.00 BGN (сто и два BGN)
СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ: 09.06.2016 г.	102.00 BGN В т.ч. премия 100.00 BGN и данък 2.00 BGN

Писменото предложение или искане до застрахователя за сключване на застрахователен договор и писмените отговори на застрахования и/или застраховащия на поставени от застрахователя въпроси относно обстоятелства, имащи значение за естеството и размера на риска, общите условия на застраховката, приложенията, добавъците и други писмени договорености между страните (ако има такива), представляват неразделна част от настоящата полица.
С подписа си по-долу Застрахованият удостоверява, че е съгласен и приема общите условия към настоящата полица, екземпляр от които са му предадени към момента на подписване на полицата, както и че му е предоставена информация относно Застрахователя по чл. 324 ал.1 от Кодекса за застраховане.
В случай на неплащане или неточно плащане на дължима вноска от застрахователната премия, застраховката се прекратява към 24.00 часа на 15-ия ден, считано от датата на съответния падеж, посочен в застрахователната полица.

ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ : 08.06.2016 г., гр. СОФИЯ

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: /...../
/Светлана Пламенова Христова/

ЗАСТРАХОВАН: /...../
/ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧЕКУРОВ/

/...../
код 395

Посредник: ГП София-Павлово - ИМОРТЕЛА ОЛАМ ООД, гр./с. СОФИЯ, п. код 1000, ПУШКИН, No5, ЛД No 3950000
Посредник: "БЪЛГАРИЯ НЕТ" АД , гр. СОФИЯ, п.код 1504, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ No 59, ЛД No 0010005

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

№ 1273801

Allianz

Оригинал

45

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният: Георги Николов Чекуров, ЕГН: 8410027266

в качеството си на **проектант по част Конструктивна**

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №48. Многофамилна жилищна сграда – блок № 3, вх. В, вх. Г и вх. Д, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Яне Сандански"

ДЕКЛАРИРАМ:

В случай,че представената от мен Застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ изтече преди срока на договора, то действието и ще бъде подновено/продължено със срок не по-малък от срока на строителството и договора и 30 дни след изтичането му..

Дата:27.07.2016 г.

ДЕКЛАРАТОР:
.....
(подпис, печат)

СтилКонтрол
Благоевград

46

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От инж. Георги Николов Чекуров
Заемана позиция : проектант по част Конструктивна

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №48. Многофамилна жилищна сграда – блок № 3, вх. В, вх. Г и вх. Д, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Яне Сандански"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Дата: 22.04.2016 г
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

47

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 01242

Важи за 2016 година

инж. ЗДРАВКА СЛАВЧЕВА НЕНЧЕВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

МАШИНЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 10/17.09.2004 г. по части:

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ, ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛО И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

КИИП
КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 01242
инж. ЗДРАВКА СЛАВЧЕВА НЕНЧЕВА
Председател на КР
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЪП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

Председател на РК

инж. Г. Кордов

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ КИИП

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кичарев

2016

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Стилиян Благоев

18

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
София

УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

№ ЕС 574 / 30 април 2010 г.

ЗДРАВКА СЛАВЧЕВА НЕНЧЕВА

ЕГН 7109286838, родена на 28 септември 1971 година
в гр. София, област София, Република България,
завърши курс на обучение с общ хорариум 90 часа по

ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ

и положи успешно изпит на 30 април 2010 г.

Настоящото удостоверение се издава на основание чл. 23, ал. 1, т. 3(б) от ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

РЕКТОР

(Проф. д-р инж. Камен ВЕСЕЛИНОВ)
(печат на ТУ)

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ * РЕКТОРАТ * СОФИЯ *

Тел.: (359 2) 965 21 11
Факс: (359 2) 868 32 15
www.tu-sofia.bg

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
1000 София
бул. „Климент Охридски" № 8

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Строителен комплекс
Благоевград

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО **Армеец** www.armeec.bg

Застрахователно акционерно дружество "Армеец"
1000 София, ул. Стефан Караджа №2
ЕИК по БУЛСТАТ 121076907
Разрешение №7 / 15.06.1998 г. на КСЗ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 16 320 1317С 007850

Застраховка ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: Здравка Славчева Петрова
гр. София, ул. Генерал Инзов 20 ЕГН 7109286838
(трите имена/фирма, адрес, телефон, факс, ЕГН/ЕИК)

Представляван от: .....
(трите имена, длъжност)

Професионална дейност:	☒ Проектант	☐ Консултант А	☐ Консултант Б	☐ Строител	☐ Лице, упражняващо строителен надзор
Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти					☐ Лице, упражняващо технически контрол
Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор					

Застрахователно покритие: ☒ Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ ☐ Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал 1 от ЗУТ

Строителен обект: .....
(само за Клауза Б)
(наименование и адрес)

Лимити на отговорност (в лева)	**Дейност 1:** проектиране	**Дейност 2:**	**Дейност 3:** .....
Лимит за едно събитие, в т.ч.:	100 000 лв		
лимит за имуществени вреди			
лимит за неимуществени вреди			
лимит за едно увредено лице			
Общ лимит на отговорност	200 000 лв		

Самоучастие на застрахования: .....

Срок на застраховката: 12 месеца от 00.00 часа на 16.02.2016 г. до 24.00 часа на 15.02.2017 г.

Ретроактивна дата: ..... год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя

Застрахователна премия: 200,00 лева, **2% ЗДЗП:** 4,00 лева; **ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА:** 204,00 лева.
словом: Двеста и четири лева

Начин на плащане:	☒ еднократно	☐ на разсрочени вноски	☒ в брой	☐ по банков път
Вноска / Падеж	I-ва / ..... 20..... г.	II-ра / ..... 20..... г.	III-та / ..... 20..... г.	IV-та / ..... 20..... г.
Премия в лв:				
2% ЗДЗП в лв:				
Обща сума в лв:				

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицата. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24.00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа на неплатената разсрочена вноска.

Дата и място на издаване на полицата: 11.02. 2016 год. гр. София

Настоящата Полица, Въпросник/предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавъци и други придружаващи документи са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник: Здравко ООД, София, ул. Бедечица 50, 0879390189
(трите имена, адрес, код)

Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", запознах се с тях и заявявам, че ги приемам.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ЗАСТРАХОВАН: .....
(подпис и печат)

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: .....
(подпис и печат)

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният: Здравка Славчева Ненчева, ЕГН: 7109286838

в качеството си на **проектант по част Енергийна ефективност и ОВК**

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №48. Многофамилна жилищна сграда – блок № 3, вх. В, вх. Г и вх. Д, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Яне Сандански"

ДЕКЛАРИРАМ:

В случай,че представената от мен Застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ изтече преди срока на договора, то действието и ще бъде подновено/продължено със срок не по-малък от срока на строителството и договора и 30 дни след изтичането му..

Дата:27.07.2016 г.

ДЕКЛАРАТОР:
.....
(подпис, печат)

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От инж. Здравка Славчева Ненчева
Заемана позиция : проектант по част Енергийна ефективност и ОВК

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №48. Многофамилна жилищна сграда – блок № 3, вх. В, вх. Г и вх. Д, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Яне Сандански"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Дата: 27.07.2016 г
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

Стиг-Комплекс
Благоевград

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 12231

Важи за 2016 година

инж. АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ЧИКАЛОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 59/26.06.2009 г. по части:

ЕЛЕКТРИЧЕСКА

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ ... КИИП

Председател на РК

инж. Ж. Кацарска

Председател на КР

инж. И. Караджов

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

2016

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

0:2016

Оригинал

Застрахователна полица № 16201P20001

Застрахователна компания "УНИКА" АД, срещу заплащане на застрахователна премия, се съгласява да застрахова интереси по начин и при условия, посочени в полицата.

- Вид застраховка: Професионална отговорност на лицата по чл. 171 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
- **Застрахован:** Александър Георгиев Чикалов ЕГН7711050022 с. Черниче ул " Никола Вапцаров" №1
- Застрахован интерес: професионалната отговорност на застрахования по чл. 171 от ЗУТ като проектант за изработване на инвестиционни проекти за строежи III категория.

  Ретроактивна дата по чл. 172, ал. 1, т. 2 от ЗУТ – датата на започване на горепосочената дейност на застрахования. Ако застрахованият е упражнявал тази дейност повече от пет години, ретроактивната дата е пет години преди датата на сключване на тази полица.
- Срок на застраховката: от 10.02.2016 год. до 09.02.2017 год.
- Застрахователна сума: Отговорността на застрахователя по писмени претенции за вреди от горепосочената дейност на застрахования е ограничена до Лева 50 000 (петдесет хиляди) за едно застрахователно събитие и до Лева 100 000 (сто хиляди) в агрегат (с натрупване) за всички събития, настъпили в срока на застраховката.

  Годишна застрахователна сума: Лева 100000 (сто хиляди).
- Условия: Съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
- Застрахователна премия: Общо премия - 100 BGN
  Данък върху застрахователните премии по *ЗДЗП (2%) - 2 BGN
  Общо дължима сума - 102 (сто и два) BGN

Вноска	**Премия BGN**	**Данък по ЗДЗП (2%)**	**Общо дължима сума**	**Срок на плащане**
Еднократна	100	2	102	10.02.2016

(еднократно) Дължимата сума е платима еднократно при сключване на застраховката.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА.



IBAN: BG16 RZBB 9155 1000 3008 38, BIC: RZBBBGSF
„Райфайзенбанк (България)" ЕАД
*ЗДЗП – Закон за данък върху застрахователните премии

- Самоучастие: Застрахованият ще участва за своя сметка с 10%, но не по-малко от Лева 1 000 (хиляда) от всяко обезщетение по всяко едно събитие.

Подписаният застрахован/представител на застрахования декларирам:

1. Предоставена ми е информация като потребител на застрахователни услуги.
2. Съгласен съм ЗК „Уника" АД да обработва личните ми данни, както и данните за лицата, обявени в полицата, съгласно Закона за личните данни.
4. Не възразявам вписаните в полицата данни да бъдат ползвани от ЗК „Уника" АД за кореспонденция при предлагане на продукти.

Тази полица е издадена съгласно писмено предложение на застраховани, съставляващо неразделна част от застрахователния договор.

Дата на предложението: 06.01.2016 год.

Полицата е издадена в 1 (един) оригинален екземпляр.

06.01.2016 год.

Издадена от: Светла Велева

ЗК „УНИКА" АД

Застрахован/Представител на застрахования:
Име: Александър Цикалов

Подпис:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният: Александър Георгиев Чикалов, ЕГН: 7711050022
в качеството си на **проектант по част Електрическа**

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №48. Многофамилна жилищна сграда – блок № 3, вх. В, вх. Г и вх. Д, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Яне Сандански"

ДЕКЛАРИРАМ:

В случай,че представената от мен Застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ изтече преди срока на договора, то действието и ще бъде подновено/продължено със срок не по-малък от срока на строителството и договора и 30 дни след изтичането му..

Дата:27.07.2016 г.

ДЕКЛАРАТОР: .....
(подпис, печат)

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От инж. Александър Георгиев Чикалов
Заемана позиция : проектант по част Електрическа

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №48. Многофамилна жилищна сграда – блок № 3, вх. В, вх. Г и вх. Д, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Яне Сандански"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Дата: 27.04.2016 г
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

27

КИИП

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ
В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
(КИИП)
Областна колегия София-град

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ПБЗ-№ 00330

инж. Кръсто Маркулев
рег. № 01470 в КИИП

за завършен курс на обучение

КООРДИНАТОР
ПО
БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО

на 18 и 19 януари 2007 г.

по одобрена програма от МТСП и МРРБ във връзка с чл. 5 от Наредба №2 за Минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

гр. София, 19.01.2007 г.

Председател на КИИП София-град:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
(инж. Димитър Начев)

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
гр. София, ул. "Г. Бенковски" № 3
Разрешение № 3 и № 77на НСЗ
ЕИК:121718407
Агенция Изток
Адрес: София, бул."Евлоги Георгиев" 98-102

ДЗИ

Национален номер 0700 16 166
www.dzi.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 212216217000009 / 16.02.2016
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА
"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна агенция София, АДРЕС гр.София, ул. "Г.Бенковски" 3 НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАН:	Име: КРЪСТО ЯНЕВ МАРКУЛЕВ ЕГН: 4106066686 Адрес: Домашен: гр.София, УЛ. "БАНАТ" № 27 Представлявано от:
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на проектанта"
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Изработване на инвестиционни проекти за обекти от трета категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:	Лимит за едно събитие: 50,000 лв. Агрегатен лимит: 100,000 лв.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по - малко от 500 лв.
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	1 година **НАЧАЛО:** 00:00 часа на 17.02.2016 г. **КРАЙ:** 24:00 часа на 16.02.2017 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	17.02.2011
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	100.00 лв. *Словом:* сто лв.

ВНОСКИ:	I-ва вноска	II-ра вноска
ДАТА:	16.02.2016	16.08.2016
РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:	50.00 лв.	50.00 лв.
ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:	1.00 лв.	1.00 лв.
ОБЩА СУМА: (ВНОСКА + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	51.00 лв.	51.00 лв.

ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗП: 2.00 лв. *Словом:* две лв.

ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: (ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП) 102.00 лв. *Словом:* сто две лв.

СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ: Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строежи, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно т.15.2.от ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.

При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия на падежа, застрахователната полица се прекратява след изтичането на 15 - дневен срок от датата на падежа на разсрочената вноска.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

16-02-2016 10:17:11 JA09528

Благоевград

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният: Кръсто Янев Маркулев, ЕГН 4106066686

в качеството си на проектант **по част ПБЗ**

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №48. Многофамилна жилищна сграда – блок № 3, вх. В, вх. Г и вх. Д, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Яне Сандански"

ДЕКЛАРИРАМ:

В случай,че представената от мен Застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ изтече преди срока на договора, то действието и ще бъде подновено/продължено със срок не по-малък от срока на строителството и договора и 30 дни след изтичането му..

Дата: 29.07.2016 г.

ДЕКЛАРАТОР:

.....

(подпис, печат)

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От инж. Кръсто Янев Маркулев

Заемана позиция – специалист по ЗБУТ

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № 48. Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. В, вх. Г и вх. Д, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Яне Сандански"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

61

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От инж. Кръсто Янев Маркулев
Заемана позиция : проектант по част ПБЗ

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №48. Многофамилна жилищна сграда – блок № 3, вх. В, вх. Г и вх. Д, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Яне Сандански"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Дата: 12.08.2016 г
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/



62

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за пълна проектантска правоспособност по интердисциплинарна част пожарна безопасност

Регистрационен номер № 00708

Важи за 2016 година

инж. БОЖИДАР ПЪРВАНОВ МАРКОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН:

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ:

МАШИНЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП от 10 / 26.07.2013 г., подписан

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ЧАСТ **ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ** изпълнена СЪГЛАСНО ЗУТ И НАРЕДБА № 4 ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КЪМ ЧЛ. 4, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № Із-1971 ЗА СТЕПЕНИТЕ

ВАЖИ САМО ЗА МАРКИРАНИТЕ РАЗДЕЛИ:

"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - КОНСТРУКТИВЕН"
"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ЕЛЕКТРИЧЕСКИ"
"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО"
"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ОТОПЛИТЕЛНА, ВЕНТИЛАЦИОННА, КЛИМАТИЧНА И ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛО- И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ"
"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО"
"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ТЕХНОЛОГИЧЕН"
"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ"
"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ГЕОДЕЗИЯ И ПРИЛОЖНА ГЕОИНФОРМАТИКА"
"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ТЕХНИЧЕСКА ЗАПИСКА И ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ"

Председател на РК
инж. Г. Карчев

Председател на КР
инж. Ст. Катраджиев

Председател на УС на КИИП
инж. Ст. Катраджиев

2016

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Стил-Комплекс
Благоевград

КИИП **камара на инженерите в инвестиционното проектиране**

СЕРТИФИКАТ

№ 00098/ 19.11.2013г.

инж. Божидар Първанов Марков

проектант с регистрационен номер 00708

завърши успешно курс на обучение:

Нормативен контекст, основни положения и практически указания по приложението на НАРЕДБА за Управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

Курсовете са организирани от ЦО на КИИП.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Главен секретар на КИИП

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Сп. Кипарев

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
гр. София, ул. "Г. Бенковски" № 3
Разрешение № 3 и № 77на НСЗ
ЕИК 121718407
Агенция Изток
Адрес: София, бул."Цветан Георгиев" 98-102

ДЗИ

Национален номер 0700 16 166
www.dzi.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 212216217000010 / 16.02.2016
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА
"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна агенция София, АДРЕС гр.София, ул. "Г.Бенковски" 3 НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАН:	Име: БОЖИДАР ПЪРВАНОВ МАРКОВ ЕГН: 5012036800 Адрес: Домашен: гр.София, Ж.К. "БАНИШОРА" 26 ВХ. Б АП. 98 Представлявано от:
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на проектанта"
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Изработване на инвестиционни проекти за обекти от трета категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:	Лимит за едно събитие: 50,000 лв. Агрегатен лимит: 100,000 лв.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Не се прилага.
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	1 година **НАЧАЛО:** 00:00 часа на 16.02.2016 г. **КРАЙ:** 24:00 часа на 15.02.2017 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	17.02.2011
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	100.00 лв. *Словом:* сто лв.

ВНОСКИ:	I-ва вноска	II-ра вноска
ДАТА:	15.02.2016	15.08.2016
РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:	50.00 лв.	50.00 лв.
ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:	1.00 лв.	1.00 лв.
ОБЩА СУМА: (ВНОСКА + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	51.00 лв.	51.00 лв.

ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗП:	2.00 лв.	*Словом:* две лв.
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: (ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	102.00 лв.	*Словом:* сто две лв.

СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ: Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строежи, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно т.15.2.от ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.

При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия на падежа, застрахователната полица се прекратява след изтичането на 15 - дневен срок от датата на падежа на разсрочената вноска.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
16-02-2016 10:25:14 JA09528

Стил Благоевград

65

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният: Божидар Първанов Марков, ЕГН: 5012036800
в качеството си на **проектант по част ПБ и ПУСО**

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №48. Многофамилна жилищна сграда – блок № 3, вх. В, вх. Г и вх. Д, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Яне Сандански"

ДЕКЛАРИРАМ:

В случай,че представената от мен Застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ изтече преди срока на договора, то действието и ще бъде подновено/продължено със срок не по-малък от срока на строителството и договора и 30 дни след изтичането му..

Дата: 27. 07.2016 г.

ДЕКЛАРАТОР:
.....
(подпис, печат)

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От инж. Божидар Първанов Марков
Заемана позиция : проектант по част ПБ и ПУСО

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №48. Многофамилна жилищна сграда – блок № 3, вх. В, вх. Г и вх. Д, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Яне Сандански"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Дата: 12.08.2016 г
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 18

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ

„СТИЛ КОМПЛЕКС" ООД /посочете фирмата на участника/, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:**„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №48. Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. В, вх. Г и вх. Д, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Яне Сандански"

№ по ред	Вид материал	Мярка	Количество
1	Антикорозионен грунд	кг	45,00
2	Циментова замазка	м3	22,5
3	Битумна хидроизолационна мембрана	м2	730,00
4	Битумна хидроизолационна мембрана с посипка	м2	730,00
5	Олуци от поцинкована ламарина	м	36,00
6	Водооткапващ профил с мрежа	м	169,00
7	Гипсова шпакловка	кг	9800,00
8	Ръбохранители за гипсова шпакловка	м	625,00
9	Латексова боя	кг	365,00
10	Блажна боя	кг	175,00
11	Лак за дърво	кг	25,00
12	Водосточни тръби	м	24,00
13	Мълниеприемник с изпреварващо действие	бр	3,00
14	Алуминиев проводник ф 8	м	300,00
15	Заземителни колове поцинкована шина 40/4мм	м	12,00
16	Осветително тяло с вграден фотодатчик за движение и LED светлина	бр	32,00
17	Дълбокопроникващ грунд преди топлоизолация	кг	645.00
18	Топлоизолационна плоча EPS 10 см.	м2	3011.00
19	Топлоизолационна плоча EPS 12 см.	м2	190,00
20	Топлоизолационна плоча EPS 5 см.	м2	960.00
21	Стъклотекстилна мрежа	м2	4800.00
22	Топлоизолационна плоча EPS 2 см.	м2	372.00
23	Каменна вата 10 см. с пл. 100кг./м3	м2	140.00
24	Силикатна структурна мазилка	м2	4545.00
25	Ъглов профил с мрежа	м	1840,00

Стилкомплекс Благоевград

26	Топлоизолационна плочаXPS 10 см	м2	245,00
27	Мозаечна мазилка	м2	245,00
28	Газобетон 10 см.	м3	30,00
29	Термопанели за покрив	м2	105,00
30	Минерална вата	м2	645,00
31	Ламарина поцинкована	м2	200,00
32	Защитни решетки на отвори за вентилиране	бр	90,00
33	ПВС дограма	м2	455,50
34	Алуминиева дограма с прекъснат термомост за входни врати	м2	22,50
35	Пожароустойчива врата	бр	3,00
36	Поцинковани тръби 2“	м	72,00
37	Тръбно скеле	м2	3400,00
38	Силиконов грунд преди структурна мазилка	кг	6500,00
39	Лепилно-шпакловъчна смес	кг	67200,00
40	Дюбел за топлоизолация	бр	38400,00
41	Битумен грунд	кг	280,00
42	Проводник СВТ 3х1,5	м	380,00
43	Двукомпонентен разтвор	кг	6
44	Изолация на водопровони тръби	м	63

Към декларацията прилагам следните сертификати за съответствие:

№	Документ	Продукт	Доставчик/производител
1	Декларация за съответствие	Грунд антикорозионен водоразтворим	„Мегахим Русе”
2	Декларация за експлоатационни показатели	Циментова замаска	„Мапей”
3	Декларация за експлоатационни показатели	Битумна хидроизолационна мембрана-ПОЛИЗОЛ П	„ИЗОЛА - ПЕТРОВ” ЕООД
4	Декларация за експлоатационни показатели	Битумна хидроизолационна мембрана-ПОЛИЗОЛ ПМ	„ИЗОЛА - ПЕТРОВ” ЕООД
5	Декларация за съответствие	Аксесоари за покривни конструкции	„ИЗОЛА - ПЕТРОВ” ЕООД
6	Декларация характеристиките на стр.продукт	Битумен грунд	„ИЗОЛА - ПЕТРОВ” ЕООД
7	Декларация за	Улуци	„Недев”

Стилкомплекс Благоевград

	експлоатационни показатели		
8	Декларация за произход	Водооткапващ профил	„Баумит България" ЕООД
9	Декларация за експлоатационни показатели	Гипсова шпакловъчна смес GFS 60	„Трейд Комерс А Ив" ЕООД
10	Декларация за експлоатационни показатели	Ръбоохранител	„Ликов"
11	Декларация за характеристиките на строителен продукт	Интериорна боя за вътрешно приложение с възможност за оцветяване	„Мегахим" Русе
12	Сертификат за съотватствие	Интериорна боя за вътрешно приложение с възможност за оцветяване	„Мегахим" Русе
13	Декларация за характеристиките на строителен продукт	Алкидна боя	„Мегахим" Русе
14	Сертификат за съотватствие	Алкидна боя	„Мегахим" Русе
15	Декларация за характеристиките на строителен продукт	Лазурен лак за дърво	„Мегахим" Русе
16	Декларация за експлоатационни показатели	Водосточни тръби	„Недев" Хасково
17	Декларация за съответствие	Мълниеприемници с изпреварващо действие"FOREND"	„Натюр БГ" ЕООД
18	Декларация за съответствие	Проводник от алуминиева сплав ф8	„ЕННСЕР" ООД
19	Декларация за съответствие	Заземителни колове с шина	„Берг-Галко" ООД
20	Декларация за съответствие	Осветител тип плафон с датчик	„2 Р-България „ ЕООД
21	Декларация за съответствие	LED лампи	„ЕЛМАРК ИНДЪСТРИС" АД
22	Декларация за произход	Баумит грунд	„Баумит България" ЕООД

23	Декларация за експлоатационни показатели	Баумит Про Терм EPS на плочи	„Баумит България” ЕООД
24	Декларация за експлоатационни показатели	Баумит Стар Текс стъклотекстилна мрежа	„Баумит България” ЕООД
25	Декларация за експлоатационни показатели	Кнауф рок /продукти от каменна вата/	Кнауф Инсулейшън ДОО
26	Декларация за експлоатационни показатели	Баумит Силикат Топ	„Баумит България” ЕООД
27	Декларация за произход	Баумит профил за ъгли с мрежа	„Баумит България” ЕООД
28	Декларация за съответствие	Топлоизолационна плоча XPS	„FIBROTERMICA”
29	Декларация за експлоатационни показатели	Баумит Мозаик Топ	„Баумит България” ЕООД
30	Декларация за експлоатационни показатели	Блокове за зидария Ytong B2.5	„Ксела България”ЕООД
31	Декларация за експлоатационни показатели	Термоизолационен самоподържащ се панел тип „сандвич”	„Пластсистем”
32	Декларация за експлоатационни показатели	Минерална вата	„FIBRAN”
33	Декларация за съответствие	Поцинкована ламарина	„Балкан Стийл Инженеринг”
34	Декларация за съответствие	Вентилационна решетка	СД”Кристиан Дени”
35	Декларация засъответствие и произход на продукта	PVC дограма	„Стилпласт” ООД
36	Декларация за експлоатационни показатели	Алуминиева дограма	„Булгар плаза 44”ЕООД
37	Декларация за съответствие	Противопожарна врата	ЕТ „Димитър Христов”
38	Сертификат за	Фасонни части от полипропилен	„Булгарконтрола”АД

СтилКомплекс Благоевград

	съответствие 14 нНСИСОССП-1130		
39	Сертификат за съответствие 14 нНСИСОССП-1129	Тръби от полипропилен	„Булгарконтрола"АД
40	Сертификат за контрол	Тръбно скеле	„Булгарком фасадни системи" ООД
41	Декларация за характеристиките на строителен продукт	Баумит Уни Праймер грунд	„Баумит България" ЕООД
42	Декларация за експлоатационни показатели	Баумит ПроКонтакт Лепило шпакловъчна смес	„Баумит България" ЕООД
43	Декларация за експлоатационни показатели	Дюбел	EJOT
44	Декларация за съответствие	Битумен грунд	„Марисан и Колев"ООД
45	Декларация за съответствие	Кабели СВТ	„ТИЛКОМ"
46	Декларация за експлоатационни показатели	Двукомпонентен разтвор Баумит БетоФил	„Баумит България" ЕООД
47	ЕО Декларация за съответствие	Листова топлоизолация от пяна	„Химически продукти"ООД

УЧАСТНИК:.....

/подпис, печат/

72

123 Lipnik blv , Rousse , Bulgaria ; tel : 082 817 721, fax : 082 817 725

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: инж.Васил Василев – Производствен директор на "МЕГАХИМ " АД, гр.Русе 7013, бул. "Липник" № 123

Във връзка с Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
(Д.В., бр.106 / 27.12.2006 г)

Декларирам, че продуктът

Aquis Грунд антикорозиен водоразредим

е в съответствие с:

- ТС 52 – 2003 и анализно свидетелство за изделието, издавано за всяка произведена партида.
- Фирмена система за производствен контрол съгласно изискванията на сертификат ISO 9001
- Притежава здравна оценка за приложимост, издадена от Национален център по опазване на общественото здраве. Документът е с изходящ
- № 5962-2545/121206 и копие от него може да се предостави на клиента при поискване.
- Техническа характеристика на изделието, в съответствие с ТС 52 – 2003, която може да се предостави на клиента при поискване.

гр. Русе

03. 01. 2012 г.

Производствен Директор: .....

/ инж.В.Василев/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

43

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ: No. CPR-IT1/0344

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: **TOPCEM PRONTO**
2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:
   ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОДГОТВЕНА ЗАМАЗКА НА ЦИМЕНТОВА ОСНОВА (CT-C30-F6)
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:
   ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ЗА ВЪТРЕШНА УПОТРЕБА В ПОДОВАТА КОНСТРУКЦИЯ
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:
   MAPEI S.p.A. – УЛ.КАФИЕРО 22 – МИЛАНО (ИТАЛИЯ) www.mapei.it
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: **НЕ Е ПРИЛОЖИМО**
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: **СИСТЕМА 4**
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:
   НЯМА ДАННИ ЗА НОТИФИЦИРАНИЯ ОРГАН
8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка: **НЕ Е ПРИЛОЖИМО**
9. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън:	**Клас $A1_{fl}$**	
Отделяне на корозионни вещества:	**CT**	
Водопропускливост:	**NPD**	
Пропускливост на водни пари:	**NPD**	
Якост на натиск:	**C30**	
Якост на огъване:	**F6**	**EN 13813:2002**
Износоустойчивост:	**NPD**	
Звукоизолация:	**NPD**	
Звукова абсорбция:	**NPD**	
Топлоустойчивост:	**NPD**	
Химическа устойчивост:	**NPD**	

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от: **Паоло Мурели - Corporate Quality Management**
(име и длъжност)

Милано, 01/07/2013
(място и дата на издаване)

.....
(подпис)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

CE МАРКИРОВКА в съответствие с Регламент 305/2011 и EN 13813:2002

CE

MAPEI

Ул. Кафиеро, 22 – 20158 Милано (Италия)
www.mapei.it

04

CPR-IT1/0344

EN 13813:2002 - CT-C30-F6

TOPCEM PRONTO

Циментова замазка за вътрешна употреба в подовата конструкция

Реакция на огън:	Клас $A1_{fl}$
Отделяне на корозионни вещества:	CT
Водопропускливост:	NPD
Пропускливост на водни пари:	NPD
Якост на натиск:	C30
Якост на огъване:	F6
Износоустойчивост:	NPD
Звукоизолация:	NPD
Звукова абсорбция:	NPD
Топлоустойчивост:	NPD
Химическа устойчивост:	NPD

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ИЗОЛА - ПЕТРОВ

Производствена и търговска база Чепинци, ул. Стара планина 64, тел.: 02/ 996 25 22; 996 25 20, факс: 996 25 50
Търговска база Казичене тел.: 02/978 45 31, 978 53 74, e-mail: office@izola-petrov.eu, www.izola-petrov.eu

CE

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ № 132/ 27.07.2014 г.

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Битумна хидроизолационна мембрана /мушама/

ПОЛИЗОЛ П

3,0 кг/м^2

код: 3800143902332

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 на регламент (ЕС) № 305/2011:

Партида № 89...

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя:

Използва се при изпълнение на хидроизолация на плоски покриви, както и за изолация на подземни части на сгради и съоръжения.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 4 на регламент (ЕС) № 305/2011:

„ИЗОЛА – ПЕТРОВ“ ЕООД

Гр. София, кв. Чепинци, ул. „Стара планина“ № 64

телефон: 02/ 996 25 22, факс: 02/996 25 50

e-mail: office@izola-pertrov.eu

5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V.

Система: 2+

6. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Нотифицирано лице за оценяване на съответствието на строителни продукти

№ NB 2032 - НИСИ ЕООД, бул. „Н. Петков“ № 86 извърши първоначална проверка и последващи одити на системата за производствен контрол и издаде ЕС – сертификат за производствен контрол № 2032 – CPR – 07.209A.

Благоевград

7. Декларирани експлоатационни показатели:

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Реакция на огън	Евроклас F	Декларация на производителя, съгл.решение на ЕК и т.5.2.5.2 от EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Маса на единица площ, kg/m²	≥ 3,000	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Водонепропускливост	≥ 0,06 MPa	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Якост на опън: - Надлъжно - Напречно	≥ 500 N/50 mm ≥ 350 N/50 mm	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Относително удължение при опън - Надлъжно - Напречно	≥ 30% ≥ 30%	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Съпротивление на статично пробиване	≥ 200 N	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Устойчивост на удар	≥ 1100 mm	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Съпротивление на разкъсване (със стебло на гвоздей)	≥ 150 N	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Якост на срязване на снажданията - Надлъжно - Напречно	≥ 500 N/50 mm ≥ 350 N/50 mm	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Огъваемост при ниска температура	≤ -5°C	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Устойчивост на стичане при повишени температури	≥ 120°C	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Дълготрайност	NPD	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Опасни вещества	NPD	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006

8. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 7.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Инж. Николина Порожанова – началник производство

Гр. София, 27.07.2014 г. .....

/място и дата на издаване/ /подпис/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"ИЗОЛА-ПЕТРОВ" - ЕООД СОФИЯ

"ИЗОЛА-ПЕТРОВ" - ЕООД СОФИЯ

ИЗОЛА - ПЕТРОВ

Производствена и търговска база Чепинци, ул. Стара планина 64, тел.: 02/ 996 25 22; 996 25 20, факс: 996 25 50
Търговска база Казичене тел.: 02/978 45 31, 978 53 74, e-mail: office@izola-petrov.eu, www.izola-petrov.eu

CE

261 22.09.2015 г.

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Битумна хидроизолационна мембрана /мушама/

ПОЛИЗОЛ ПМ

4,5 кг/м^2 червен

код: 3800143902639

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 на регламент (ЕС) № 305/2011:

Партида № 186

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя:

Използва се при изпълнение на хидроизолация на плоски покриви и съоръжения, като последен завършващ слой при многопластови хидроизолации.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 4 на регламент (ЕС) № 305/2011:

„ИЗОЛА – ПЕТРОВ“ ЕООД

Гр. София, кв. Чепинци, ул. „Стара планина“ № 64

телефон: 02/ 996 25 22, факс: 02/996 25 50

e-mail: office@izola-pertrov.eu

5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V.

Система: 2+

6. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Нотифицирано лице за оценяване на съответствието на строителни продукти

№ NB 2032 - НИСИ ЕООД, бул. „Н. Петков“ № 86 извърши първоначална проверка и последващи одити на системата за производствен контрол и издаде ЕС – сертификат за производствен контрол № 2032 – CPR - 07.209A.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Стара планина
Благоевград

7. Декларирани експлоатационни показатели:

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОД НА ИЗПИТВАНЕ	ДЕКЛАРИРАНИ СТОЙНОСТИ / РЕЗУЛ - ТАТ ОТ ИЗПИТВАНЕТО	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Видими дефекти	БДС EN 1850 – 1	Без мехури, пукнатини, дупки и оголени повърхности	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Дължина, m	БДС EN 1848 – 1	10 / MLV (-1%)	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Ширина, m	БДС EN 1848 – 1	1,0 / MLV (-1%)	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Праволинейност, mm	БДС EN 1848 – 1	Отговаря / 20 mm x 10 m	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Маса на единица площ, kg/m^2	БДС EN 1849 – 1	4,5 / MDV (± 5%)	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Стабилност на размерите, %	БДС EN 1107 – 1	≤ 0,6 / MLV	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Якост на опън: - Надлъжно - Напречно	БДС EN 12311 – 1	650 N/50 mm / MDV (± 30%) 455 N/50 mm / MDV (± 30%)	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Относително удължение при опън - Надлъжно - Напречно	БДС EN 12311 – 1	≥ 30% / MDV ≥ 30% / MDV	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Съпротивление на статично пробиване	БДС EN 12730	≥ 200 N / MLV	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Устойчивост на удар	БДС EN 12691	≥ 1100 mm / MLV	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Съпротивление на разкъсване (със стебло на гвоздей)	БДС EN 12310 – 1	150 N / MDV (± 30%)	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Якост на сръзване на снажданията - Надлъжно - Напречно	БДС EN 12317 – 1	650 N/50 mm / MDV (± 30%) 455 N/50 mm / MDV (± 30%)	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Огъваемост при ниска температура	БДС EN 1109	≤ -5°C / MLV	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Устойчивост на стичане при повишени температури	БДС EN 1110	≥ 120°C / MLV	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Водонепропускливост	БДС EN 1928	≥ 0,6 MPa / MLV	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Адхезия на посипката	БДС EN 12039	≤ 10% / MDV	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Реакция на огън	БДС EN 13501 – 1	Евроклас E	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Дълготрайност	-	NPD	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Опасни вещества	-	NPD	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006

8. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 7.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Инж. Николина Порожанова – началник производство

Гр. София

22.03.2015

/място и дата на издаване/

/подпис/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Благоев ЕАД

ИЗОЛА - ПЕТРОВ

София 1592, ПК 18, Офис: ул."Гурко" № 7А, тел.: 02/981 32 30, факс: 02/ 981 43 18
Производствена и търговска база Чепинци, ул. Стара планина 64, тел.: 02/ 996 25 22; 996 25 20, факс: 996 25 50
Търговска база Казичене тел.: 02/978 45 31, 978 53 74, e-mail: izolaet@techno-link.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният, Иван Тодоров Петров – Управител на " ИЗОЛА – ПЕТРОВ" – ЕООД - Упълномощен представител на Italprofili S.r.l. - Италия, с адрес на управление: гр. София, кв. Чепинци, ул."Стара планина" №64, декларирам на собствена отговорност, че продуктът

АКСЕСОАРИ ЗА ПОКРИВНИ КОНСТРУКЦИИ

за който се отнася тази декларация, е в съответствие със всички изискванията на UNI EN 1451-1 и в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на:

Сертифицирана система по качество по UNI EN ISO 9001: 2000 и декларираните от производителя показатели съгласно UNI EN 1451-1.

Указания към потребителя: Използват се за направа на покривни отводнителни системи по задание на проектанта.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

01.07.2008г.
Гр. София

УПРАВИТЕЛ:
/ Иван Петров /

"ИЗОЛА-ПЕТРОВ" ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ИЗОЛА - ПЕТРОВ

Производствена и търговска база Чепинци, ул. Стара планина 64, тел.: 02/ 996 25 22; 996 25 20, факс: 996 25 50
Търговска база Казичене тел.: 02/978 45 31, 978 53 74, e-mail: office@izola-petrov.eu, www.izola-petrov.eu

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ №..1../..20.07.2015г.

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

БИТУМЕН ГРУНД
код: 3800143915103

2. Национални изисквания , техническа спецификация, приложими за строителния продукт

ТС 1 – 12 «БИТУМЕН ГРУНД»

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

Служи за грундиране на бетонови и други повърхности, като предварителна обработка преди полагане на хидроизолационния материал. Полага се с четка, валяк, щприц, пистолет.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя и място на производство.

„ИЗОЛА – ПЕТРОВ“ ЕООД
Гр. София, кв. Чепинци, ул. „Стара планина“ № 64
телефон: 02/ 996 25 22, факс: 02/996 25 50
e-mail: office@izola-pertrov.eu

5. Протокол от изпитване:

Протокол № 228-3-99/10.03.2004 г. от акредитиран изпитвателен център по строителство – ИЦС при НИСИ ЕООД, лаборатория:“Строителна химия и изолации“ за първоначално определяне характеристиките на продукта;

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

81

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОКАЗАТЕЛ	МЕТОД НА ИЗПИТВАНЕ
Външен вид на грунда	Еднородна вискозна течност	ТС 1 -12
Цвят	Черен	ТС 1 -12
Вискозитет по $B3_4$ при 20°C, в s	от 30 до 70 s	БДС EN ISO 2431
Време за съхнене, в h	от 8 до 24 h	ТС 1 -12

7. Характеристиките на строителния продукт, посочен в точка 1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно точка 7.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Инж. Николина Порожанова – началник производство

Гр. София

14.04.2015 г.

/място и дата на издаване/

.....

/подпис/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

82

НЕДЕВ®

Адрес: 6300 Хасково
Източна индустриална зона
www.nedeveood.com

тел. /038/ 601130
факс /038/ 601141
e-mail: mail@nedeveood.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
DECLARATION OF CONFORMITY

за строителен продукт в съответствие с НСИСОССП

Долуподписаната Желязка Великова Кирева – в качеството си на управител на "НЕДЕВ" ООД - производител, седалище гр. Хасково, ул."Сливница" №32

Декларирам на собствена отговорност, че продуктите

Висящи улуци, водосточни тръби, вътрешни и външни ъгли, обшивки, казанчета за улук, скоба за улук и кривки от метални листове,

произведени в производствената база на дружеството, находяща се в гр. Хасково, Източна индустриална зона I, предназначени за отвеждане на дъждовна вода, разтопен сняг и лед от сградите, за които се отнася тази декларация са произведени в условията на въведена и поддържана система за производствен контрол , и са в съответствие с

БДС EN 612:2005

„Висящи улуци, усилени с огъване по челната си страна и водосточни тръби от метални листове с челни съединения".

Съответствието им е оценено, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Продуктите са негорими.

Специфични изисквания, свързани с монтажа и експлоатацията на продуктите придружават продуктите.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

"НЕДЕВ" ЕООД ХАСКОВО

15.09.2011г.
гр. Хасково

Управител: .....
/Ж. ВЕЛИКОВА/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Стилкомерс Благоевград

83

baumit.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД

Долуподписаният, „Баумит България" ЕООД, гр. Елин Пелин 2100, ул. „България" № 38 декларирам на собствена отговорност, че продуктът

Баумит Профил водооткапващ (пластмасов)

Baumit TropfkantenProfil

за който се отнася тази декларация, е:

- произведен от фирма „ДЖИ ПЛАСТ" ООД, с адрес на регистрация: ул. Карамфил № 28, гр. Варна, България;
- PVC-профил с интегрирана двустранно стъклотекстилна мрежа (12.5x12.5 см);
- предназначен за оформяне на външни хоризонтални ъгли, с цел водооткапване на стичащата се по фасадата вода;
- не представлява строителен продукт по смисъла на Приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 г.

Други подкрепящи документи за оценяване на съответствието:

1. **Декларация от производителя (Herstellererklärung)**

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта:

Съгласно Техническата карта и Листа с данни за безопасност.

Година на поставяне на маркировка "CE": –

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

04.03.2015 г.
гр. Елин Пелин

.....
Николай Бъчваров
Управител
Баумит България ЕООД

Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38
Тел.: 02/92 66 911
Факс-офис: 02/92 66 918
Факс-склад: 02/92 66 922
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242
ИН: 121006242
Уникредит Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG93UNCR96601026065200

Настоящият документ се предоставя на фирма продобител ЕООД, в качеството й на клиент по договор за търговска продажба. Документът е валиден от 04.03.2015 г. до промяната му от страна на Баумит България.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

87

„ Трейд Комерс А и В" ЕООД,

гр. София; ул. „Цар Калоян" № 6

CE ДЕКЛАРАЦИЯ за ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

RN 20/001/13.03.2014г

1.Уникален идентификационен код на типа на продукт:
Гипсова шпакловка - GFS 60
2.Тип, партиден или сериен номер

партида № 001/ от 13.03.2014 г.

3.Предвидена употреба или употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е предвидена от производителя:
Гипсовата шпакловка се използва за шпакловане и заглаждане на гипсови, варови, варо-циментови хастарни мазилки,гипсови блокчета, бетон и газобетон.
4.Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марки и адрес за контакт на производителя:
"Трейд Комерс А и В" ЕООД, гр. София, ул. „Цар Калоян" № 6, тел. 0701 5 04 45

5. Когато е приложимо, адрес на упълномощения представител
Не е приложимо

6.Система или системи на оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт (Регламент 305/2011, Приложения V): **система 4**

7. Продуктът е обхванат от хармонизиран стандарт **БДС EN 13279-2**
Нотифициран орган за сертификация на производствен контрол на продукти № CPD 05- NB1950 от 17.09.2007г.,извърши изпитване на продукта с протокол №326/14.04.2009г.

8. Декларирани експлоатационни показатели

Съществена характеристика	**Експлоатационен показател**	**Хармонизирана техническа спецификация**
Гипсова шпакловка		**БДС EN 13279-2**
Срок за обработваемост	120min	
Якост на опън при огъване	1,6N/mm²	
Якост на натиск	3,1N/mm²	
Якост на сцепление при опън	1,1N/mm²	

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в т.1,2 съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т.8.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в т.4:

Подписано за и от името на производителя от:

(Анжела Стоилова - Управител)

Гр. Дупница
Дата:13.03.2014 год.

(подпис).....

Маркировката „CE" на продукта е поставена за първи път през 2007г.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Система за строителни профили

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СВОЙСТВА № 1/13

Производител:

Търговско наименование: **ЛИКОВ ООД**

Седалище: гр. Куржим, п.к. 664 34, ул. Бланенска № 1859

ЕИК: 606 97 598

Данъчен № (Булстат): CZ 60697598

декларира и удостоверява, че продуктите:

Наименование на продукта	*Код на продукта*
ЛО *(LO)*	ЛО *(LO)*
ЛУ *(LU)*	ЛУ *(LU)*
ЛОП *(LOP)*	ЛОП *(LOP)*
ЛОВ *(LOV)*	ЛОВ *(LOV)*
ЛОХ/хикс/ *(LOX)*	ЛОХ/хикс/ *(LOX)*
ЛОЗ *(LOZ)*	ЛОЗ *(LOZ)*
ЛП *(LP)*	ЛП *(LP)*
ЛП *(LP)* **назъбен**	ЛП *(LP)* назъбен
ЛП *(LP)* **135°**	ЛП *(LP)* 135°
Л *(L)*	Л *(L)*
ЛПУ *(LPU)*	ЛПУ *(LPU)*
ЛП *(LP)* **Поцинкован**	ЛП *(LP)* Поцинкован
Ъгъл остър	Ъгъл остър
Ъгъл заоблен	Ъгъл заоблен
Уред за бързо нанасяне на мазилка	Уред за бързо нанасяне на мазилка

са съвместими с приложението ЗА (*ZA*) на нормата ЕН *(EN)* 13658-1 и ЕН *(EN)* 13658-2 в система 4 и са включени в класа на реакцията с огън А1 според Решение на комисията 96/603/ЕС. Продуктите са приложими за изолационни контактни системи и за мазилки. Неприложим е като носеща или подпорна част при строителните конструкции.

В гр. Куржим на 15.4.2013 г.

Важи от: 1.7.2013 г.

Павел Бурант
изпълнителен директор

ЛИКОВ ООД
ул. Бланенска № 1859
гр. Куржим, п.к. 664 34

тел.: +420 541 552 501
факс: +420 541 552 508
ел. поща: likov@likov.com

ЕИК 606 97 598, Данъчен № (Булстат) CZ 60697598
Фирмата е регистрирана при Областен съд
в гр. Брно, раздел Ц, вкнетка № 14366
банков контакт: Комерчни банка, клон гр. Куржим
сметка №: 202601621, код на банката: 0100

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

86

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

съгласно Приложение 1 на Наредба № РД-02-20-1

№ 4_1

1.Уникален идентификационен код на типа продукт

DEKORATOR LIFE STYLE

ИНТЕРИОРНА БОЯ

2.Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:

ТС 4-2003

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

Устойчиво водоразредимо декоративно покритие за вътрешно боядисване.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:

МЕГАХИМ АД

гр.Русе- 7000, бул.“ Липник „ № 123 ,

e-mail: office@megachim.com; тел: 082 /817-721;

факс:082/817-725

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

Не е приложимо

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

Не е приложимо

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристики	Показатели	Методи за изпитване
Външен вид след разбъркване	Хомогенна маса	визуално
Съдържание на нелетливи вещества , (105±2)°C/ 2 h	min.60	ВФМ 3
pH стойност	от 7,5 до 10	с pH- метър
Вискозитет по Брукфилд KU-2 при (23±0,5)°C, в KU	min.90	ВФМ 9
Плътност, в g/cm ³ не по-малко от	min.1,5	БДС ISO 2811-1
Сцепливост при (23±2)°C, степен 4, в h	max.2	ВФМ 3
Цвят	бял	Визуално

8.Характеристиките на строителния продукт,посочен в т.1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т. 7.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т. 4 или на упълномощения представител съгласно т. 5.

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Производствен директор

/инж. В.Василев/

Дата: 03.05.2016 г.
гр. Русе

отпечатване »

МЕГАХИМ АД Русе, бул. Липник 123; тел.:082 817 721, fax :082 817 723

Анализно свидетелство

17743 / 19 Jul 2016

Обект на изпитване: **Dekorator Life Style Интериорна боя**

Партиден N: 294 / 716

Нормативно техническо основание за извършване на изпитването: ТС 4 / 2003

показатели	Норма	Резултат	Метод
външен вид	Хомогенна маса	отговаря	Визуално
Цвят	по еталон	Бял	визуално
Покривност, гр/кв. м., не повече от	200	139	БДС 14475-89 метод. 3
Съхливост при 23 С до степен 4, в часове, не повече от	2	отговаря	БДС 8663-80
Вискозитет по Кребс (KU), не по-малко от	90	107	Вискозиметър Кребс единици
pH	съгласно ТС	9.3	BDS EN ISO 787 - 9
Съдържание на нелетливи вещества в %, не по малко от	60	отговаря	БДС EN ISO 3251-98
Плътност g/cm3	-	1.6230	ликнометър BDS ISO 2811-1

Бележки:

Заключение: Отговаря на техническата спецификация

Извършил изпитанието: laborant

Ръководител лаборатория: Александрова

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

88

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

Мегахим

съгласно Приложение 1 на Наредба № РД-02-20-1

№ 119

1.Уникален идентификационен код на продукта

Dekorator Life Style

Алкидна Екстра боя за метал и дърво

2.Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройство,национален нормативен акт),техническа спецификация(национален стандарт,българско техническо одобрение),приложими за строителния продукт:

ТС 119-2014

3.Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания , както е предвидено от производителя.

Устойчиво покритие за предварително грундирани метални , дървени и други повърхности експонирани на открито и в закрити помещения.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакти на производителя и място на производство:

МЕГАХИМ АД

гр.Русе 7000, бул."Липник „ №123

тел: 082 /817-721

e-mail: office@mgachim.com

5.Име и адрес за контакт на упълномощения представител(когато е приложимо):

Не е приложимо

6.Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

Не е приложимо

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристики	Показатели	Методи за изпитване
Вискозитет по ВЗ-4 при (20±0,5)°С , в s	min.100	ВФМ 4
Финост на смилане, в μm	max.20	ВФМ 5
Съдържание на нелетливи вещества, (125±2)°С , в %	min.50	ВФМ 2
Плътност , g/sm³ , в зависимост от цвета	1,0-1,15	БДС ISO 2811-1
Съхнивост при (23±2)°С до степен 4, в h	max.24	ВФМ 3
Цвят	по RAL	Спектрофотометрично ΔE≤ 2
Еластичност , в mm	max.2	ВФМ 7
Адхезия ,в бала	max.2	ВФМ 8
Блясък , в %, при ъгъл 60°	60-80	БДС EN ISO 2813 т.10.2.

8.Характеристиките на строителния продукт,посочен в т.1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т. 7.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т. 4 или на упълномощения представител съгласно т. 5.

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

Дата: 03.05.2016 г.
гр. Русе

Производствен директор

/инж. В.Василев/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

отпечатване »

МЕГАХИМ АД Русе, бул. Липник 123; тел.:082 817 721, fax :082 817 723

Анализно свидетелство

17357 / 28 Jun 2016

Обект на изпитване: **Dekorator Екстра Алкидна Боя**

Партиден N: 3 / 616

Нормативно техническо основание за извършване на изпитанието: ТС 119 / 2014

показатели	Норма	Резултат	Метод
външен вид	Хомогенна маса	отговаря	Визуално
Покривност, гр/кв. м., не повече от	200	83	БДС 14475-89 метод. 3
Вискозитет по ВЗ 4, не по-малко от	80	211	ВФМ 4
Финост на смилане, микрони, не повече от	20	17	БДС 6138-82
Съдържание на нелетливи вещества в %, не по малко от	50	53.26	БДС EN ISO 3251-98
Цвят	по еталон	**RAL 8001**	Спектрофотометрично, dE,2

Бележки:
.....1.070

Заключение: Отговаря на техническата спецификация

Извършил изпитанието: laborant

Ръководител лаборатория: Александрова

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

90

123 Lipnik blv , Rousse , Bulgaria ; tel : 082 817 721, fax : 082 817 725

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: инж.Васил Василев – Производствен директор на "МЕГАХИМ " АД, гр.Русе 7013, бул. "Липник" № 123

Във връзка с Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
(Д.В., бр.106 / 27.12.2006 г)

Декларирам, че продуктът

Aquis Лазурен лак Teflon

е в съответствие с:

- ТС 78 – 2007 и анализно свидетелство за изделието, издавано за всяка произведена партида.
- Фирмена система за производствен контрол съгласно изискванията на сертификат ISO 9001
- Техническа характеристика на изделието, в съответствие с ТС 78 – 2007, която може да се предостави на клиента при поискване.
- Притежава здравна екологична оценка за приложимост, издадена от Лаборекс-ЕАД, гр.София. Документът е с изх.№ 0387-0348/09.05.2008 г. и копие от него може да се предостави на клиента при поискване.

гр. Русе

03. 01. 2012 г.

Производствен директор: .....
/ инж.В.Василев/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

91

НЕДЕВ®

Адрес: 6300 Хасково
Източна индустриална зона
www.nedeveood.com

тел. /038/ 601130
факс /038/ 601141
e-mail: mail@nedeveood.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

DECLARATION OF CONFORMITY

за строителен продукт в съответствие с ЗИСИСОСП

Долуподписаната Желязка Великова Кирева – в качеството си на управител на "НЕДЕВ" ООД производител, седалище гр. Хасково, ул."Сливница" №32

Декларирам на собствена отговорност, че продуктите

Висящи улуци, водосточни тръби, вътрешни и външни ъгли, обшивки, накрайници за улук, скоба за улук и кривки от метални листове,

произведени в производствената база на дружеството, находяща се в гр. Хасково, Източна индустриална зона I, предназначени за отвеждане на дъждовна вода, разтопен сняг и лед от сградите, за които се отнася тази декларация са произведени в условията на въведена и поддържана система за производствен контрол , и са в съответствие с

БДС EN 612:2005

„Висящи улуци, усилени с огъване по челната си страна и водосточни тръби от метални листове с челни съединения".

Съответствието им е оценено, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Продуктите са негорими.

Специфични изисквания, свързани с монтажа и експлоатацията на продуктите придружават продуктите.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

15.09.2011г.
гр. Хасково

Управител: ..... /Ж. ВЕЛИКОВА/

НЕДЕВ ЕООД ХАСКОВО

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Благоевград

ФОРЕНД

ФОРЕНД ЕЛЕКТРИК МАЛЗЕМЕЛЕРИ ве ДИШ ТИЧ.А.С.
19 Майис Мх. Бююкдере Сд. № 4 Басман Хан К:4 Д:4 Шишли/Истанбул
Тел. +90 212 291 51 63 /2 линии/ Факс: +90 212 291 51 65

E-поща: forend@forend.com.tr WEB: www.forend.com.tr
Mecidiyekoey V.D. 388 039 2530 Tic. Sic. № 493769-441351

CE - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящата декларация, ние, ФОРЕНД, с адрес: 19 Майис Махала Бююкдере Кад. Басман Хан № 4 К:4 Д:4 Шишли / Истанбул – Турция, декларираме на собствена отговорност, че изделието МЪЛНИЕПРИЕМНИЦИ С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ (ESE) "FOREND", модели EU, EU-M, Petex-L, Petex-M, Petex-S е произведено от ФОРЕСТ в съответствие с ISO 9001.

Ние потвърждаваме, че съгласно нашия внедрен, прилагащ се и установен Сертификат ISO 9001:2008, изделието е произведено в съответствие с приложимите стандарти за монтаж и технологиите за производство.

Горепосочените изделия са извън обхвата на съвместимост на Директивата за ниско напрежение и електромагнитност. Те са в съответствие с Директиви:

UNE 21.186:1998
NFC 17.102:1995

Година на допълване на „CE" маркировката: 2004
Име и подпис:
Гьокхан Акман

Подпис
Печат

Дата: 15/06/2004

Вносител: „ Натюр БГ" ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

93

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

"ЕННСЕР" ООД

гр. София, 1309 ул."Враня" № 114

декларираме на собствена отговорност, че продуктите: *Проводник от алуминиева сплав AlMgSi 0.5с диам. Ø 8 ± 0,1 mm ; Проводник от алуминиева сплав AlMgSi 0.5с диам. Ø 10 ± 0,1 mm Екструдиран тел от ал. сплав AlMgSi 0.5 с диаметър на жилото Ф8,0мм. и делина на изолацията 1,5 mm+/-0,2мм. ;Мълниеприемен Прът от ал. сплав AlSlMgSi0,5 с дължини от 1 500 до 4 000 мм. ; клема от ал. сплав AlSlMgSi0,5 за свързване на проводник Ф8,00 или Ф10,00 мм. ; клема горещопоцинкована за свързване на проводник с диам. Ф8,00мм. и мълниеприемен прът Ф16,00мм. ; алуминиева клема за свързване на проводник с диам. Ф8,00мм. и закрепване за улук ; клема стоманена, поцинкована за свързване на проводник с диам. Ф8,00мм. и шина 40*4 ; опора за плосък покрив с бетон изработена от материал издържащ на атмосферни условия за полагане на проводник Ф8,00 на открито ; носач на проводник Ф8,00/Ф10мм за било от поцинкована стомана. ; носач на проводник Ф8,00/Ф10мм за керамична керемида от поцинкована стомана.; анкер за закрепване на мълниеул.прът Ф16/Ф22мм по комини и бордове ; носач за замонарезен винт за сандвич панел Ф8,00мм. ; клема за връзка на Ф20,00/40*4 стоманена-усукана ;*
Шина Al 99.50 ЕД 4 x 40 БДС 12440-74

Произход : България

за който се отнася тази декларация, е в съответствие със следния(те) стандарт(и) или друг(и) нормативен(ни) документ(и) ***Наредба №4 22.12.2010 за МСВСО***
и в съответствие с предписанията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, съществени изисквания за безопасност на други наредби за оценяване на съответствието.

01.10.2013г. .....

/Св. Савов – Управител на "ЕННСЕР" ООД/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

94

Радомир 2400
ул."Гарата" №1
тел./факс: 0777/ 32 25

БЕРГ - ГАЛКО ООД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният инж. Димитър Димитров-Управител на "Берг Галко"-ООД,гр.Радомир,

Декларирам на собствена отговорност, че продукта – "Горещо поцинковане" на детайли :
1 Заземителни колове с шина
.....
.....
.....
.....

за който се отнася тази декларация е в съответствие с БДС –10129/85г.,което конкретизира поцинковането.

Специфичните изисквания свързани с употребата на тези материали се залагат от проектантите.

Декларирам, че ми е известна отговорността,която нося съгласно чл. 313 от НК.

гр. Радомир
22.01.07г.

УПРАВИТЕЛ:
/инж. Д.Димитров/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

2R LIGHTING SYSTEMS
гр.Пловдив, бул.Марица юг 186
Bulgaria, Plovdiv, 186 Mariza blvd. - south
office@2r-bg.com
tel./fax + 359 32 63 09 23,mob.+ 359 885 28 40 40

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният инж. Руси Русев – управител на „2Р-България" ЕООД със седалище на управление гр. Пловдив, бул. Марица Юг №186,

Декларирам на собствена отговорност, че електрическия продукт:
Осветител тип плафон с датчик модел: Sense IP54 ,производство на Pelsan, за който се отнася тази декларация, е в съответствие с хармонизираните европейски стандарти:

БДС EN 60598-1:2008 Осветители. Част 1: Общи изисквания и изпитвания (IEC 60598-1:2006, с промени)

БДС EN 60598-2-1:2002 Осветители. Част-2: Специфични изисквания.Раздел1.Неподвижни осветители за общо осветление (IEC 60598-2-1:1979+A1:1987)

съгласно приложимите съществени изисквания на Директива 2006/95/ЕС

Година на поставяне на маркировката за съответствие CE: *08*

Вносителят „2Р-България" ЕООД, прилага система за управление на качеството в съответствие с BS EN ISO 9001:2008 EN ISO 9001:2008 ISO 9001:2008 - сертификат №: SOF6011051,система за управление на околната среда ISO 14001:2004 EN ISO 14001:2004 BS EN ISO 14001: 2004 сертификат №:SOF6011051/A и система за управление на здравословни и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001: 2007 сертификат №:SOF6011051/B.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

Гр. Пловдив
Дата 02.04.2013г.

управител:
инж. Руси Русев

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

ВНОСИТЕЛ: **ЕЛМАРК ИНДУСТРИЕС АД**

АДРЕС: **ДОБРИЧ, БУЛ. "ДОБРУДЖА" 2**

ПРОДУКТ: **LED ЛАМПИ**

ТЪРГОВСКА МАРКА: **STELLAR**

ЕЛМАРК ИНДУСТРИЕС АД декларира, че гореописаният продукт е в съответствие със следните директиви

2006/95/ЕС	Директива за ниско напрежение
93/68/ЕЕС	Директива за маркировка СЕ

и са *приложени следните стандарти*

EN 60598-1 : 2008	Осветители. Част 1: Общи изисквания и тестпания
EN 60968:1990/A2:2002	Лампи с вградени баласти за общо осветление. Изисквания за безопасност
EN 55015:2006/A2:2009	Гранични стойности и методи за измерване на характеристиките на радиосмущенията от електрически осветителни и подобни на тях устройства
EN 61547 : 2009	Съоръжения за общи осветителни цели. Изисквания за устойчивост на електромагнитна съвместимост
EN 61000	Електромагнитна съвместимост (ЕМС)

ДОБРИЧ, 04.01.2010г.

(място и дата на издаване)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

(подпис на

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Стилиян
Благоевград

baumit.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД

Долуподписаният, „Баумит България" ЕООД, гр. Елин Пелин 2100, ул. „България" № 38 декларирам на собствена отговорност, че продуктът

Баумит Грунд

Baumit Grund

за който се отнася тази декларация, е:

- произведен от „Баумит България" ЕООД, ул. България № 38, 2100 – гр. Елин Пелин;
- течен грунд за попиващи, включително за неравномерно попиващи минерални основи, преди полагане на продукти на циментова и варо-циментова основа, включително хидроизолационни покрития и лепила за плочки. Произведен в условията на въведена и поддържана система за производствен контрол;
- не представлява строителен продукт по смисъла на Приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 г.

Други подкрепящи документи за оценяване на съответствието:

1. **Декларация от производителя (Herstellererklärung)**

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта:

Съгласно Техническата карта и Листа с данни за безопасност.

Година на поставяне на маркировка "CE": –

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

04.03.2015 г.
гр. Елин Пелин

.....
Николай Бъчваров
Управител
Баумит България ЕООД

Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38
Тел.: 02/92 66 911
Факс-офис: 02/92 66 918
Факс-склад: 02/92 66 922
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242
ИН: 121006242
Уникредит Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG93UNCR96601026065200

Настоящият документ се издава на Вилма Бедрова от „Баумит България" ЕООД, в качеството ѝ на клиент по договор за търговска продажба. Документът е валиден от 04.03.2015 г. и важи до промяната му от страна на Баумит България.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Декларация за експлоатационни показатели

Баумит ПроТерм

Декларация за експлоатационни показатели №: DoP-CPR – 03-BG-ProTherm

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
   Баумит ПроТерм / Baumit ProTherm

2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
   Баумит ПроТерм / Baumit ProTherm;

   Видове:

1) **EPS S – EN 13163 – T1-L2-W2-S2-P5-BS170-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2-TR150-MU(30-70)**
2) **EPS S – EN 13163 – T1-L2-W2-S2-P5-BS170-CS(10)90-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2-TR150-MU(30-70)**
3) **EPS S – EN 13163 – T1-L2-W1-S1-P3-BS200-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2-TR150-MU(30-70)**
4) **EPS S – EN 13163 – T1-L1-W1-S1-P3-BS200-CS(10)100-DS(N)1-WL(T)1-TR150-MU(30-70)**

3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации:**
   Експандиран полистирен на плочи за топлоизолиране на фасадни стени на сгради и съоръжения с много добри топлоизолационни свойства; размери на плочите 100x50 см, дебелини от 2 см до 20 см.

4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5:**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**

6. **Система/системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V:**
   Система 3

7. **В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:**
   Научно-изследователски институт по строителни материали (НИИСМ), (NB 1950), с адрес: ул. Илия Бешков № 1, 1528 София, е извършил първоначално изпитване на типа на продукта, съгласно EN 13163 по система 3 и е издал съответните протоколи от първоначално изпитване за всеки вид:

ПИТ-ЕС-120-18 / 09.07.2013	ПИТ-ЕС-040-7 / 26.05.2009	ПИТ-ЕС-919 / 02.11.2012	ПИТ-ЕС-265-1 / 18.12.2009

Орган, извършил изпитване за определяне реакцията на огън и съответни протоколи за отделните видове с номера:

Amt der Wiener Landesregierung (NB 1139) / MA 39 – VFA 2007-0628.07	OFI Technologie& Innovation GmbH (NB 1085) / 309.507/ 3-16.11.2007	PAVUS, a.s.-Cz. (NB 1391) / PK1-01-09-036-A-0 / 21.07.09	PAVUS, a.s.-Cz. (NB 1391) / PK1-01-09-076-C-0/ 09.12.09

Настоящият документ се предоставя на фирма Бодрост 96 ЕООД, в качеството й на клиент по договор за търговска продажба. Документът е валиден от 01.09.2015 г. до промяната му от страна на Баумит България.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

8. Експлоатационни показатели:

Свойства	Показатели				Стандарт
Устойчивост на пожар	Реакция на огън – Евроклас E				EN 13501-1
	Продължително горене с пламък[1] – NPD				
Водопропускливост	Водопоглъщане при пълно потопяване: виж кода WL(T)i, (≤ 2%, за вид (4) ≤ 1%)				EN 13163
	Водопоглъщане при продължително частично потопяване – за всеки вид:				
	≤ 0,5 kg/m^2	NPD	≤ 0,5 kg/m^2	≤ 0,5 kg/m^2	
	Водопоглъщане чрез дифузия – NPD				
Отделяне на опасни вещества	NPD [1]				
Коефициент на топлопроводност λ	≤ 0.035 W/(m.K)				
Топлинно съпротивление	R_D, виж таблиците по-долу				
	Гранично ниво, (виж класа за допуск на дебелина)				
Размери	Клас за допуск на дебелина: виж кода Ti				
	Клас за допуск на дължина: виж кода Li				
	Клас за допуск на широчина: виж кода Wi				
	Клас за допуск на правоъгълност: виж кода Si				
	Клас за допуск на равнинност: виж кода Pi				
Паропропускливост	Число на дифузионно съпротивление: μ ~ 30–70				
Якост на натиск	При 10% деформация – виж кода CS(10)i				
	Деформация при определени условия на натиск и температурно въздействие – NPD				
Якост на опън / огъване	Якост на огъване – виж кода BSi				
	Якост на опън перпендикулярно на повърхностите TRi: ≥ 150 N/mm^2				
Дълготрайност на реакцията на огън при въздействието на топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Отговаря				
Дълготрайност на топлинното съпротивление при въздействието на топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Топлинно съпротивление и коефициент на топлопроводност – NPD				
	Стабилност на размерите при постоянни нормални лабораторни условия – за всеки вид:				
	DS(N)2	DS(N)2	DS(N)2	DS(N)1	
	Характеристики за дълготрайност – NPD				
	Стабилност на размерите при определени температурно-влажностни условия – за всеки вид:				
	DS(70,-)1	DS(70,-)1	DS(70,-)1	NPD	
	Деформация при определени условия на натоварване на натиск и температурно въздействие – NPD				
Обемна плътност (за всеки вид)	≥ 15 kg/m^3	≥ 15 kg/m^3	15–17 kg/m^3	15–17 kg/m^3	

[1] Методът на изпитване е в процес на разработване.

Таблица. Топлинно съпротивление, съгласно EN 13163:2012

d_N mm	R_D m^{2}K/W
10	0,25
20	0,55
30	0,85
40	1,10
50	1,40
60	1,70
70	2,00
80	2,25
90	2,55
100	2,85

d_N mm	R_D m^{2}K/W
110	3,10
120	3,40
130	3,70
140	4,00
150	4,25
160	4,55
170	4,85
180	5,10
190	5,40
200	5,70

Настоящият документ се предоставя на фирма Бодрост 96 ЕООД, в качеството ѝ на клиент по договор за търговска продажба. Документът е валиден от 01.09.2015 г. до промяната му от страна на Баумит България.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

9. **Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.**

Подпис за производителя и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

.....
(Подпис)

гр. Елин Пелин, 01.09.2015 г.
(Място и дата на издаване)

Настоящият документ се предоставя на фирма Бодрост 96 ЕООД, в качеството й на клиент по договор за търговска продажба. Документът е валиден от 01.09.2015 г. до промяната му от страна на Баумит България.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА.

Декларация за характеристиките на строителен продукт

Баумит СтарТекс

Декларация за характеристиките на строителен продукт №:
ДХСП – 01-ЕлП-Баумит СтарТекс

1. **Уникален идентификационен код на типа на продукта:**
   Баумит СтарТекс – армираща мрежа / Baumit StarTex

2. **Национални изисквания или техническа спецификация (европейски технически одобрения), приложими за строителния продукт:**
   ETO 15/0460, ETO 12/0023, ETO 09/0256, ETO 15/0431

3. **Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:**
   Алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа (≥ 145 g/m^2), за армиране на шпакловъчния слой, положен върху топлоизолационните плочи, включена в системите Баумит Стар EPS, Баумит Про, Баумит Опън и Баумит Минерал.

4. **Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:**
   1. JSC „Valmieras Stikla Skiedra", Cempu iela 13, LV-4201 Valmiera, Латвия
   2. „ADFORS Construction Products Europe" s.r.o. в завод на групата Сен Гобен в гр. Литомизл, ул. Соколовска 106, CZ-57021 Чехия

5. **Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

6. **Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):**
   Нотифициращ орган: TSUS (NB 1301 / TAB), Studená 3, 821 04 Bratislava, Slowakei
   Издадени документи: ETA-15/0460; ETA 12/0023; ETA 09/0256; ETA 15/0431
   на основание на: ETAG 004
   Извършена оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост **по система 2+ и издадени Протоколи:** 1139-CPD-0088/13; 1139-CPD-0858/12; 1139-CPD-0756/09; 1139-CPD-0727/15

Настоящият документ се издава на фирма "Бодрост 96" ЕООД, в качеството й на клиент по договор за търговска продажба. Документът е валиден от 01.04.2016 г. и важи до промяната му от страна на Баумит България.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

102

7. **Декларирани показатели за характеристиките на строителния продукт:**

Характеристика	**Показател**	**Метод на изпитване**
Реакция на огън	клас B-s1-do	EN 13501-1 (в система по ETAG 004)
Плътност	≥ 145 g/m^2	
Разход	1,1 m/m^2	
Якост на опън	≥ 40 N/mm^2	в система по ETAG 004
Якост на опън след стареене	≥ 20 N/mm^2 (> 50% от първоначалната якост на опън)	в система по ETAG 004
Температура на преработка	≥ +5°C	

8. **Характеристиките на строителния продукт, посочени в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните, съгласно т. 7.**

Подпис за и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 01.02.2016 г.
(Място и дата на издаване)

.....
(Подпис)

Настоящият документ се издава на фирма "Бодрост 96" ЕООД, в качеството и на клиент по договор за търговска продажба. Документът е валиден от 01.04.2016 г. и важи до промяната му от страна на Баумит България.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

103

Декларация за експлоатационни показатели № RW-PL/G-DoP-1041/T/13/w1

CE

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: RW-PL-G-1041
2. Типов и сериен номер за идентификация на продукта: Вижте търговско название на продукта на етикета: **Frontrock Max E d=70-200mm**, MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1
3. Използване по предназначение на строителния продукт, в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, съгласно предвиденото от производителя: **Строителни материали Изолационни**
4. Име, регистрирано търговско название или търговска марка и адрес за контакт на производителя, както се изисква съгласно член 11 (5): **ROCKWOOL® Hungary Kft**, Keszthelyi út 53, Tapolca H-8300
5. Система за удостоверяване на съответствие: *Система 1 + Система 3*
6. Нотифицираният орган по сертификация на производствен контрол **ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.**, *Diószegi út 37, Budapest HU-1113* № 1415 извърши и осъществи първоначалното типово изпитване, първоначалния контрол на качеството на производствената площадка и на производствения контрол, и надзора, преценката и оценката на производствения контрол в предприятието, и издаде сертификат за съответствие номер **1415-CPD-35-(C-7/2010)**
7. Декларирани експлоатационни показатели: **Frontrock Max E d=70-200mm**, MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1

Съществени характеристики	Клаузите тези и други европейски стандарт(и), свързани със съществените характеристики	Хармонизиран стандарт EN 13162:2008	Декларирана стойност / NPD[1)]
Реакция на огън	4.2.8 Реакция на огън	Евро класове	A1 [*)]
Отделяне на опасни вещества във вътрешната среда	4.3.13 Отделяне на опасни вещества	Равнището на ЕС все още не може да се достигне	
Индекс на звукопоглъщане	4.3.11 Звукопоглъщане	Декларирани стойности на α_p (APi[*)]) и α_w (AWi[*)])	NPD
Индекс на предаване на ударен шум (на подови плочи)	4.3.9 Динамична коравина	Декларирана стойност на s', SDi[*)]	NPD
	4.3.10.1 Дебелина, d_L	Декларирана стойност на d_L и клас на отклонение на дебелина T5 или T7	NPD
	4.3.10.3 Свиваемост - c	Декларирана стойност на CPi[*)]	NPD
	4.3.12 Специфично съпротивление въздушен поток	Декларирана стойност на AF_i[*)]. Индекс на изолация от директен въздушен шум	NPD
Индекс на изолация от директен въздушен шум	4.3.12 Специфично съпротивление въздушен поток	Декларирана стойност на AF_i[*)].	NPD
Продължително тлеене	4.3.15 Продължително тлеене	Равнището на ЕС все още не може да се достигне	*)
Термично съпротивление	4.2.1 Термично съпротивление и топлопроводимост	Декларирана стойност на R и λ, ако е възможно	Вижте таблица 1 0,036 W/mK
	4.2.3 Дебелина	T_i, клас на допуск при дебелината	T5
Водопропускливост	4.3.7.1 Краткосрочно водопоглъщане	WS - декларирана стойност на W_p	≤ 1 kg/m2
	4.3.7.2 Дългосрочно водопоглъщане	WL(P) - декларирана стойност на W_p	≤ 3 kg/m2
Паропропускливост	4.3.8 Паропропускливост	Декларирана стойност на μ: MU5[*)] или Zi[*)]	MU1
Якост на натиск	4.3.3 Напрежение на натиск или якост на натиск	Декларирана стойност на CS(10)Y[*)] или CS(10\Y)i[*)]	≥40 kPa
	4.3.5 Натоварване в точка	Декларирана стойност на PL(5)i[*)]	≥ 250 N
Устойчивост на реакцията на огън срещу топлина, атмосферни влияния, стареене/разграждане	4.2.9.2 Устойчивост на реакцията на огън	Реакция на огън срещу стареенето	Не се променя с времето
Устойчивост на термичното съпротивление срещу топлина, атмосферни влияния, стареене/разграждане	4.2.1 Термично съпротивление и топлопроводимост 4.2.7 Характеристики на устойчивост	Декларирана стойност на R и λ, ако е възможно	Не се променя с времето
	4.2.6 Стабилност на размерите при 48 часово излагане на (23±2)°C градуса и 90±5% относителна влажност на въздуха	- относителни промени в дебелината	NPD
	4.3.2.1 Стабилност на размерите при определена температура	Декларирана стойност на DS(T+) - относителни промени в дебелината	≤ 1,0%
	4.3.2.2 Стабилност на размерите при определена температура и определена влажност на въздуха	Декларирана стойност на DS(TH) - относителни промени в дебелината	≤ 1,0%
	4.2.9 Трайност характеристики	4.2.1, 4.2.2, 4.2.6 EN 13162:2008	Не се променя с времето
Издръжливост / Якост на огъване	4.2.7 Якостта на опън е успоредна на повърхността	σ_t звявил, достатъчно висока, за да поддържа два пъти теглото на пълен размер продукта	NPD
	4.3.4 Якост на опън перпендикулярно на повърхността	Декларирана стойност на TRi[*)]	≥ 10 kPa
Устойчивост на якостта на натиск срещу стареене/разграждане	4.3.6 Пълзене под налягане	CC(i,*)/i2,*)} σ_c декларирана стойност на пълзене под налягане X_{cc} и X_t	NPD

[1)] не определя изпълнението
[*)] "i" показва съответния клас на ниво или декларираната стойност
[*)] няма национални разпоредби
[2)] в съответствие с националните разпоредби; вижте Информационния лист за безопасност

ROCKWOOL
KAMENA VUNA IZOLACIJE
Rockwool Hungary Kft.
H-8300 TAPOLCA
Keszthelyi út 53.
Hungary
CREATE AND PROTECT®
ОРИГИНАЛА
ЕКО КОМПЛЕКС
Благоевград
109

Декларация за експлоатационни показатели № RW-PL/G-DoP-1041/T/13/w1

CE

Таблица 1

	Thermal resistance, RD,												
d(mm)	20	30	40	50	60	80	100	110	120	140	160	180	200	220
RD(m2K/W)	–	–	–	–	–	2,20	2,75	3,05	3,30	3,85	4,40	5,00	5,55	–

ЗАБЕЛЕЖКА: R стойност за дебелината не се вижда от таблица 1 може да се види на етикета на продукта

Експлоатационните показатели на продуктите, посочени в точки 1 и 2 съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 7. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен по-горе.

Подписал от името и по поръчение на производителя:

Frank Christian Bartel
Техническа и директор производство

подпис

Tapolca, 01. 07. 2013.

ОБРАЗЕЦ

Rockwool Hungary Kft.
H-8300 TAPOLCA
Keszthelyi út 53.
Hungary

ROCKWOOL®
KAMENNÁ VLNA

CREATE AND PROTECT®

СтилКомплект
Благоевград

Декларация за експлоатационни показатели

Баумит СиликатТоп

Декларация за експлоатационни показатели №:
DoP-CPR – 01-ELP-SilikatTop

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
   Баумит СиликатТоп / Baumit SilikatTop

2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
   Баумит СиликатТоп / Baumit SilikatTop

3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации:**
   Мазилка за външно приложение на минерална основа и органични добавки.

4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5:**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
   –

6. **Система/системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V:**
   Система 1 (за реакция на огън)
   Система 4 (EN 15824, с изключения на реакция на огън)

7. **В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:**
   Нотифициращ орган: FIRES, s.r.o. Approved Body No. 1396, SK01, Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce
   Извършено класифициране на класа по реакция на огън, съгл. EN 13501-1 **по система 1 и издаден Протокол:** FIRES-CR-212-11-AURE

8. **Експлоатационни показатели**

Свойства	Показатели	Стандарт
Пропускливост на водни пари	V2	EN 7783-2
Водопоглъщане	W2	EN 1062-3
Якост на сцепление	≥ 0,3 MPa	EN 1542
Топлопроводност	NPD	EN 1745
Реакция на огън	Клас A2-s1,d0	EN 13820
Дълготрайност	NPD	EN 13687-3

Настоящият документ се предоставя на фирма Бодрост 96 ЕООД, в качеството й на клиент по договор за търговска продажба. Документът е валиден от 05.01.2015 г. до промяната му от страна на Баумит България.

ВЯРНО С ОРИГИНА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

9. **Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.**

Николай Бъчваров, Управител



гр. Елин Пелин, 05.01.2015 г.
(Място и дата на издаване)

.....
(Подпис)

Настоящият документ се предоставя на фирма Бодрост 96 ЕООД, в качеството й на клиент по договор за търговска продажба. Документът е валиден от 05.01.2015 г. до промяната му от страна на Баумит България.



baumit.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД

Долуподписаният, **„Баумит България" ЕООД**, гр. Елин Пелин 2100, ул. „България" № 38 декларирам на собствена отговорност, че продуктът

Баумит Профил за ъгли с мрежа – пластмасов

Baumit Kantenschutz mit Gewebe – Kunststoff

за който се отнася тази декларация, е:

- произведен от фирма „ДЖИ ПЛАСТ" ООД, с адрес на регистрация: ул. Карамфил № 28, гр. Варна, България;
- PVC-профил с интегрирана стъклотекстилна мрежа (10x15 см; 10x23 см; 12.5x12.5 см);
- предназначен за оформяне на външните ъгли по фасадата върху топлоизолацията;
- не представлява строителен продукт по смисъла на Приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 г.

Други подкрепящи документи за оценяване на съответствието:

1. **Декларация от производителя (Herstellererklärung)**

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта:

Съгласно Техническата карта и Листа с данни за безопасност.

Година на поставяне на маркировка "CE": –

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

04.03.2015 г.
гр. Елин Пелин

Николай Бъчваров
Управител
Баумит България ЕООД

Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38
Тел.: 02/92 66 911
Факс-офис: 02/92 66 918
Факс-склад: 02/92 66 922
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242
ИН: 121006242
Уникредит Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG93UNCR96601026065200

Настоящият документ се предоставя на фирма [illegible] ЕООД, в качеството ѝ на клиент по договор за търговска продажба. Документът е валиден от 04.03.2015 г. до промяната му от страна на Баумит България.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

DECLARATION OF PERFORMANCE No 201-R1

fibrotermica

Marsipus xps

1. Unique identification code of the product-type:									
a) XPS-BDS EN13164-T2-CS(10/Y)180-DS(TH)-WL(T)0,7-WD(V)3-TR400									
b) XPS-BDS EN13164-T2-CS(10/Y)200-DS(TH)-WL(T)0,7-WD(V)3-TR400									
c) XPS-BDS EN13164-T2-CS(10/Y)300-DS(TH)-WL(T)0,7-WD(V)3-TR400									
d) XPS-BDS EN13164-T2-CS(10/Y)300-DS(TH)-WL(T)0,7-WD(V)3-TR400									
e) XPS-BDS EN13164-T2-CS(10/Y)300-DS(TH)-WL(T)1,5-WD(V)3-TR400									
2. Type:									
a)Marsipus 20mm shaved without grooves (WRS)									
b)Marsipus 30mm shaved with grooves (BT) OR without grooves (WRS)									
c)Marsipus 40mm-50mm shaved with grooves (BT) OR without grooves (WRS)									
d)Marsipus 60mm-70mm-80mm shaved with grooves (BT) OR without grooves (WRS)									
e)Marsipus 100mm-120mm shaved with grooves (BT) OR without grooves (WRS)									
3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification:									
EN 13164:2012 - Thermal Insulation for Buildings									
4. Name and contact address of the manufacturer:									
Fibrotermica Hellas SA									
Sevasti-Pieria-Greece 60100									
5. System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product: System 3									
6. Name and identification number of notified body: I.G. (No 0407) & NB (No 1950)									

7. Essential characteristics EN 13164:2012		**Standard EN**	**Symbol**	**Performance**
Dimensional tolerances		EN 823	T	2
Compressive strength		EN 826	CS(10\Y) [kPa]	a)180 b)200 c)300 d)300 e)300
Tensile strength		EN 1607	TR [kPa]	400
Reaction to fire		EN 13501-1	Euroclass	E
Continuous glowing combustion				NPD
Acoustic absorption index				NPD
Water permeability	Long term water absorption by total immersion	EN 12087	WL(T) [vol%]	a) 0,7 b) 0,7 c) 0,7 d) 0,7 e) 1,5
	Long term water absorption by diffusion	EN 12088	WD(V) [vol%]	NPD
Water vapor transmission	Water vapor diffision resistance factor	EN 12086	MU	50
Durability of compressive strength against heat, weathering, ageing/degradation	Compressive creep	EN 1606	CC (2/1,5/50)	NPD
Durability of reaction to fire against heat, weathering, ageing/degracation	The reaction to fire performance of XPS does not change with time			
Thermal resistance and thermal conductivity	see below Rd and λd			
Durability of thermal resistance against heat, weathering, ageing/degradation	Freeze-thaw resistance after long term water diffusion tost	EN 12091	FTCD	NPD
	Freeze-thaw resistance after long term water absorption by total immersion	EN 12091	FTCI	NPD
	Dimensional stability under specified temperature and humidity conditions	EN 1604	DS	(70,90) (≤5%)
	Deformation under specified compressive load	EN 1605	DLT	NPD
Dangerous substances	Release of dangerous substances to the indoor environment			-

Thickness-d_N [mm]		**20**	**30**	**40**	**50**	**60**	**70**	**80**	**100**	**120**
Thermal resistance-Rd [(m²·K)/W]	EN 12667	0,66	0,94	1,21	1,52	1,82	2,06	2,35	2,94	3,53
Thermal conductivity-λd [W/(m·K)]	EN 12667	0,0304	0,0318	0,033			0,034			

Quality Assurance Manager
Dimitrios Kragiopoulos

Issue Date 1/7/2013

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

109

Декларация за експлоатационни показатели

Баумит МозаикТоп

Декларация за експлоатационни показатели №: 5945752003068

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
   Баумит МозаикТоп / Baumit MosaikTop

2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
   Баумит МозаикТоп – мазилка от цветни камъчета / Baumit MosaikTop

3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации**
   Мазилка от цветни камъчета с органични свързващи вещества, за външно приложение.

4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5**
   Баумит Румъния ЕООД
   бул. Юлиу Маниу № 600 А, сектор 6
   Букурещ, Румъния
   /
   SC Baumit Romania Com SRL
   B-dul Iuliu Maniu nr. 600 A, sector 6
   Bucuresti, Romania

5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
   Николай Бъчваров – Управител
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

6. **Система/системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V**
   Система 4 (EN 15824)

7. **В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:**
   –

8. **Експлоатационни показатели**

Свойства	Показатели	Стандарт
Пропускливост на водни пари	V2	EN 7783-2
Водопоглъщане	W3	EN 1062-3
Якост на сцепление	≥ 0,3 MPa	EN 1542
Дълготрайност	NPD	EN 13687-3
Топлопроводност	NPD	EN 1745
Реакция на огън	Евроклас F	EN 13501-1

Настоящият документ се предоставя на фирма Бодрост 96 ЕООД, в качеството й на клиент по договор за търговска продажба. Документът е валиден от 02.02.2015 г. до промяната му от страна на Баумит България.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

9. **Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.**

Подпис за производителя и от името на производителя:

Лауренциу Лупушор, Управител

Bucuresti, 02.02.2015
(място и дата)

(подпис)

Настоящият документ се предоставя на фирма Бодрост 96 ЕООД, в качеството ѝ на клиент по договор за търговска продажба. Документът е валиден от 02.02.2015 г. до промяната му от страна на Баумит България.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
DECLARATION OF PERFORMANCE
Nr. 59000098

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
Unique identification code of the product-type:

   Ytong B2.5, D440

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:
Type-, batch- or serial number or other marking for the identification of the construction product in accordance with Article 11paragraph 4:

   BG014054640014763

   BG024054640014763

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:
Intended use or uses defined by the manufacturer of the construction product in accordance with the applicable technical specification:

   Блокове за зидария от автоклавен клетъчен бетон от Категория I, в съответствие с EN 771-4:2011, предназначени за неносещи зидарии с тънкослоен лепилен разтвор

   Autoclaved Aerated Concrete masonry units Category I in accordance with EN 771-4:2011for non-load-bearing walls with thin bed mortar

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:
Name, registered trade name or trade mark and contact address of the manufacturer in accordance with Article 11, paragraph 5:

   „Ксела България" ЕООД, промишлена зона Кремиковци, 1870 София

   Xella Bulgaria EOOD, Promishlena zona Kremikovtsi, 1870 Sofia

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: –
When relevant, name and contact address of the authorised representative, who is in charge for the tasks referred to in Article 12, paragraph 2: –

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:
System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product in accordance with Annex V :

   СИСТЕМА 2+ за Категория 1 в съответствие с EN 771-4

   SYSTEM 2+ on the basis of Category I in accordance with EN 771-4

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:
In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

   ТЮФ Райнланд ЛГА Баутехник ГмбХ, 90431 Нюрнберг, Тилщрасе 2, идентификационен номер 0780 извърши първоначална проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, непрекъснато наблюдение, преценка и оценка на производствения контрол в предприятието по Система 2+ и издаде Сертификат за съответствие на производствения контрол в предприятието.
TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH, 90431 Nuernberg, Tillystrasse 2, identification number 0780 performed initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control and continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control under System 2+ and issued a Certificate of conformity of the factory production control.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

112

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка : –
In case of the declaration of performance concerning a construction product with a European Technical Assessment: –

9. Декларирани експлоатационни показатели
Declared performance

Размери *Dimensions*	*Länge, mm* *length, mm*		**600**	*600*
	Höhe, mm *height, mm*		**250**	250
	Breite, mm *width, mm*		**50**	50, 75, 100, 125,150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 375, 400
Допустими отклонения от размерите *Tolerances* Категория / *Category* Равнинност / *Flatness, mm* Успоредност / *Parallelism, mm*		≤ ≤	**TLMB** **1,0** **1,0**	EN 771-4
Средна якост на натиск при вертикално натоварване на кубично пробно тяло 100x100x100 mm, N/mm² *Average compressive strength vertical load on cubic specimen 100x100x100 mm, N/mm²*		≥ ≥	**NPD**	EN 772-1
Характеристична якост на натиск, N/mm² *Characteristically compressive strength, N/mm²*			**2,5** **перпендикулярно на основата** **perpendicular to the base**	EN 772-1
Постоянство на формата (свиваемост), mm/m *Dimensional stability (shrinkage), mm/m*		≤ ≤	**0,20**	EN 680
Якост на сцепление за тънкослоен лепилен разтвор, N/mm² *Initial shear strength for thin layer mortar, N/mm²*		≥ ≥	**0,30**	EN 998-2
Якост на сцепление за лек зидарски разтвор, N/mm² *Initial shear strength for lightweight mortar, N/mm²*		≥ ≥	**NPD**	EN 998-2
Реакция на огън *Reaction to fire*			**Евроклас A1 / Euroclass A1**	EN 13501-1
Абсорбция на вода, $g/m^2s^{0,5}$ *Water absorption, $g/m^2s^{0,5}$*	10 min: 30 min: 90 min:		**NPD** **да не се използва незащитен** **do not use unprotected**	EN 771-11
Коефициент на дифузия на водни пари *Water vapor permeability*			**5/10**	EN 1745
Брутна плътност в сухо състояние, kg/m³ *Gross dry bulk density, mean, kg/m³*			**440 ± 20**	EN 771-4
Профилиране на челните повърхности *Form and shape*			**гладки, зъб и длъб** **Plain, Tongue & Groove**	EN 771-4
Топлопроводност, W/(mK) *Thermal conductivity λ_{10dry} , W/(mK)*		≤ ≤	**λ_{10dry} (P=90%): 0,12** **λ_{10dry} (P=50%): NPD**	EN 1745
Мразоустойчивост *Durability against freezing and thaw*			**да не се използва незащитен** **do not use unprotected**	EN 772-18
Опасни вещества *Dangerous substances*			**не съдържа** **None**	–

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.
The performance of the product referring to paragraph 1 and 2 correspond to the declared performance at paragraph 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:
This declaration of performance was issued under the sole responsibility of the manufacturer specified in paragraph 4.

Подписано за и от името на производителя от:
Signed for and on behalf of the manufacturer:

Йенс Тиерфелдер, Управител „Продажби и маркетинг" на „Ксела Бългрария" ЕООД

(име и длъжност)

Jens Thierfelder, CEO Xella Bulgaria EOOD

(Name and function)

Sofia, 30.06. 2013

(Място и дата на издаване)

(Place and date of issue)

(Подпис)

(Signature)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

plastsistem

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Номер. **23-5**

1. Уникален идентификационен код на типа на продукта: **ISOAC5 40**
   Термоизолационен самоподдържащ се панел тип „сандвич" с 5 ребра и метални лица
2. Предназначение: **покриви и облицовки на покриви**
3. Производител **S.C. PLASTSISTEM S.A.**
   DN15A, km 45+500 (Bistrita-Reghin), Crainimat, com. Sieu-Magherus, jud. Bistrita-Nasaud, ROMANIA
   T: +40 263 342 250 | F: +40 263 342 276
4. Система за оценяване и проверка за установяване на постоянство на изпълнението: **3**
5. Хармонизиран стандарт: **EN 14509:2013**
6. Име и адрес на нотифицираната лаборатория - **FIRES, s.r.o –SLOVACIA**
7. **Деклариран(и) показател (и): Изолация: PUR, плътност: 35-40 kg/m^3; Дебелина 40mm**

Метални лица: външни: стомана 0,45 mm S250GD (EN 10346), покритие SP/25µm; вътрешни: стомана 0,40 mm; S220GD (EN 10346); покритие SP/25µm; Нормални толеранси;
Топлопроводимост: 0,0224 W/mK

Съществени характеристики:	Декларирано изпълнение		Съществени характеристики:	Декларирано изпълнение	
Тегло (информативно)	9,24	[kg/m^2]	**Натиск за образуване на гънки (външна лицева страна):**		
Коефициент на предаване на топлина-$U_{d,s}$	0,52	(W/m^{2}K)	В пълен размер	277	[MPa]
Коефициент на предаване на топлина –$U_{n,s}$	0,50	(W/m^{2}K)	В пълен размер, повишена температура	246	[MPa]
Механично съпротивление:			На централната опора	277	[MPa]
Издръжливост на опън	0,08	[Mpa]	На централната опора, повишена температура	246	[Mpa]
Якост на срязване	0,11	[MPa]			
Устойчивост на срязване по дължина:100000	0,04	[h]	Натиск за образуване на гънки (външна лицева страна):		
Абсолютна стойност на срязване (ядро)	3,17	[Mpa]	В пълен размер	143	[Mpa]
Устойчивост на якост ((ядро)	0,09	[Mpa]	На вътрешната опора	133	[Mpa]
Коефициент на пластична деформация:					
-2000	1,58	[h]	Реакция на огън (за всички приложения)	D-s3,d0	[клас]
-10000	2,53	[h]			
Устойчивост на огъване по размера (тестван размер 3000 mm):			Устойчивост на огън	NPD	
+ Положително огъване	3,64	[kNm/m]			
+ Положително огъване, повишена температура	3,24	[kNm/m]	Водопропускливост	NPD	
- Отрицателно огъване	3,61	[kNm/m]	Водопропускливост	NPD	
-Отрицателно огъване, повишена температура	3,22	[kNm/m]	Пропускливост на водни пари	Не пропуска	
Устойчивост на огъване на вътрешна опора:			Изолация на звук пренасян по въздуха:	NPD	
+ Положително огъване	3,64	[kNm/m]	Трайност:	Задоволителна	
+ Положително огъване, повишена температура	3,24	[kNm/m]	Устойчивост на концентриран товар-размер 1400 mm	1,2	[kN]
- Отрицателно огъване	3,61	[kNm/m]			
-Отрицателно огъване, повишена температура	3,22	[kNm/m]			

Експлоатационните показатели на продукта, посочен по-горе, съответстват на групата декларирани показатели. Тази декларация за експлоатационните показатели съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011, е издадена единствено на отговорност на горепосочения производител.

Подписана за и от името на производителя от:
ing. Cristian Emrich
Отговорник за управление на FPC

Crainimat, дата 25.02.2016

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

СЕРТИФИКАТ ЗА ГАРАНЦИЯ

С настоящия сертификат, в пълно съответствие с конкретното действащо законодателство, ние гарантираме качеството на продукта, посочен във фактурата, придружаваща декларацията за експлоатационните показатели – **ТЕРМОИЗОЛАЦИОНЕН ПАНЕЛ С ДВЕ МЕТАЛНИ ЛИЦА, ИЗПОЛЗВАН В СТРОИТЕЛСТВОТО**, при условие, че са спазени надлежно правилата за боравене, съхранение и транспорт, както и инструкциите за монтаж, дадени от производителя.

Гаранционен период и условия::

Свойства, покрити от гаранцията	Гаранционен период	Гаранционни условия
• покрития на металните лица • размерни характеристики • Физически свойства	2 години	При нормални условия на околната среда
Забележка: Проверката на качеството на продукта е задължителна, започвайки се от приемането до завършването на монтажа. Всяко несъответствие, забелязано по време на монтажа, изисква незабавно прекъсване на сглобяването и уведомяване на производителя.		

Продължителност на живота на продукта **: 25 години**

Гаранционен подход: Смяна или ремонт на некачествения продукт

Настоящата гаранция не покрива следните случаи:

- Разлики в цвета/нюанса поради процес на стареене, промяна на атмосферните условия или в случай на последователно производство/доставка на панелите за съответния проект.
- Панелите са били демонтирани преди това и сглобени отново;
- Панели, обекти на интервенции, извършени след монтаж, освен ако не е получено предварително съгласие от производителя и ако интервенцията не е била извършена с оборудване, одобрено от същия.;

Изключения от гаранцията:

- Продукти, повредени при транспорт (освен ако транспорт не е осигурен от производителя);
- Продукти, повредени от механични фактори поради грешка на бенефициента/клиента;
- В случай, че в товарителницата не са записани никакви дефекти, които да видими в опаковката по време на разтоварване и приемане на продуктите;
- Неспазване на правилата за боравене, съхранение и транспортиране;
- Неспазване на инструкциите за сглобяване и клаузите на ръководството за най-добри практики, достъпно на www.plastsistem.ro;
- Клиентът не представи декларацията за експлоатационните показатели и сертификата за гаранция;
- Възникване на непреодолими сили (конфликти, природни бедствия, пожар);
- Поява на дефекти на продукта поради промяна на предназначението при монтажа;
- Продукти, използвани в агресивни/корозионни среди или в случай на използване на вредни агент: висока влажност, пряк контакт с материали, които ускоряват корозията (като строителни елементи, направени от мед, или течности, протичащи през тях в случай на загуби), индустриални замърсители, изпарения и вредни газове, амоняк, хлор, сярна киселина, калиев нитрат, соли, химически разтворители и др. (без ограничаване на горните);

Допълнителна информация относно условията на гаранцията, изключенията, ограниченията, анулирането на гаранцията или други отговорности на производителя, се предоставя при поискване.

Всяко оплакване трябва да се изпрати в писмен вид до Plastsistem или на имейл: reclamatii@plastsistem.ro и следва да бъде разгледано в рамките на 15 дни от регистрирането му.

Частично възпроизвеждане и използване на настоящия документ за цели, различни от тези, за които е бил издаден, са изрично забранени. Производителят не носи отговорност за неконтролирани копия.

SC PLASTSISTEM SA

Дата : моля, вижте датата на издаване на декларацията за експлоатационните показатели

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

116

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

fibran®

No

1 Уникален идентификационен код на типа продукт	GR-2001-001
2 Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4	FIBRANgeo B-030 B-030
3 Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя	Thermal insulation for buildings (ThIB)
4 Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5	FIBRAN S.A. 56010, Thessaloniki, Greece
5 Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2	not relevant
6 Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V.	AVCP - System 1
7 В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт (наименование и номер на нотифицирания орган, ако е приложимо).	FIW No. 0751

FIW No. 0751 извърши по система описание на задачите на третата страна, посочени в приложение V). и издаде (сертификат за постоянството на експлоатационните показатели, сертификат за съответствие на производствения контрол в предприятието, протоколи от изпитвания/изчисления, според приложимото).

Хармонизиран стандарт EN 13162:2012

8 Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Означения	Мерни единици	Декларирани
Реакция на огън	Реакция на огън	RtF	Euroclass	A1
Отделяне на опасни вещества	Отделяне на опасни вещества			NPD
Индекс на звукопоглъщане	Звукопоглъщане			1
Индекс на въздействие при предаване на звука	Динамична коравина	s'	MN/m³	NPD
	Дебелина	d_L	mm	NPD
	Свиваемост	c	mm	NPD
	Съпротивление на въздухопреминаване	AF_r	kPa.s/m²	10
Индекс за звукоизолация на въздуха	Съпротивление на въздухопреминаване	AF_r	kPa.s/m²	10
Продължително горене с пламък	Продължително горене с пламък			NPD
Топлинно съпротивление	Топлинно съпротивление	R_D	m² K/W	see attached table
	Топлопроводност	λ_D	W/m K	0,035
	Дебелина	d_N	mm	40-160
	Клас Дебелина	T	Class	T4
Водопоглъщане	Водопоглъщане при кратковременно	W_p	kg/m²	<1
	Водопоглъщане при продължително	W_{lp}	kg/m²	<3
Преминаване на водна пара	Предаване на водна пара	t or Z	m².h.Pa/mg	1
Якост на натиск	Напрежение на натиск или Якост на	CS	kPa	NPD
	Концентриран товар	F_p	N	NPD
Дълготрайност на реакцията на огън при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Реакция на огън	RtF	Euroclass	A1
Дълготрайност на топлинната устойчивост при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Топлинно съпротивление	R	m² K/W	see attached table
	Топлопроводност	λ	W/m K	0,035
	Дълготрайни характеристики	d	mm	40-160
Якост на опън / Якост на огъване	Якост на опън перпендикулярно на	TR	kPa	NPD
Дълготрайност на якостта на натиск при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Пълзене при натоварване на натиск	Xct, Xt	mm	NPD

Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Spessore	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
R (m² K/W)	0,55	0,85	1,10	1,40	1,70	2,00	2,25	2,55	2,85	3,10	3,40	3,70	4,00	4,25	4,55

Име: Stella Chadiarakou

Длъжност: R&D -Quality Assurance Manager

Място: Thessaloniki

Дата: 01/07/2013

Подпис

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

117

BALKAN STEEL ENG.

Балкан Стийл Инженеринг

1532 - с. Казичене, София, ул. Циклама No 5
тел. 02/ 971 11 09, 973 34 42, факс. 02/ 971 92 33
e-mail: sales@balkansteel.com, www.balkansteel.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: "Балкан стийл инженеринг" ООД
с. Казичане, ул. "Циклама" №5

Декларирам, че материалът, за който се отнася тази декларация е в съответствие с приложения сертификат:

Сертификати с номера: 2012/100635/01-07.3.12:44172/07.1.13

№	вид стока
1	Поц. Ламарина лист 0,48x1000x2000 мм
2	Поц. Ламарина лист 0,40x1000x2000 мм
3	Поц. Ламарина лист 0,80x1000x2000 мм
4	Поц. Ламарина лист 0,60x1000x2000 мм

Металът е продаден с фактура № 0004018195 / 25.10.2012

На фирма МЕТАЛ ЕКСПРЕС ООД

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно член 313 от НК

София, 25.10.2012
/ дата и място /

Мениджър Продажби: .....
Венета Милтенова

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

118

KALITE KONTROL TEST SERTIFIKASI
QUALITY CONTROL TEST CERTIFICATE

tezcan

TEZCAN GALVANİZLİ YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

Organize Sanayi Bölgesi, Arslanbey Beldesi
41285 KOCAELİ/TÜRKİYE
Tel:0 262 351 33 00 Fax:0 262 351 20 01
Web: www.tezcan.com e-posta: info@tezcan.com

FIRMA / COMPANY	BALKAN STEEL
MALZEME / MATERIAL	HOT DIPPED GALVANIZED STEEL COILS
ÇELİK KALİTESİ / STEEL QUALITY	EN 10143 - TS EN 10346 DX 51D+Z140
ORDİNO NO / ORDER NO	44172
TARİH / DATE	07.01.2013
SERTİFİKA NO / CERTIFICATE NO	2

MEASUREMENT CONTROL					MECHANICAL PROPERTIES			CHEMICAL PROPERTIES %					
LOT NO	COIL NO	NOMINAL Kalınlık Thickness (mm)	Genişlik Width (mm)	Uzunluk Length (mm)	Mukavemet / Strength N/mm² AKMA YieldPoint N/MM²	KOPMA Tensile Strength N/MM²	% UZAMA Elongation	C	Mn	P	S	Si	Ti
	12117546	0,45	1250	COIL	333	405	23	0.040	0.291	0.014	0.011	0.030	0.001
	12117547	0,45	1250	COIL	333	405	23	0.040	0.291	0.014	0.011	0.030	0.001
	12117548	0,45	1250	COIL	333	405	23	0.040	0.291	0.014	0.011	0.030	0.001
	12117549	0,45	1250	COIL	333	405	23	0.040	0.291	0.014	0.011	0.030	0.001
	12117550	0,45	1250	COIL	319	390	24	0.042	0.250	0.012	0.018	0.030	0.001
	12117551	0,45	1250	COIL	319	390	24	0.042	0.250	0.012	0.016	0.030	0.001
	12117552	0,45	1250	COIL	319	390	24	0.042	0.250	0.012	0.016	0.030	0.001
	12117553	0,45	1250	COIL	319	390	24	0.042	0.250	0.012	0.016	0.030	0.001
	12117554	0,45	1250	COIL	326	382	23	0.044	0.290	0.012	0.018	0.030	0.003
	12117555	0,45	1250	COIL	326	382	23	0.044	0.290	0.012	0.018	0.030	0.003
	12117556	0,45	1250	COIL	326	382	23	0.044	0.290	0.012	0.016	0.030	0.003
	12117557	0,45	1250	COIL	326	382	23	0.044	0.290	0.012	0.016	0.030	0.003
	12117778	0,45	1250	COIL	328	379	24	0.040	0.236	0.015	0.011	0.025	0.002
	12117779	0,45	1250	COIL	328	379	24	0.040	0.236	0.015	0.011	0.025	0.002
	12117904	0,45	1250	COIL	328	379	24	0.040	0.236	0.015	0.011	0.025	0.002
	12117905	0,45	1250	COIL	328	379	24	0.040	0.236	0.015	0.011	0.025	0.002
	12117906	0,45	1250	COIL	325	375	25	0.042	0.300	0.014	0.012	0.030	0.003
	12117907	0,45	1250	COIL	325	375	25	0.042	0.300	0.014	0.012	0.030	0.003
	12117908	0,45	1250	COIL	325	375	25	0.042	0.300	0.014	0.012	0.030	0.003
	12117909	0,45	1250	COIL	325	375	25	0.042	0.300	0.014	0.012	0.030	0.003
	12117910	0,45	1250	COIL	328	396	24	0.047	0.202	0.012	0.014	0.029	0.001
	12117911	0,45	1250	COIL	328	396	24	0.047	0.202	0.012	0.014	0.029	0.001
	12117912	0,45	1250	COIL	328	396	24	0.047	0.202	0.012	0.014	0.029	0.001
	12117914	0,45	1250	COIL	328	396	24	0.047	0.202	0.012	0.014	0.029	0.001
	12117915	0,45	1250	COIL	335	412	23	0.042	0.255	0.014	0.016	0.029	0.003
	12117916	0,45	1250	COIL	335	412	23	0.042	0.255	0.014	0.016	0.029	0.003
	12117917	0,45	1250	COIL	335	412	23	0.042	0.255	0.014	0.016	0.029	0.003
	12117918	0,45	1250	COIL	335	412	23	0.042	0.255	0.014	0.016	0.029	0.003
	12116187	1,00	1000	COIL	318	382	27	0.041	0.219	0.010	0.012	0.026	0.002
	12116188	1,00	1000	COIL	318	382	27	0.041	0.219	0.010	0.012	0.026	0.002
	12116885	1,00	1000	COIL	320	376	28	0.047	0.231	0.013	0.015	0.025	0.002
	12116886	1,00	1000	COIL	320	376	28	0.047	0.231	0.013	0.015	0.025	0.002
	12224330	1,00	1000	COIL	322	391	26	0.040	0.209	0.010	0.012	0.021	0.003
	12224331	1,00	1000	COIL	322	391	26	0.040	0.209	0.010	0.012	0.021	0.003
	12224332	1,00	1000	COIL	322	391	26	0.040	0.209	0.010	0.012	0.021	0.003
	12118311	1,00	1250	COIL	324	380	28	0.051	0.236	0.014	0.012	0.032	0.002
	12118312	1,00	1250	COIL	324	380	28	0.051	0.236	0.014	0.012	0.032	0.002
	12118313	1,00	1250	COIL	324	380	28	0.051	0.236	0.014	0.012	0.032	0.002
	12118314	1,00	1250	COIL	324	380	28	0.051	0.236	0.014	0.012	0.032	0.002
	12118315	1,00	1250	COIL	312	369	27	0.039	0.198	0.012	0.014	0.031	0.002
	12118316	1,00	1250	COIL	312	369	27	0.039	0.198	0.012	0.014	0.031	0.002
	12118317	1,00	1250	COIL	312	369	27	0.039	0.198	0.012	0.014	0.031	0.002
	12118318	1,00	1250	COIL	317	372	26	0.039	0.218	0.015	0.012	0.024	0.003
	12118319	1,00	1250	COIL	317	372	26	0.039	0.218	0.015	0.012	0.024	0.003
	12118320	1,00	1250	COIL	317	372	26	0.039	0.218	0.015	0.012	0.024	0.003
	12226764	2,00	1250	COIL	331	382	24	0.041	0.222	0.016	0.014	0.021	0.003
	12226765	2,00	1250	COIL	331	382	24	0.041	0.222	0.016	0.014	0.021	0.003
	12226766	2,00	1250	COIL	331	382	24	0.041	0.222	0.016	0.014	0.021	0.003
	12226767	2,00	1250	COIL	331	382	24	0.041	0.222	0.016	0.014	0.021	0.003
	12227014	2,00	1000	COIL	296	364	28	0.044	0.216	0.015	0.016	0.030	0.002
	12227015	2,00	1000	COIL	296	364	28	0.044	0.216	0.015	0.016	0.030	0.002
	12227016	2,00	1000	COIL	296	364	28	0.044	0.216	0.015	0.016	0.030	0.002
	12227017	2,00	1000	COIL	296	364	28	0.044	0.216	0.015	0.016	0.030	0.002
	12227018	2,00	1000	COIL	302	372	27	0.045	0.236	0.015	0.014	0.022	0.003
	12227019	2,00	1000	COIL	302	372	27	0.045	0.236	0.015	0.014	0.022	0.003
	12227020	2,00	1000	COIL	302	372	27	0.045	0.236	0.015	0.014	0.022	0.003

DÖKÜLME TESTİ :
BEND TEST :

TESTED BY : Serkan YAĞCI
SIGNATURE :

APPROVED BY	DATE
	07.01.2013

KK 01 F 04.01

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Декларация за съответствие

Долуподписаният, СД „Кристиян –Дени Пандулев и Сие”, с адрес Благоевград, ул.Васил Левски №63,декларирам на собствена отговорност, че продуктът

Вент.решетка 200х200 бяла, АРТ.№ 010249

произведен в Производствена база на СД „Кристиян –Дени Пандулев и Сие”, с адрес гр.Благоевград, ул.Васил Левски №63 , за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол ISO 9001:2008 и съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

Пандулев и сие СД „КРИСТИЯН-ДЕНИ” Благоевград

10.8.2016 г.
Благоевград

Л.Пандулев
Управител

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

СД „Кристиян –Дени Пандулев и Сие“, България, гр.Благоевград, ул.В.Левски №63,
тел.:073/82877101, факс:073/82877105, mail :k_d@abv.bg, office@kristiandeni.com

СтилКомплект Благоевград

120

“С Т И Л П Л А С Т” ООД
Централен офис: гр. София, кв.Малашевци, ул. “Жак Дюкло” № 55
тел. 02/ 936 61 66, факс 02/ 936 6336, email:stilplast@mail.bg, www.stilplast.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ И ПРОИЗХОД НА ПРОДУКТА

Фирма “СТИЛПЛАСТ България” ООД, гр.София, кв. Малашевци, ул.”Жак Дюкло” №55, декларира на собствена отговорност, че продуктът: Стъклопакет с ширина 24мм. с едно бяло и едно Ка-нискоемисийно стъкла по 4мм. и дистанционер 16мм. е в съответствие съгласно изискванията на Наредбата за съществени изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти и се произвежда в България на адрес: гр.София, кв. Малашевци, ул.”Жак Дюкло” №55

Произход на стъклата: Glaverbel

Декларацията се издава въз основа на документирана и работеща система за производствен контрол в съответствие с БДС и внедрена система за управление на качеството по изискванията на международния стандарт EN ISO 9001:2000

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

гр.София

“Стилпласт”: "СТИЛПЛАСТ БЪЛГАРИЯ" ООД София

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Стилкомплект Благоевград

Обобщен протокол от изпитване
Устойчивост на ветрово натоварване, херметичност при пороен дъжд, въздухопропускливост, оперативни сили, механично напрежение, якост на умора, капацитет на натоварване на устройствата за безопасност

№ 101 32274

ift
РОЗЕНХАЙМ

Възложител	**"алупласт" ГмбХ (aluplast GmbH)** **Пластмасови профили** "Ауф дер Брайт" № 2 76227 Карлсруе, Германия
Елемент	Прозорци и френски прозорци със следните видове отваряне: със завъртане, накланяне и завъртане, неподвижни и с повдигащо се средно крило, паралелно плъзгане и повдигане
Наименование на системата	IDEAL 4000
Материал на рамката	PVC-U/бял
Описание на системата	Извадка - вж. Приложение 3
Специални характеристики	Опитни образци 2-5 от профили съгл. EN 12608, клас Б (дебелина на стената за видимите повърхности ≥ 2,5 mm, за невидимите повърхности ≥ 2,0 mm)

Опитен образец		1	2	3	4	5
Графично представяне						
Размер на прозореца в mm						
Изпитване		Класификация				
EN 12210	Издръжливост при ветрово натоварване	**C4 / B4**	**C4**	**C3 / B3**	**C4 / B4**	**C4 / B4**
EN 12208	Херметичност при пороен дъжд	**E 900**	**E 1050**	**E 750**	**E 750**	**E 900**
EN 12207	Въздухопропускливост	4	4	4	4	4
EN 13115	Оперативни сили	1	1	1	1	1
EN 13115	Механично натоварване	4	4	4	4	4
EN 12400	Якост на умора	2	2	2	2	2
EN 13049	Удароустойчивост	3* * Това свойство беше изпитано на отделни екземпляри от опитен образец 2				
	Капацитет на натоварване на устройствата за безопасност	Изискването изпълнено	Изискването изпълнено	Изискването изпълнено	Изискването изпълнено	Изискването изпълнено

Директива на **ift** FE-06/1 (август 2005 г.) "Изпитване на механични и челно заварени Т-образни връзки за пластмасови прозорци"	Изискването изпълнено
Изпитване на опън и разкъсване по RAL-RG 607/3 : 1995-02 Предписания за оценка на качеството и изпитване за обкови на накланящи се и въртящи се прозорци	Изискването изпълнено

Основни положения
EN 14351-1 : външни прозорци и врати - стандарт за продукт

Стандарти на методите за изпитване
EN 1026 : 2000-06
EN 1027 : 2000-06
EN 12211 : 2000-06
EN 12046-1 : 2003-11
EN 14608 : 2004-03
EN 14609 : 2004-03
EN 1191 : 2000-02
RAL-RG 607/3

Графично представяне



Инструкции за употреба
Този протокол от изпитване служи за сертифициране на гореспоменатите свойства за прозорци по EN 14351-1 2006-03.

Валидност
Резултатите от тестовете могат да се прехвърлят в съответствие с матрицата на пренос (точка 2)
Не са взети под внимание атмосферни влияния и ефекти на стареене.

Бележки към изданието
Валидна е брошурата на **"ифт"** „Условия и указания за използване на документацията за изпитване на **ift**".

Съдържание
Сертификатът за изпитване на системата обхваща общо 69 страници.
Приложение 1: Основни положения
Приложение 2: Матрица на пренос
Приложение 3 Извадка от описанието на системата
Приложение 4: Важни характеристики на системата

"ифт Розенхайм" (ift Rosenheim)
23 април 2007 г.

Подпис:
/не се чете/

Йорн Петер Лас, дипл. инж. (СВУЗ)
Ръководител на изпитвателната лаборатория
ift - център за прозорци и фасади

Подпис:
/не се чете/

Роберт Колачни, дипл. инж. (СВУЗ)
Тест инженер
ift - център за прозорци и фасади

"ифт Розенхайм ГмбХ (ift Rosenheim GmbH)
"Теодор Гитл Щрасе" № 7-9
83026 Розенхайм, Германия

Изпълнителни директори:
Дипл. инж. (СВУЗ) Улрих Зиберат
Д-р Йохен Пайхл

Тел.: +49(0)8031/261-0
Факс: +49 (0)8031/261-290
www.ift-rosenheim.de

Седалище: 83026 Розенхайм, Германия
РС Траунщайн, Търг. рег. 14763
Шпаркасе Розенхайм
Банкова сметка 3822
BLZ 711 500 00

Нотифициран орган № 0757
Призната лаборатория за изпитване, инспектиране и сертифициране BAY 18

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА.

Германски съвет за акредитация
DAR
DAP-PL-0808.99
DAP-ZE-2288.00
TGA-ZM-1693-00
TGA-ZM-1693-60

122

Експертно становище

№ 155 32274 към сертификат за изпитване 101 32274

Устойчивост на ветрово натоварване, херметичност при пороен дъжд, въздухопропускливост, оперативни сили, механично напрежение, якост на умора, капацитет на натоварване на устройствата за безопасност

ift
РОЗЕНХАЙМ

Възложител	**"алупласт" ГмбХ (aluplast GmbH)** **Пластмасови профили** "Ауф дер Брайт" № 2 76227 Карлсруе, Германия
Елемент	Прозорци и френски прозорци със следните видове отваряне: със завъртане, накланяне и завъртане, неподвижни и с повдигащо се средно крило, паралелно плъзгане и повдигане
Наименование на системата	IDEAL 4000
Материал на рамката	PVC-U/бял
Предмет	Пренасяне на резултатите върху профили съгласно EN 12608 клас A (дебелина на стената за видимите повърхности ≥ 2,8 mm, за невидимите повърхности ≥ 2,5 mm)
валиден до	**21 юни 2012 г.**[1)]

Опитен образец		1	2	3	4
Графично представяне					
Размер на прозореца в mm					
Изпитване		Класификация			
EN 12210	Издръжливост при ветрово натоварване	**C4 / B4**	**C4**	**C3 / B3**	**C4 / B4**
EN 12208	Херметичност при пороен дъжд	**E 900**	**E 1050**	**E 750**	**E 750**
EN 12207	Въздухопропускливост	4	4	4	4
EN 13115	Оперативни сили	1	1	1	1
EN 13115	Механично натоварване	4	4	4	4
EN 12400	Якост на умора	2	2	2	2
EN 13049	Удароустойчивост	3* * Това свойство беше изпитано на отделни екземпляри от опитен образец 2			
	Капацитет на натоварване на устройствата за безопасност	Изискването изпълнено	Изискването изпълнено	Изискването изпълнено	Изискването изпълнено
Директива на **ift** FE-06/1 (август 2005 г.) "Изпитване на механични и челно заварени Т-образни връзки за пластмасови прозорци"					Изискването изпълнено
Изпитване на опън и разкъсване по RAL-RG 607/3 : 1995-02 Предписания за оценка на качеството и изпитване за обкови на накланящи се и въртящи се прозорци					Изискването изпълнено

"ифт Розенхайм" (ift Rosenheim)
27 юни 2007 г.
Йорн Петер Лас, дипл. инж. (СВУЗ)
Ръководител на изпитвателната лаборатория
ift - център за прозорци и фасади

Подпис:
/не се чете/

Подпис:
/не се чете/

Роберт Колачни, дипл. инж. (СВУЗ)
Тест инженер
ift - център за прозорци и фасади

"ифт Розенхайм ГмбХ (ift Rosenheim GmbH)
"Теодор Гитл Щрасе" № 7-9
83026 Розенхайм, Германия
Седалище: 83026 Розенхайм, Германия
РС Траунщайн, Търг. рег. 14763

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Нотифициран орган № 0757
Призната лаборатория за изпитване, инспектиране и сертифициране BAY 18

Основни положения
Стандарти за изпитване и класификация
EN 1026, EN 12207
EN 1027, EN 12208
EN 12211, EN 12210
EN 12046-1, EN 13115
EN 14608, EN 14609

Предписания за оценка на качеството и изпитване за прозорци, врати, фасади и зимни градини RAL-GZ 695, издание 2005 г.
Протокол от изпитване на система 101 32 274 от 23 април 2007 г.

Инструкции за употреба Това експертно становище служи за сертифициране на споменатите свойства за прозорци.
Настоящото експертно становище е предпоставка за получаване на сертификат за пригодност в рамките на стандарта за осигуряване на качество RAL за прозоречна система IDEAL 4000 съгласно предписанията за оценка на качеството и изпитване RAL-GZ 695.

Настоящото експертно становище не включва всички изброени в продуктовия стандарт експлоатационни характеристики.

Валидност
Изследването на гореспоменатите характеристики не предоставя никаква информация относно останалите свойства, определящи характеристиките и качеството на настоящата конструкция.
Протоколът от изпитване на системата е валиден за максимален срок от 5 години, при условие, че междувременно не са предприемани промени в системата.
Атмосферни влияния и ефекти на стареене не са взети под внимание.

Бележки към изданието
Валидна е брошурата на **"ифт"** „Условия и указания за използване на протоколите от изпитване на ift". Титулната страница може да се използва като обобщение.

Съдържание
Експертното становище обхваща общо 6 страници.

1 Поръчка
2 Основни положения
3 Оценка
4 Резултати и изявления
Приложение 1 матрица на пренос

123

ift
РОЗЕНХАЙМ

Изпълнителни директори:
Дипл. инж. (СВУЗ) Улрих Зиберат
Д-р Йохен Пайхл

Тел.: +49(0)8031/261-0
Факс: +49 (0)8031/261-290
www.ift-rosenheim.de

Шпаркасе Розенхайм
Банкова сметка 3822
BLZ 711 500 00

Германски съвет за акредитация
DAR

DAP-PL-0808.99
DAP-ZE-2288.00
TGA-ZM-16-93-00
TGA-ZM-1693-60

Експертно становище

ift
РОЗЕНХАЙМ

455 25317/1 от 17 април 2007 г.

към сертификат 402 25317/1 от 2 март 2002 г.
коефициент на топлопреминаване U_f

Възложител	**"алупласт" ГмбХ (aluplast GmbH)** **Пластмасови профили** "Ауф дер Брайт" № 2 76227 Карлсруе, Германия
Продукт	Профилна комбинация каса и крило
Обозначение	IDEAL 4000 5-камерна версия (FR 140028 / BR 140007)
Размер на напречното сечение	Елементи: Рамка на касата 70 / 70 mm Рамка на крилото 82 / 79 mm Ширина на фасадата 124 mm
Материал	PVC-U/бял
Армировка	Стомана, поцинкована
Специални характеристики	-
други варианти на изпълнение	**вж. приложенията**

Основни положения
EN 12412-2 : Определяне на коефициент на топлопреминаване по метода гореща кутия, част 2: Рамки
Протокол от изпитване № 402 25317/1 от 2. март 2002 г.

Графично представяне
вж. Приложение 1

Инструкции за употреба
Това становище служи за удостоверяване на коефициента на топлопреминаване U_f на профили за рамки.

Валидност
Приведените данните и резултати се отнасят само до изпитаната и описана профилна система.
Изследването на коефициента на топлопреминаване не предоставя никаква информация относно останалите свойства, определящи характеристиките и качеството на настоящата конструкция.
Настоящото становище губи своята валидност с изтичането на валидността на гореспоменатите основни положения (стандарти или документация за изпитване)

Бележки към изданието
Валидна е брошурата на "ифт" „Условия и указания за използване на документацията за изпитване на ift".
Титулната страница може да се използва с типовата листа като обобщение.

Коефициент на топлопреминаване



U_f = 1,3 W/(m² · K)*

*) въз основа на протокол от изпитване 402 25317/1 и допълнителната информация, свързана с изменения

Печат:
"ифт Розенхайм" (ift Rosenheim)
* BAY 18 *
ифт (ift)
Призната в процеса на осъществяване на строителен надзор изпитвателна лаборатория за определяне коефициента на топлопреминаване

Съдържание
Сертификатът обхваща общо 5 страници
Титулна страница
Експертно становище
1 Поръчка
2 Основни положения
3 Оценка
4 Резултати и изявления
Приложения

"ифт Розенхайм" (ift Rosenheim)
17 април 2007 г.

Подпис:
/не се чете/

Норберт Зак, дипл. физ.
Ръководител на лабораторията по строителна физика
ift - център за стъкло, строителни материали и строителна физика

Подпис:
/не се чете/

Ханс-Юрген Хартман, дипл. инж. (СВУЗ)
Тест инженер
ift - център за стъкло, строителни материали и строителна физика

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Благоевград

124

ift РОЗЕНХАЙМ
Изпълнителни директори:
Дипл. инж. (СВУЗ) Улрих Зиберат
Д-р Йохен Пайхл
Тел.: +49(0)8031/261-0
Факс: +49 (0)8031/261-290
www.ift-rosenheim.de
Шпаркасе Розенхайм
Банкова сметка 3822
BLZ 711 500 00

Германски съвет за акредитация
DAP-PL-0808.99
DAP-ZE-2288.00
TGA-ZM-16-93-00
TGA-ZM-1693-60

aluplast
Пластмасови прозоречни системи

IDEAL 4000

Август 2009 г.
01 E Глава
01 Страница

Лист с технически данни за продукта

Стандартен пластмасов прозорец
aluplast IDEAL 4000
5-камерен
екструдирана повърхност (fv.)

Материали	Твърд PVC, многокамерен профил със стоманена армировка Термоизолационно стъкло (остъкляване съгласно таблица U_g)
Характеристики:	Пропускливост на фугите / Издръжливост при дъжд: BAG C по DIN 18055 или Пропускливост на фугите 3 по DIN EN 12207 и клас на водонепроницаемост 9A по DIN EN 12208. Акустични показатели (за стъкло с дебелина 4 mm или 2 x 3 x 4 mm): $R_{w,P}$ = 33 dB ($R_{w,R}$ = $R_{w,P}$ - 2 dB) P: тестова стойност; R: изчислена стойност
Топлоизолация:	U_w стойностите по DIN EN ISO 10077-1 са изчислени до втория знак след десетичната запетая и могат да бъдат използвани в Европа. U_w стойностите по DIN V 4108-4 са взети от локалната таблица и се използват само в Германия. Моля, при позоваване на U_w стойности посочвайте винаги кой стандарт е използван (може да бъде отбелязан в таблицата).
Особености:	Чрез използването на шумоизолационно стъкло може да бъде постигната стойност $R_{w,P}$ von 46 dB ($R_{w,R}$ = $R_{w,P}$ - 2 dB). P: тестова стойност; R: изчислена стойност
Доставчик на системата:	"алупласт" ГмбХ, "Ауф дер Брайт" № 2, 76227, Карлсруе, Германия
Референтна стойност:	123 cm 148 cm 1,23m x 1,48m Мащаб 1:50

Основна профилна комбинация:

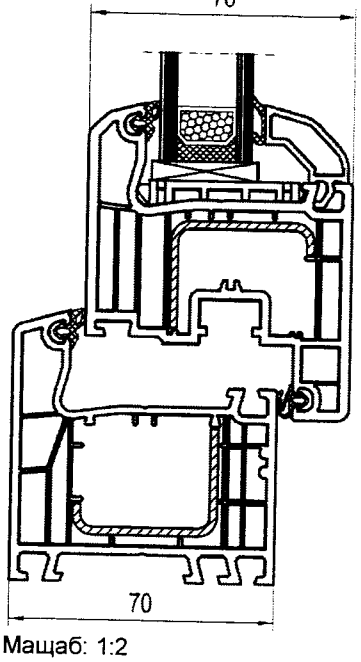

Мащаб: 1:2

U_g остъкляване DIN EN 673 **ΔT (15°C)** [W/m²K]	U_f рамка пресметната [W/m²K]	U_w прозорец Връзка на рамката на изолиращото стъкло: Standard z.B Alu **Ψ (Psl)** 0,07 [W/mK] DIN EN ISO 10077-1 -> CE-маркировка [W/m²K]	DIN V 4108-4 Издание 2004-07 (издателство Beuth) [W/m²K]	U_w прозорец Връзка на рамката на изолиращото стъкло: топъл кант **Ψ (Psl)** 0,04 [W/mK] DIN EN ISO 10077-1 -> CE-маркировка [W/m²K]	DIN V 4108-4 Издание 2004-07 (издателство Beuth) [W/m²K]
1,4	1,3	1,6 (1,54)	1,5	1,5 (1,46)	1,4
1,3	1,3	1,5 (1,47)	1,5	1,4 (1,40)	1,4
1,2	1,3	1,4 (1,40)	1,4	1,3 (1,33)	1,3
1,1	1,3	1,3 (1,34)	1,3	1,3 (1,26)	1,2

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

1,0	1,3	1,3 (1,27)		1,3		1,2 (1,20)		1,2	
0,9	1,3	1,2 (1,20)		1,2		1,1 (1,13)		1,1	
0,8	1,3	1,1 (1,14)		1,1		1,1 (1,07)		1,0	
0,7	1,3	1,1 (1,07)		1,1		1,0 (1,00)		1,0	
0,6	1,3	1,0 (1,01)		1,0		0,93		0,9	
0,5	1,3	0,94		0,9		0,87		0,8	
0,4	1,3	0,87		-		0,80		-	

Забележка: U_w стойностите < 1,0 W/m²K са посочени в съответствие с DIN EN ISO 10077 с 2 знака след десетичната запетая

Запазваме си правото на технически промени и грешки е запазено!

Мащаб: ~
01_E_01_4*

Общ лист с технически данни за продукта

aluplast
Пластмасови прозоречни системи

IDEAL 4000

Август 2009 г.
01 E Глава **02** Страница

Лист с технически данни за продукта

Стандартен пластмасов прозорец aluplast IDEAL 4000
5-камерен
екструдирана повърхност (fv.)

Материали: Твърд PVC, многокамерен профил със стоманена армировка
Термоизолационно стъкло (остъкляване съгласно таблица U_g)

Характеристики: Пропускливост на фугите / Издръжливост при дъжд: BAG C по DIN 18055 или
Пропускливост на фугите 3 по DIN EN 12207 и клас на водонепроницаемост 9A по DIN EN 12208.
Акустични показатели (за стъкло с дебелина 4 mm или 2 x 3 x 4 mm):
$R_{w,P}$ = 33 dB ($R_{w,R} = R_{w,P}$ - 2 dB)
P: тестова стойност; R: изчислена стойност

Топлоизолация: U_w стойностите по DIN EN ISO 10077-1 са изчислени до втория знак след десетичната запетая и могат да бъдат използвани в Европа.
U_w стойностите по DIN V 4108-4 са взети от локалната таблица и се използват само в Германия.
Моля, при позоваване на U_w стойности посочвайте винаги кой стандарт е използван (може да бъде отбелязан в таблицата).

Особености: Чрез използването на шумоизолационно стъкло може да бъде постигната стойност
$R_{w,P}$ von 46 dB ($R_{w,R} = R_{w,P}$ - 2 dB).
P: тестова стойност; R: изчислена стойност

Доставчик на системата: "алупласт" ГмбХ, "Ауф дер Брайт" № 2, 76227, Карлсруе, Германия

Референтна стойност:

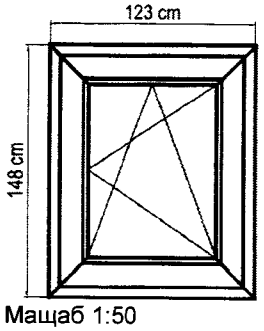

1,23m x 1,48m

Мащаб 1:50

Основна профилна комбинация:

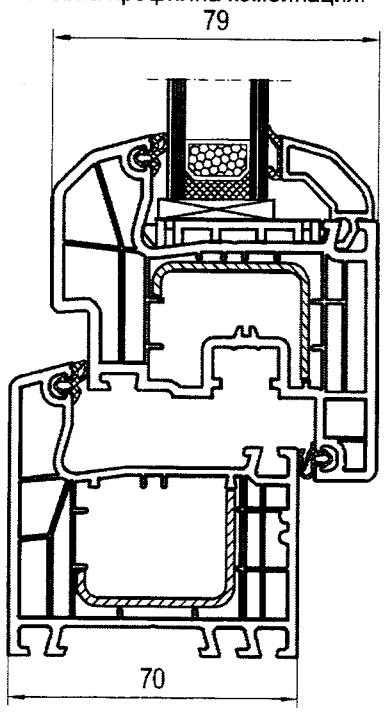

Мащаб: 1:2

U_g остъкляване	U_f рамка	U_w прозорец							
		Връзка на рамката на изолиращото стъкло: Standard z.B Alu				Връзка на рамката на изолиращото стъкло: топъл кант			
		Ψ (Psi) 0,07 [W/mK]				**Ψ (Psi)** 0,04 [W/mK]			
DIN EN 673 **ΔT (15°C)**	пресметната	DIN EN ISO 10077-1 -> CE-маркировка		DIN V 4108-4 Издание 2004-07 (издателство Beuth)		DIN EN ISO 10077-1 -> CE-маркировка		DIN V 4108-4 Издание 2004-07 (издателство Beuth)	
[W/m²K]	[W/m²K]	[W/m²K]		[W/m²K]		[W/m²K]		[W/m²K]	
1,4	1,3	1,5 (1,54)		1,5		1,5 (1,47)		1,4	
1,3	1,3	1,5 (1,47)		1,5		1,4 (1,40)		1,4	

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Стилпласт Благоевград

1,2	1,3	1,4 (1,40)		1,4		1,3 (1,33)		1,3	
1,1	1,3	1,3 (1,34)		1,3		1,3 (1,26)		1,2	
1,0	1,3	1,3 (1,27)		1,3		1,2 (1,19)		1,2	
0,9	1,3	1,2 (1,20)		1,2		1,1 (1,13)		1,1	
0,8	1,3	1,1 (1,13)		1,1		1,1 (1,06)		1,0	
0,7	1,3	1,1 (1,06)		1,1		0,99		1,0	
0,6	1,3	1,0 (1,00)		1,0		0,92		0,9	
0,5	1,3	0,93		0,9		0,85		0,8	
0,4	1,3	0,87		-		0,80		-	

Забележка: U_w стойностите < 1,0 W/m²K са посочени в съответствие с DIN EN ISO 10077 с 2 знака след десетичната запетая

Запазваме си правото на технически промени и грешки е запазено!

Мащаб: ~
01_E_01_4*

Общ лист с технически данни за продукта

aluplast
Пластмасови прозоречни системи

IDEAL 4000

Август 2009 г.
01 E Глава
03 Страница

Материали: Твърд PVC, многокамерен профил
със стоманена армировка
Термоизолационно стъкло (остъкляване съгласно таблица U_g)

Характеристики: Пропускливост на фугите / Издръжливост при дъжд:
BAG C по DIN 18055 или
Пропускливост на фугите 3 по DIN EN 12207 и клас на водонепроницаемост 9A по DIN EN 12208.
Акустични показатели (за стъкло с дебелина 4 mm или 2 x 3 x 4 mm):
$R_{w,P}$ = 33 dB ($R_{w,R} = R_{w,P}$ - 2 dB)
P: тестова стойност; R: изчислена стойност

Топлоизолация: U_w стойностите по DIN EN ISO 10077-1 са изчислени до втория знак след десетичната запетая и могат да бъдат използвани в Европа.
U_w стойностите по DIN V 4108-4 са взети от локалната таблица и се използват само в Германия.
Моля, при позоваване на U_w стойности посочвайте винаги кой стандарт е използван (може да бъде отбелязан в таблицата).

Особености: Чрез използването на шумоизолационно стъкло може да бъде постигната стойност
$R_{w,P}$ von 46 dB ($R_{w,R} = R_{w,P}$ - 2 dB).
P: тестова стойност; R: изчислена стойност

Доставчик на системата: "алупласт" ГмбХ, "Ауф дер Брайт" № 2, 76227, Карлсруе, Германия

Референтна стойност:

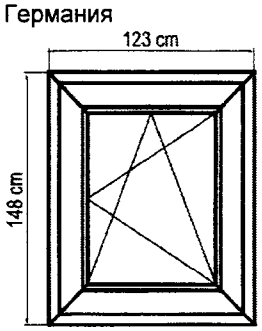

1,23m x 1,48m

Мащаб 1:50

Лист с технически данни за продукта

Стандартен пластмасов прозорец
aluplast IDEAL 4000
5-камерен
екструдирана повърхност (fv.)

Основна профилна комбинация:

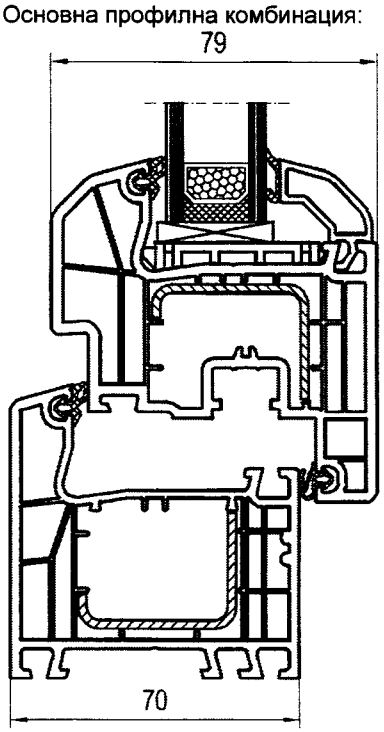

Мащаб: 1:2

U_g остъкляване	U_f рамка	U_w прозорец			
		Връзка на рамката на изолиращото стъкло: Standard z.B Alu		Връзка на рамката на изолиращото стъкло: топъл кант	
		Ψ (Psi) 0,07	[W/mK]	**Ψ (Psi)** 0,04	[W/mK]
DIN EN 673	пресметната	DIN EN ISO 10077-1	DIN V 4108-4	DIN EN ISO 10077-1	DIN V 4108-4
ΔT (15°C)		-> CE-маркировка	Издание 2004-07 (издателство	-> CE-маркировка	Издание 2004-07 (издателство Beuth)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Стилкомплекс Благоевград

12

[W/m²K]	[W/m²K]	[W/m²K]	Beuth) [W/m²K]	[W/m²K]	[W/m²K]
1,4	1,3	1,5 (1,54)	1,5	1,5 (1,47)	1,4
1,3	1,3	1,5 (1,47)	1,5	1,4 (1,40)	1,4
1,2	1,3	1,4 (1,40)	1,4	1,3 (1,33)	1,3
1,1	1,3	1,3 (1,34)	1,3	1,3 (1,26)	1,2
1,0	1,3	1,3 (1,27)	1,3	1,2 (1,20)	1,2
0,9	1,3	1,2 (1,20)	1,2	1,1 (1,13)	1,1
0,8	1,3	1,1 (1,13)	1,1	1,1 (1,06)	1,0
0,7	1,3	1,1 (1,07)	1,1	0,99	1,0
0,6	1,3	1,0 (1,00)	1,0	0,92	0,9
0,5	1,3	0,93	0,9	0,86	0,8
0,4	1,3	0,86	-	0,79	-

Забележка: U_w стойностите < 1,0 W/m²K са посочени в съответствие с DIN EN ISO 10077 с 2 знака след десетичната запетая

Запазваме си правото на технически промени и грешки е запазено!

Мащаб: ~
01_E_01_4*

Общ лист с технически данни за продукта

Сертификат
Въздушна звукоизолация на елементите

Протокол от изпитване 161 32941 / Z06-Z07

РОЗЕНХАЙМ

Възложител	**"алупласт" ГмбХ (aluplast GmbH)** **Пластмасови профили** "Ауф дер Брайт" № 2 76227 Карлсруе, Германия
Продукт	Единичен прозорец с едно отваряемо крило
Обозначение	IDEAL 4000, RAL и EU-B
Външни размери (Ш x В)	1230 mm x 1480 mm
Материал	Пластмаса, PVC-U с армировка, бяла
Вид отваряне	С накланяне и завъртане
Фалцови уплътнения	1 външно и 1 вътрешно уплътнение
Пълнеж	Стъклопакети, VSG Si/16/13 VSG Si
Специални характеристики	Изпитване на два варианта рамки по RAL и EU-B с идентично остъкляване Звукоизолация на стъклопакета: R_w = 48 dB, съгл. данните на възложителя

Основни положения
EN ISO 140-1:1997+A1:2004
EN 20140-3:1995+A1:2004
EN ISO 717-1:1996+A1:2006

Графично представяне



Определен коефициент на звукопоглъщане R_w
Стойности за спектрална корекция C и C_{tr}



R_w (C; C_{tr}) = 44 (-1;-2) dB

Инструкции за употреба
Този протокол от изпитване служи за сертифициране на въздушната звукоизолация на определен елемент.
За Германия е в сила
- $R_{w,R}$ по DIN 4109:
(R_w съответства на R_{wP},
$R_{w,R} = R_{w,P}$ - 2 dB)
- Rw,R за списък със строителни правила и стандарти

Валидност
Посочените данни и резултати се отнасят изключително за изпитаните и описани оригинални образци.
Изпитването на звукоизолацията не предоставя никаква информация относно останалите

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Благоевград

128

свойства, определящи характеристиките и качеството на настоящата конструкция.

Бележки към изданието
Валидна е брошурата на **"ифт"** „Условия и указания за използване на документацията за изпитване на **ift**".
Титулната страница може да се използва като обобщение.

Съдържание
Сертификатът обхваща общо 10 страници
1. Предмет
2. Провеждане
3. Отделни резултати
4. Инструкции за употреба
Измервателна скала (1 страница)

"ифт Розенхайм" (ift Rosenheim)
8 март 2007 г.

Подпис:
/не се чете/

Бернд Зас, дипл. инж. (СВУЗ)
И.д. ръководител на изпитвателната лаборатория
ift - център за акустична защита

Подпис:
/не се чете/

Д-р Йоахим Хесингер, дипл. физ.
Тест инженер
ift - център за акустична защита

LSW - Лаборатория за аудиометрична и топлоизмервателна техника

Изпълнителни директори:
Д-р Йохен Пайхл
Проф. Фриц Холц

"Лакерманвег" № 26
83071 Щефанкирхен, Германия

Тел.: +49(0)8036/3006-0
Факс: +49 (0)8036/3006-33
www.lsw-gmbh.de

Седалище: 83026 Розенхайм, Германия
РС Траунщайн, Търг. рег. 14821
Шпаркасе Розенхайм
Kto 500 434 626
BLZ 711 500 00

Призната лаборатория за изпитване, инспектиране и сертифициране съгласно Строителен правилник: BAY 24
Акредитирана изпитвателна лаборатория от група I за проверка на годността и качеството съгласно DIN 4109

Сертификат
Въздушна звукоизолация на елементите

Протокол от изпитване 161 32941 / Z06-Z10

ift РОЗЕНХАЙМ

Възложител	**"алупласт" ГмбХ (aluplast GmbH)** **Пластмасови профили** "Ауф дер Брайт" № 2 76227 Карлсруе, Германия
Продукт	Единичен прозорец с едно отваряемо крило
Обозначение	IDEAL 4000, RAL и EU-B
Външни размери (Ш x В)	1230 mm x 1480 mm
Материал	Пластмаса, PVC-U с армировка, бяла
Вид отваряне	С накланяне и завъртане
Фалцови уплътнения	1 външно и 1 вътрешно уплътнение
Пълнеж	Стъклопакети, 6/16/4
Специални характеристики	Изпитване на два варианта рамки по RAL и EU-B с идентично остъкляване Звукоизолация на стъклопакета: R_w = 36 dB, съгл. данните на възложителя

Основни положения
EN ISO 140-1:1997+A1:2004
EN 20140-3:1995+A1:2004
EN ISO 717-1:1996+A1:2006

Графично представяне

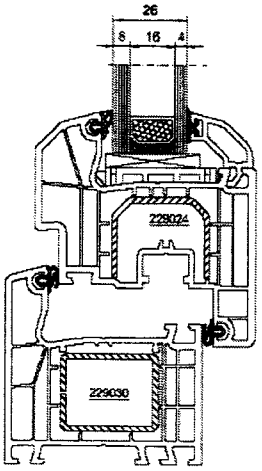

Определен коефициент на звукопоглъщане R_w
Стойности за спектрална корекция C и C_{tr}
R_w (C; C_{tr}) = 37 (-1;-4) dB



Инструкции за употреба
Този протокол от изпитване служи за сертифициране на въздушната звукоизолация на определен елемент.
За Германия е в сила
- $R_{w,R}$ по DIN 4109:
(R_w съответства на $R_{w,P}$
$R_{w,R} = R_{w,P}$ - 2 dB)
- Rw,R за списък със строителни правила и стандарти

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



Валидност
Посочените данни и резултати се отнасят изключително за изпитаните и описани опитни образци.
Изпитването на звукоизолацията не предоставя никаква информация относно останалите свойства, определящи характеристиките и качеството на настоящата конструкция.

Бележки към изданието
Валидна е брошурата на **"ифт"** „Условия и указания за използване на документацията за изпитване на **ift**".
Титулната страница може да се използва като обобщение.

Съдържание
Сертификатът обхваща общо 10 страници
1. Предмет
2. Провеждане
3. Отделни резултати
4. Инструкции за употреба
Измервателна скала (1 страница)

"ифт Розенхайм"
(ift Rosenheim)
8 март 2007 г.

Подпис:
/не се чете/

Бернд Зас, дипл. инж. (СВУЗ)
И.д. ръководител на изпитвателната лаборатория
ift - център за акустична защита

Подпис:
/не се чете/

Д-р Йоахим Хесингер, дипл. физ.
Тест инженер
ift - център за акустична защита

LSW - Лаборатория за аудиометрична и топлоизмервателна техника

Изпълнителни директори:
Д-р Йохен Пайхл
Проф. Фриц Холц

"Лакерманвег" № 26
83071 Щефанкирхен,
Германия

Тел.: +49(0)8036/3006-0
Факс: +49 (0)8036/3006-33
www.lsw-gmbh.de

Седалище: 83026
Розенхайм, Германия
РС Траунщайн, Търг. рег. 14821
Щпаркасе Розенхайм
Kto 500 434 626
BLZ 711 500 00

Призната лаборатория за изпитване, инспектиране и сертифициране съгласно Строителен правилник: BAY 24
Акредитирана изпитвателна лаборатория от група I за проверка на годността и качеството съгласно DIN 4109

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

СТИАКомплект
Благоевград

130

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният **„ Бургас Плаза 44 " ЕООД – с управител Фидоси Ангелов и адрес** гр. Бургас , бул. „Христо Фотев" 44

декларирам на собствена отговорност, че продуктът АЛ врати с коефициент на топлопреминаване до Uf 2,2 W/m2*K произведени с профили на фирма ALUMIL, стъклопакети 24 мм /4 мм K + 4 мм безцветен флоат/ произведени със стъкла от Сен Гобен с коефициент на топлопреминаване Ug 1,4 W/m2*K, с обков ALUMIL произведен в Гърция и крепежни елементи , произведени от WÜRTH – Германия , закупени от Вюрт – България ЕООД .

(наименование на търговска марка, тип или модел, No на партидата, извадката /пробата/ или серията, евентуално произход и брой на екземплярите)

за който се отнася тази декларация, е в съответствие със следния (те) стандарт (и), техническо одобрение (ТО) или друг (и) нормативен (ни) акт (актове):

Ift ZERTIFIKAT – ROZENHEIM – ALUMIL
Характеристики на стъклопакети 24 мм /4 мм K + 4 мм безцветен флоат/ - Сен Гобен Глас; Ift - ZERTIFIKAT – ROZENHEIM ;TÜV ZERTIFIKAT Adolf WÜRTH GmbH &CO KG – ISO 9001:2008 – крепежни елементи Вюрт, ,

(наименование и/или No и дата на издаване на стандарта (тите), ТО или друг (ите) нормативен (и) акт (актове)

и в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти съществени изисквания за безопасност на други наредби за оценяване на съответствието.

Тази декларация за съответствие е валидна за жилищни сгради, намиращи се в гр. Благоевград , на който ще се монтира дограма от „Бургас Плаза 44" ЕООД , Бургас.
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгл. Чл. 313 НК

18.02.2016 г.
Гр.Бургас

Управител: / Ф. Ангелов /

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

131

Декларация за съответствие

Долуподписаният,

ЕТ „Димитър Христов 92- Бронит", ЕИК/БУЛСТАТ 811104531, със седалище на управление: гр. Благоевград ул. „Радовиш"6, представлявано от Димитър Костадинов Христов, в качеството му на собственик, телефон/факс: 073/887885 и моб. телефон 0898476552

Декларирам на собствена отговорност, че продуктът пожароустойчива врата с изходен № :....., монтирана на обект.....
.....

За които, се отнася тази декларация са произведени в условията на въведена и подържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие със следният стандарт БДС EN 1634-1 БДС EN 1363-1 отговаря на огнеустойчивост 120 минути и съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на Протокол № ИЦ-38-85/22.10.2010г. на МВР-ГДПБС –София.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от ИК.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА.
Управител:

СтилКомплекс
Благоевград

132

"БУЛГАРКОНТРОЛА" АД

СТОКОВ КОНТРОЛ И АВАРИЙНИ ОГЛЕДИ, ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ, ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР, СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Централен офис: 1000 София, ул. "Парчевич" №42
Тел.: 02/ 989 4070, Факс: 02/ 988 2354, Денонощен тел.: 0889 400 400
E-mail: sales@bulgarkontrola.bg, cert@bulgarkontrola.bg

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
14 - НСИСОССП- 1130

В съответствие с Част трета от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителни продукти (обн.в ДВ бр 106/2006 г.) е установено, че **строителният продукт**

ФАСОННИ ЧАСТИ И АКСЕСОАРИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН (PP-RC) *"Fluidterm"*

са предназначени за изграждане на сградни инсталации за топла и студена вода, с максимално работно налягане до 20 bar , с размери , асортимент и начин на свързване съгласно Приложение 1 към настоящия сертификат.

ПУСНАТ НА ПАЗАРА ОТ
PEŠTAN d.o.o.
34301 BUKOVIK – ARANJELOVAC, 1300 Kaplara 189 Сърбия

ПРОИЗВЕДЕН ВЪВ
PEŠTAN d.o.o.
34301 BUKOVIK – ARANJELOVAC, 1300 Kaplara 189 Сърбия

е произведен в условията на въведена от производителя система за производствен контрол и е подложен от производителя на текущо изпитване на пробни образци по предписан план за изпитване. Дирекция "Оценяване на съответствието" при Булгарконтрола АД е извършила първоначално изпитване на типа и първоначален контрол (одит) на производствения контрол и осъществява постоянен контрол (надзор), оценка и одобряване на производствения контрол.

Този сертификат удостоверява, че всички разпоредби по отношение на сертификацията на строителните продукти и изискванията на

БДС EN ISO 15874-3:2013

са приложени и изпълнени и че продуктът съответства на всички предписани изисквания.

Този сертификат **отменя Сертификат за съответствие No 14-НСИСОССП-023 от 05.03.2008 г.** и остава валиден, докато изискванията на техническата спецификация са изпълнени и условията на производството или производствения контрол не са изменени.

30.04.2013 г.
град София

Директор на дирекция "ОС": ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
/Т. Любенова/

БУЛГАРКОНТРОЛА АД – София с идентификационен номер 14 от регистъра на МРРБ
Разрешение №.РОССП-14/24.01.2008 г., издадено от МРРБ

Приложение № 1
Към сертификат за съответствие № 14 – НСИСОССП - 1130

Асортимент	Номинален размер d mm
Фасонни части за свързване чрез полифузионно заваряване:	
Коляно 90⁰	20 ÷ 63
Коляно 45⁰	20 ÷ 63
Тройник	20 ÷ 63
Муфа	16 ÷ 63
Редуктор дълго рамо	20 ÷ 63
Редуктор късо рамо	20 ÷ 63
Седлови присъединител	40 ÷ 63/ 20 ÷ 25
Коляно с вътрешна/външна резба	20
Кръстач	20 ÷ 25
Тристранно коляно 90 ⁰	20 ÷ 25
Капа	20 ÷ 63
Фасонни части с метална резба:	
Коляно 90⁰ с вътрешна резба	20 x1/2" ÷ 25/20 x1/2"
Коляно на 90⁰ с външна резба	20 x1/2"
Коляно на 90⁰ с вътрешна/външна резба	20 x1/2"
Коляно на 90⁰ с вътрешна резба и скоба за закрепване	20 x1/2"
Тройник намалител с вътрешна резба	20 x1/2" ÷ 25/20 x1/2"
Тойник намалител с външна резба	20 x1/2" ÷ 25/20 x1/2"
Муфа с външна резба	16x1/2" ÷ 63 x2" 20/25" ÷ 1/2" x3/4" 25/20 ÷ 1/2"
Муфа с вътрешна резба	16x1/2" ÷ 63 x2" 20/25" ÷ 3/4" 25/20 ÷ 1/2"
Аксесоари	
Скоба къса	20 ÷ 25
Скоба	20 ÷ 40
Скоба "Pestan"	20
Обходно коляно	20 ÷ 32
Монтажна връзка	19x1/2
Седлови присъединител с вътрешна резба	20x1/2 ÷ 25x3/4"
Универсален Адаптор с вътрешна резба	16
Адаптор с външна резба	20 ÷ 25
Адаптор с вътрешна резба	16

30.04.2013 г.
град София

Директор на дирекция "ОС":
/Г. Любенова/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛ

СтилКомплекс
Благоевград

"БУЛГАРКОНТРОЛА" АД

СТОКОВ КОНТРОЛ И АВАРИЙНИ ОГЛЕДИ, ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ, ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР, СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Централен офис: 1000 София, ул. "Парчевич" №42
Тел.: 02/ 989 4070, Факс: 02/ 988 2354, Денонощен тел.: 0889 400 400
E-mail: sales@bulgarkontrola.bg, cert@bulgarkontrola.bg

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
14 - НСИСОССП- 1129

В съответствие с Част трета от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителни продукти (обн.в ДВ бр 106/2006 г.) е установено, че **строителният продукт**

ТРЪБИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН (PP-RC)с търговска марка *"Fluidterm"*
са предназначени за изграждане на сградни инсталации за студена и топла вода в асортимент и технически характеристики съгласно Приложение No 1 към настоящия сертификат.

ПУСНАТ НА ПАЗАРА ОТ
PEŠTAN d.o.o.
34301 BUKOVIK – ARANJELOVAC, 1300 Kaplara 189 Serbia

ПРОИЗВЕДЕН ВЪВ
PEŠTAN d.o.o.
34301 BUKOVIK – ARANJELOVAC, 1300 Kaplara 189 Serbia

е произведен в условията на въведена от производителя система за производствен контрол и е подложен от производителя на текущо изпитване на пробни образци по предписан план за изпитване. Дирекция "Оценяване на съответствието" при Булгарконтрола АД е извършила първоначално изпитване на типа и първоначален контрол (одит) на производствения контрол и осъществява постоянен контрол (надзор), оценка и одобряване на производствения контрол.

Този сертификат удостоверява, че всички разпоредби по отношение на сертификацията на строителните продукти и изискванията на

БДС EN ISO 15874-2:2013
са приложени и изпълнени и че продуктът съответства на всички предписани изисквания.

Този сертификат **отменя Сертификат за съответствие No 14-НСИСОССП –794 от 07.04.2010 г.** и остава валиден, докато изискванията на техническата спецификация са изпълнени и условията на производството или производствения контрол не са изменени.

30.04.2013 г.
град София

Директор на дирекция "ОС":
/Г. Любенова/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

БУЛГАРКОНТРОЛА АД – София с идентификационен номер 14 от регистъра на МРРБ
Разрешение №.РОССП-14/24.01.2008 г., издадено от МРРБ

Приложение № 1
Към сертификат за съответствие № 14 – НСИСОССП - 1129

Асортимент	Работно налягане PN (bar)	Номинален размер D (mm)
Тръби от PP-R *"Fluidterm"*	10/16/20	16 ÷ 110
Тръби от PP-R *"Fluidterm"*	25	20 ÷ 63
Тръби от PPR-AL-PPR	20	20 ÷ 63

30.04.2013 г.
град София

Директор на дирекция "ОС"
Д. Любенова

Вярно с оригинала

ТОПЛОТЕХНИКА ЕООД
БЛАГОЕВГРАД
ИН № 1005553161

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Стилком ЕООД
Благоевград
136

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - НИСИ СОФИЯ
КОНТРОЛЕН ЦЕНТЪР ПО СТРОИТЕЛСТВО - КЦС
София 1618, бул."Никола Петков" № 36, тел.(02) 955 57 12, факс (02) 955 96 38, e-mail: nisi_sofia@abv.bg

Свидетелство рег. №1555

СЕРТИФИКАТ ЗА КОНТРОЛ
№ 0022/ 2008.07.18

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА КЛИЕНТА:
фирма "БУЛГАРКОМ ФАСАДНИ СИСТЕМИ" ООД , гр. София, ЖК „ЛЮЛИН-5", бл. 523 П, ап. 1, тел. /02/ 8139739, факс /02/ 8139730

2. Идентификация на контролирания обект:
Скеле фасадно от предварително изготвени градивни елементи, използвано в строителството за извършване на строително-монтажни работи

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (оценка на съответствието) от извършения контрол

3.1. Представеното за контрол , Скеле фасадно, съставено от предварително изготвени градивни елементи, КОНСТРУКЦИОННА СХЕМА „ MJ- КОНСТРУКЦИЯ UNI-70", изработено от фирма MJ-Конструкции ГмбХ, Цигелщрасе 68 58840 Плетенберг отговар на изискванията на БДС EN 12810 „Скеле фасадно от предварително изготвени градивни елементи"

3.2. Представеното за контрол Скеле фасадно, партида от 20 000 квадратни метра, съставено от предварително изготвени градивни елементи, КОНСТРУКЦИОННА СХЕМА „ MJ- КОНСТРУКЦИЯ UNI-70", изработено от фирма MJ-Конструкции ГмбХ, Цигелщрасе 68 58840 Плетенберг може да се използва в строително за извършване на строителн- монтажни работи с технически параметри дадени в Протокол от контрол на скелето № 0022-01-0022/2008.07.18, който е неразделна част на този сертификат а именно:височина на заскеляване до 50 метра; Максимално натоварване на един етаж от скелето не-повече от 200кг. за поле с дължина 3м.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Протокол № 0022-.01-0022/2008.07.18 год. „Ръководство за монтаж, демонта и техническа характеристика, общ вид, подготовка за работа и изисквания безопасна експлоатация на рамково фасадно скеле.", които е неразделна част с този сертификат;

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Дата: .2008.07.18

Директор КЦС: .....
/ст н.с д-р инж. Иван Хинков/

Благоевград

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - НИСИ СОФИЯ
КОНТРОЛЕН ЦЕНТЪР ПО СТРОИТЕЛСТВО - КЦС
София 1618, бул."Никола Петков" № 36, тел.(02) 955 57 12, факс (02) 955 96 38, e-mail: nisi_sofia@abv.bg

Сертификат: 1555

ПРОТОКОЛ ОТ КОНТРОЛ
№ 0022-01-0022/2008.07.18

ЛАБОРАТОРИЯ "ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО"

Наименование на продукта: ***СКЕЛЕ ФАСАДНО, ИЗГРАДЕНО ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗГОТВЕНИ ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИ, ИЗПОЛЗВАНО В СТРОИТЕЛСТВОТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ, КОНСТРУКЦИОННА СХЕМА „ MJ- КОНСТРУКЦИЯ UNI-70***

Производител: ***MJ-Конструкции ГмбХ, Цигелщрасе 68 58840 Плетенберг***

Възложител: ***"БУЛГАРКОМ ФАСАДНИ СИСТЕМИ" ООД , гр. София, ЖК „ЛЮЛИН-5", бл. 523 П, ап. 1, тел. /02/ 8139739, факс /02/ 8139730***

Методи за изпитване: ***БДС EN 12810-2:2003 "СКЕЛЕ ФАСАДНО, ИЗГРАДЕНО ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗГОТВЕНИ ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИ". СПОСОБИ ЗА ОРАЗМЕРЯВАНЕ И ДОКАЗВАНЕ НА НОСИМОСПОСОБНОСТТА***

Дата на постъпване на пробите в КЦС: 2008.06.24

Количество на пробите, подложени на контрол: Една изпитвателна конфигурация на скелето

Период на извършване на изпитването: от 2008.08.26 до 2008.07.18 год.

ДИРЕКТОР КЦС:

/ст н.с д-р инж. Хинков/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Резултатите се отнасят само за образците, подложени на контрол. Извлечения от протокола не могат да се размножават без писмено съгласие на Контролния център по строителство.

138

Декларация за характеристиките на строителен продукт

Баумит УниПраймер

Декларация за характеристиките на строителен продукт №:
ДХСП – 01-ЕлП-Баумит УниПраймер

1. **Уникален идентификационен код на типа на продукта:**
   Баумит УниПраймер – универсален грунд / Baumit UniPrimer

2. **Национални изисквания или техническа спецификация (европейски технически одобрения), приложими за строителния продукт:**
   ЕТО 12/0378, ЕТО 12/0023, ЕТО 09/0256, ЕТО 15/0431

3. **Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:**
   Готов за употреба, универсален грунд, изравнява попиващата способност на основата и служи като свързващ мост преди полагане на Баумит пастообразни мазилки, включени в системите Баумит Стар EPS, Баумит Про, Баумит Опън и Баумит Стар MB, за външно и вътрешно приложение.

4. **Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

5. **Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):**
   –

6. **Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):**
   Нотифициращ орган: TSUS (NB 1301 / TAB), Studená 3, 821 04 Bratislava, Slowakei
   Издадени документи: ETA-12/0378; ETA 12/0023; ETA 09/0256; ETA 15/0431
   на основание на: ETAG 004
   Извършена оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост **по система 2+ и издадени Протоколи:** 1139-CPD-0088/13; 1139-CPD-0858/12; 1139-CPD-0756/09; 1139-CPR-0727/15

Настоящият документ се издава на фирма Бодрост 96 ЕООД, в качеството ѝ на клиент, по договор за търговска продажба. Документът е валиден от 01.09.2015 г. и важи до промяната му от страна на Баумит България.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

139

7. Декларирани показатели за характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод на изпитване
Реакция на огън	клас B-s1-d0	EN 13501-1 (в система по ETAG 004)
Хигротермично поведение	издържал	в система по ETAG 004
Поведение при цикли на замръзване – размръзване	издържал	в система по ETAG 004
Адхезия към основата (СтарКонтакт, ПроКонтакт)	≥ 0,08 MPa	в система по ETAG 004
Дифузионно съпротивление	≤ 2,0 m	в система по ETAG 004
Плътност на дифузионния поток на водни пари V	> 600 g/m^2.h	EN 15824
Капилярно водопоглъщане	< 165 g/m^2 за 24 ч. < 0,05 kg/(m^2.$h^{0,5}$) за 24 ч.	ETAG 004
Температура на преработка	+30°C ≥ t ≥ +5°C	
Отделяна на опасни вещества	NPD	в система по ETAG 004

8. Характеристиките на строителния продукт, посочени в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните, съгласно т. 7.

Подпис за и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 01.09.2015 г.
(Място и дата на издаване)

.....
(Подпис)

Настоящият документ се издава на фирма Бодрост 96 ЕООД, в качеството ѝ на клиент по договор за търговска продажба. Документът е валиден от 01.09.2015 г. и важи до промяната му от страна на Баумит България.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Декларация за експлоатационни показатели

Баумит ПроКонтакт

Декларация за експлоатационни показатели №:
DoP-CPR – 01-ELP-ProContact

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
   Баумит ПроКонтакт / Baumit ProContact

2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
   Баумит ПроКонтакт / Baumit ProContact

3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации:**
   Лепилна и шпакловъчна смес за всички видове плоскости от експандиран полистирен (EPS), екструдиран полистирен (XPS), минерална вата и други топлоизолационни материали, използвани при топлоизолирането на фасади на сгради.

4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5:**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
   –

6. **Система/системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V:**
   Система 2+ (ETAG 004)

7. **В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:**
   Нотифициращ орган: TSUS (NB 1301 / TAB), Studená 3, 821 04 Bratislava, Slowakei
   Издаден документ: ETA-12/0023
   на основание на: ETAG 004
   Извършена оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост **по система 2+ и издаден Протокол:** 1139-CPD-0858/12

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Настоящият документ се предоставя на фирма Бодрост 96 ЕООД, в качеството й на клиент по договор за търговска продажба. Документът е валиден от 01.09.2015 г. до промяната му от страна на Баумит България.

8. Експлоатационни показатели:

Свойства	Показатели	Стандарт
Якост на сцепление:		ETAG 004
Шпакловка – топлоизолационен материал	≥ 0,08 MPa или разрушение в топлоизолационния материал	ETAG 004
Лепило – топлоизолационен материал	≥ 0,08 MPa в изходно състояние или разрушение в топлоизолационния материал ≥ 0,03 MPa след 48 часа потапяне във вода или разрушение в топлоизолационния материал ≥ 0,08 MPa след 48 часа потапяне във вода + 7 дни при 23°C / 50 % относителна влажност на въздуха или разрушение в топлоизолационния материал	ETAG 004
Лепило – основа (фасадна стена)	≥ 0,25 MPa в изходно състояние ≥ 0,08 MPa след 48 часа потапяне във вода + 2 часа при 23°C / 50 % относителна влажност на въздуха ≥ 0,25 MPa след 48 часа потапяне във вода + 7 дни при 23°C / 50 % относителна влажност на въздуха	ETAG 004
Якост на сцепление след стареене	≥ 0,08 MPa или разрушение в топлоизолационния материал	ETAG 004

9. Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.

Подпис за производителя и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 05.01.2015 г.
(Място и дата на издаване)

.....
(Подпис)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Настоящият документ се предоставя на фирма Бодрост 96 ЕООД, в качеството й на клиент по договор за търговска продажба. Документът е валиден от 01.09.2015 г. до промяната му от страна на Баумит България.

142

EJOT

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
Съгласно Анекс III от регулация на (ЕС) Nr. 305/2011 (регулация за строителни продукти)
Nr. 014/2015

1.) Уникален идентификационен код на продукта – име/тип.
EJOT TRIO 10 x L

2.) Пртиден, сериен номер или друг елеметн указващ индентифицирането на строителния продукт , както се изисква съгласно член 11 (4):
Типа е указан на опаковката.

3.) Предназначения и употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя:
Пластмасов Дюбел с Пластмасов пирон за закрепване на топлоизолационни системи в бетон и зидарии,
Категория на приложение: A,B,C,E
Дължини на дюбелите: от 100 мм до 220 мм.

4.) Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, както се изисква съгласно член 11 (5):
„ЕЙОТ България ЕООД и КО" КД , с. Мировяне 1289 , mail@ejot.bg, 02 /421 96 37

5.) Когато е приложимо, Име и адрес за контакт на упълномощения представител, чийто мандат включва задачите, посочени в член 12 (2),:
ЕЙОТ България ЕООД и КО КД, с. Мировяне 1289

6.) Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както е посочено в приложение V.:
Сиситема 2+

7.) В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт е обхванат от хармонизиран стандарт.:
ETAG 014 (EAD) , Протокол №431-2-16/16.06.2015г. – Изпитвателен Център по Строителство при НИСИ ЕООД

8.) В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт за който Европейско Техническо Одобрение/Оценка е била издадена:
Не е приложимо.

9.) Декларирани показатели:

Основни характеристики	Показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Усилия на опън в Бетон Characteristic tension resistance N_{Rk}	0,8 kN (анкериран в отвор Ф 11 мм)	ETAG 014
Усилия на опън в перфорирани керамични тухли Characteristic tension resistance N_{Rk}	0,5 kN (анкериран в отвор Ф10 мм)	ETAG 014
Усилия на опън в плътни керамични тухл Characteristic tension resistance N_{Rk}	0,7 kN (анкериран в отвор Ф 10 мм)	ETAG 014
Усилия на опън газобетон Characteristic tension resistance N_{Rk}	0,7 kN (анкериран в отвор Ф 10 мм)	ETAG 014

10.) Показателите на продукта, посочени в точка 1 и 2, са в съответствие с декларираните експлоатационни характеристики в точка 9. Настоящата декларация за изпълнение е издадена на пълната отговорност на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на Производителя:

Генадий Павлов Павлов - (Управител)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

01.07.2015

(Подпис)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Благоевград

БОДРОСТ-95

СтилКомплект Благоевград

143

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

МАРИСАН
БИЖУТЕРИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

Долуподписаният, Управител на:

МАРИСАН и КОЛЕВ ООД
Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калнъ дере № 15

Декларирам на собствена отговорност, че продуктът

ХИДРОЗОЛ® BG-OR БИТУМЕН ГРУНД НА ОРГАНИЧНА ОСНОВА

за изключително здрава връзка между основата и полагани битумни хидроизолации и покрития, прониква дълбоко в порести повърхнини като ги уплътнява и заздравява

за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие с

ТС 015 - 2012

Съответствието е оценено съгласно Директива 89/106/ЕЕС за строителни продукти и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на Анализно свидетелство, издавано за всяка производствена партида.

Тази декларация се издава за:
ХИДРОЗОЛ® BG-OR БИТУМЕН ГРУНД НА ОРГАНИЧНА ОСНОВА
към Протокол №

Техническата документация и указанията за употреба на продукта се намират у производителя. Специфичните изисквания, свързани с употребата на продукта, както и указанията за полагане и изпълнение, се намират върху опаковката на продукта.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 НК.

Русе
08.04.2014 г.

Управител:.....
/Ст. Колев/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

гр. Русе 7009, Източна промишлена зона, ул. "Калнъ дере" 15,
тел.: 082 519 721,519 722, факс: 082 845 344
www.marisanbg.com

TILCOM

trade, investment, loyalty

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
КЪМ ЧЛ.25, АЛ.2

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Борис Петров в качеството си на Търговски Директор на фирма "ТИЛКОМ"ООД гр.София жк.Толстой бл.50, Дан.№2224100275, Булстат Ю 121871118 декларирам на собствена отговорност, че кабели тип СВТ 0.6/1 kV производство на „ЕМКА"АД гр.Севлиево, „КЕМП"АД гр.Севлиево, „ЕЛКАБЕЛ"АД гр.Бургас

/наименование и търговска марка, тип и модел, № на партида, извадката(пробата) или серията, евентуално произход и брой на екземплярите/

за който се отнася тази декларация е в съответствие със следният(те) стандарт(и), техническо подобрение(ТО) или друг(и) нормативен(и) акт(актове)

е изработен и напълно покрива изискванията на БДС 16291-85

/наименование и/или номер и дата на издаване на стандарта(тите), ТО или друг(ите) нормативен(ни) акт(актове)/

и в съответствие с Наредбата за съществени изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти съществени изисквания за безопасност на други наредби за оценяване на съответствието.

.....,

/номер и дата на издадени сертификати,технически одобрения и протоколи от изпитване(в случай че има такива)/

.....,

/ специфични изисквания, свързани с употребата на продукта(указания за проектиране, изпълнение и експлоатация) – може да се приложат отделно от декларацията/

.....,

/година на поставяне на маркировката "CO"/

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

01.11.2006г.
гр.София

Борис Петров:
/Търговски Директор/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

baumit.com

Декларация за експлоатационни показатели
Баумит БетоФил

Декларация за експлоатационни показатели №:
DoP-CPR – 01-BAB-BetoFill

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
Баумит БетоФил / Baumit BetoFill

2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
Баумит БетоФил / Baumit BetoFill

3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации**
Разтвор на циментова основа (PCC), за ремонт и възстановяване на носещи бетонови елементи на сгради и строителни съоръжения, с влияние върху статичните им характеристики.

4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5**
Baumit Beteiligungen GmbH
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
Österreich
/
Баумит Бетайлигунген ГмбХ
Вопфинг 156
А-2754 Валдег
Австрия

5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
Баумит България ЕООД
ул. България № 38
2100 Елин Пелин

6. **Система/системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V**
Система 2+
Система 3 – относно Реакция на огън

7. **В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:**
Служба при Управата на Община Виена, с адрес: Rinnböckstraße 15, 1110 Wien, Австрия, **NB 1139**, е извършила начална инспекция на завода и на собствения производствен контрол, както и текущ надзор, контрол и одобрение на собствения производствен контрол, в съответствие с EN 1504-3, **по система 2+** и е издала: **CE-2012-0303 / 1139-CPD-0145/07**.
Отдел МА 39 при Магистрат (общински съвет) на град Виена (**NB 1139**) е извършил стандартно изпитване, относно реакцията на огън, в съответствие с EN 13501-1, **по система 3** и е издал: Доклад за класификация **VFA 2013-0787.01**.

ОБРАЗЕЦ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Настоящият документ се предоставя на фирма "Бодрост 96" ЕООД, в качеството ѝ на клиент по договор за търговска продажба. Документът е валиден от 05.01.2015 г. до промяната му от страна на Баумит България.

ДЕП

Стилкомплекс Благоевград 116

8. Експлоатационни показатели

Свойства	Показатели	Стандарт
Клас	R3 XF4	EN 1504-3:2006
Якост на натиск	≥ 45,0 MPa	
Съдържание на хлориди	≤ 0,05 %	
Адхезия към основата	≥ 1,5 MPa	
Възпрепятствано свъсъхване/набъбване	NPD	
Устойчивост на карбонизация	издържал	
Модул на еластичност	≥ 20 GPa	
Съвместимост при температурни промени (разширение/свиване), част 1	≥ 1,5 MPa	
Сцепление с армировката	NPD	
Коефициент на температурно разширение	NPD	
Капилярно водопоглъщане	≤ 0,5 $kg.m^{-2}.h^{-0,5}$	
Реакция на огън	клас A1 (EN 13501-1)	
Отделяне на опасни вещества	В съответствие с т. 5.4	

9. Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.

Подпис за производителя и от името на производителя:

Алфред Гзандтнер, Директор

.....
(Подпис)

Вопфинг, 07.01.2014
(Място и дата на издаване)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Настоящият документ се предоставя на фирма "Бодрост 96" ЕООД, в качеството й на клиент по договор за търговска продажба. Документът е валиден от 05.01.2015 г. до промяната му от страна на Баумит България.

ДЕП

Баумит БетоФил

съст. 01/2014

Стил Комплекс
Благоевград

147

chemical products
insulation solutions

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

№ CP – EN 14304 - 01/2012

Долуподписаният: **„Химически продукти" ООД**
Адрес и седалище **гр. Ямбол 8600, ул. „Сокол" 7-Б**
Лице за контакт: **Иван Иванов**

Декларирам на своя отговорност, че продуктът

Марка: **IZOLFLEX („ИЗОЛФЛЕКС")**
Вид: **Листова топлоизолация от еластомерна пяна**
Производител: **„Химически продукти" ООД**

за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол, съгл. BDS EN ISO 9001:2008 и е в съответствие със следния стандарт: **„Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации. Продукти от гъвкава еластомерна пяна (FEF), произведени в заводски условия. Изисквания"**

BDS EN 14304 : 2009

и съответствието е оценено съгласно изискванията на Европейската директива за строителните продукти 89/106/ЕЕС и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г. Декларацията се издава въз основа на: протокол от първоначално изпитване на типа на продукта № ПИТ-ЕС-302-2/20.04.2012 г. Протокол от изпитване № 248/20.04.2012, Протокол за клас на горимост № 230005701-3/25.10.2006 издадени от: "Научно-изследователски институт по строителни материали" ЕООД, разрешение № CPD 05-NB 1950/17.09.2007 г., и Materialprufungsamt Nordhein-Westfalen.
Маркировката "CE" е поставена за първи път на продукта на 03.09.2012

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Гр. Ямбол

Управител
/Иван Иванов/

198

chemical products
insulation solutions

АНЕКС КЪМ ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

№ CP – EN 14304 - 01/2012

Строителен продукт: ИЗОЛФЛЕКС – Тръбна изолация от еластомерна пяна съгласно BDS EN 14304:2009

Производство на: „ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ" ООД,
ул. „Сокол" 7 –Б, Ябилково 8600
България

Продукт	Дебелини	Обозначителен код за CE маркировка	Декларирана топлопроводимост λ W/m.K	Коефициент на паронепроницаемост μ	Горимост	Приложение
ИЗОЛФЛЕКС	19 мм	REF - EN 14304 - ST (+105)- WS01 - MU 8000	λ_{10} = 0,037	7300 ÷ 8800	B_L-s3, d0	Топло изолация на външни и вътрешни тръби
ИЗОЛФЛЕКС	25 мм	REF - EN 14304 - ST (+105)- WS01 - MU 8000	λ_{10} = 0,0345	6500 ÷ 8100	B_L-s3, d0	Топло изолация на външни и вътрешни тръби

инж. Иван Иванов
Управител, „Химически продукти" ООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Благоевград

149

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №19

ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка

Долуподписаният Иван Миладинов Достумски , с лична карта № 645149912, издадена на 19.05.2014 г. от МВР – гр. Благоевград , с ЕГН 6208310187, в качеството ми на Управител ,
(посочете длъжността)

На „СТИЛ КОМПЛЕКС" ООД
(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № 48. Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. В, вх. Г и вх. Д, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Яне Сандански"

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Напълно съм запознат с всички условия, обстоятелства необходими за изпълнение на обекта на горепосочената обществена поръчка, които биха повлияли при изготвянето на техническото и ценовото ми предложение.
2. Извършил съм посещение и оглед на обекта за изпълнение на ремонтно строително-монтажните работи, предмет на горепосочената обществена поръчка и съм запознат с всички условия и особености на строителната площадка.
3. Незапознаването с мястото и условията за изпълнение на поръчката е за наш риск при оценяването от комисията на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка.

05.08.2016 **г.** **Декларатор:** .....

(дата на подписване) ***/подпис, печат/***

150

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 20

ДЕКЛАРАЦИЯ

за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Долуподписаният /ната/ Иван Миладинов Достумски, с лична карта № 645149912, издадена на 19.05.2014 г. от МВР – гр. Благоевград , с ЕГН 6208310187, в качеството ми на Управител ,

(посочете длъжността)

На „СТИЛ КОМПЛЕКС" ООД

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция № 48. Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. В, вх. Г и вх. Д, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Яне Сандански"

ДЕКЛАРИРАМ:

Към момента на подаване на офертата нямам други сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, с Възложителя.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

05.08.2016 **г.**

Декларатор: .....
/подпис, печат/

ПОЛИЦА № 1319160320000021□□□□□□□□□□□□□□□
ЗА ЗАСТРАХОВКА

GENERALI

„ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"
Дата на сключване: 26._01 _.20_16 _ г.

Застрахован: _ _ _СТИЛ КОМПЛЕКС ООД _ _ _,ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН: _101618538 _ _ _ _ _ _ _ _ _
Адрес на управление: _ БЛАГОЕВГРАД ДАМЕ ГРУЕВ 21
Телефон: _073881026 _ _ _ _ _ _ _ _, e-mail:
Представител: ИВАН ДОСТУМСКИ

Застраховащ: _,ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН:
Телефон: _ _ _ _ _ _ _ _ _, e-mail: ,
Представител:

Застраховател: **"Дженерали Застраховане" АД**, ЕИК 030269049,
Адрес: гр. София 1504, бул."Дондуков" № 68, тел.: 02 / 9267 111, факс: 02/ 9267 112,
e-mail: information.bg@generali.com, website: www.generali.bg
Представителство на застрахователя: БЛАГОЕВГРАД_ _ _ _ _ _ _ _ _

законодателство: _ _ Българското законодателство _ _

Застрахователна премия: 600,00BGN, (словом: ШЕСТОТИН ЛВ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _),
Данък 2% по ЗДЗП: _12,00 _ _ _BGN,
Общо дължима сума: 612,00_ _ _ _ _ _BGN, (словом: ШЕСТОТИН И ДВАНАДЕСЕТ ЛВ_)
При разсрочено плащане /дата на падеж и вноски/:

№	Дата на вноските	Размер на вноска	Данък 2%	Общо дължима сума
1.	26.01 .2016 _ г.	153.00BGN	3.00 _BGN	153.00 _ _BGN
2.	_ 27.04.2016. .2016_ г.	153.00BGN	3.00 __BGN	53.00 ___BGN
3.	27.07 .2016 _ г.	153,00BGN	3,00 BGN	153,00 _BGN
4.	27.10.20_16 _ г.	153,00BGN	3,00 BGN	153,00 ___BGN

Съгласно чл. 202, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за застраховането при неплащане на която и да е разсрочена вноска, полицата ще бъде прекратена, считано от 00:00 часа на 16-ия ден след датата на падежа.

С подписа си върху тази полица Застрахованият:

1. Декларира, че му е предоставена информацията, предназначена за потребителя на застрахователната услуга, предписана от Кодекса за застраховането.
2. Декларира, че при промяна на декларираните при сключването на полицата обстоятелства и данни, е длъжен незабавно да уведоми за това "Дженерали Застраховане" АД.
3. Декларира, че е получил, запознат е и е съгласен с Общите условия по застраховката.
4. Дава съгласието си "Дженерали Застраховане" АД да обработва личните данни, както и данните на лицата, обявени в полицата, за нуждите и целите на тази застраховка и свързаните с нея дейности, съгласно Закона за защита на личните данни.

Настоящата полица се издава в два еднакви екземпляра - по един за Застрахования и един за Застрахователя.

Проверил идентификацията на клиента по смисъла на ЗМИП,

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ДЕКЛАРАЦИЯ

за подновяване на „Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството" по чл.171 от ЗУТ

Долуподписаният Иван Миладинов Достумски, притежаващ лична карта № 645149912, издадена на 19.05.2014 г. от МВР – гр. Благоевград на Длъжност Управител на „Стилкомплекс" ООД с ЕИК 101618538

Д Е К Л А Р И Р А М,

В случай, че „Застраховката за професионална отговорност на участниците в строителството" по чл.171 от ЗУТ" или еквивалентна изтече по време на действие на договора за строителство, то действието й ще бъде подновено със срок не по – малък от срока на строителството и договора и 30 (тридесет) дни след изтичането му.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:06.08.2016 г.

Декларатор: .....

Q-CERT

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ/CERTIFICATE

QMSCERT, като действа в съответствие с изискванията на ISO 17021 за органите извършващи одит, удостоверяват, че:

СТИЛ КОМПЛЕКС ООД

Ул. Даме Груев 21
Благоевград
България

с обхват:

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ, ГРАЖДАНСКИ И ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ; СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ

е създала и прилага Система за управление на качеството, която е в съответствие с изискванията на международния стандарт

EN ISO 9001:2008

16 Септември 2018	**17 Септември 2015**
Валидност на сертификата	**Първоначална сертифициране дата**
17 Септември 2015	
Сертификатът е издаден на	**IAF/EA Подсектор: 28**
	За QMSCERT съвета

Тази сертификация е предмет на ежегодни надзорни одити. Сертификацията е валидна (за три години), при положение, че е последвана от одобрение чрез годишния надзорни одити.
За информация, касаеща валидността на сертификатите, можете да посетите www.qmscert.com

Q CERT
Inspection - Certification

IAF

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

QMSCERT® N₀ 170915-1

MS Certification
Cert. No.

СтилКомплекс ООД Благоевград

152

Q-CERT

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ/CERTIFICATE

QMSCERT, като действа в съответствие с изискванията на ISO 17021 за органите извършващи одит, удостоверяват, че:

СТИЛ КОМПЛЕКС ООД

Ул. Даме Груев 21
Благоевград
България

с обхват:

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ, ГРАЖДАНСКИ И ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ; СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ

е създала и прилага Система за управление на околната среда, която е в съответствие с изискванията на международния стандарт

EN ISO 14001:2004

16 Септември 2018	**17 Септември 2015**
Валидност на сертификата	**Първоначална сертифициране дата**
17 Септември 2015	**За QMSCERT съвета**
Сертификатът е издаден на	**NACE Код: 41, 42, 43**

Тази сертификация е предмет на ежегодни надзорни одити. Сертификацията е валидна (за три години), при положение, че е последвана от одобрение чрез годишни надзорни одити.
За информация, касаеща валидността на сертификатите, можете да посетите www.qmscert.com

Q-CERT
Inspection - Certification

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

IAF ESYD

Стил Комплекс ООД
гр. Благоевград

QMSCERT® N. 170915-2

156

Образец №11

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция № 48. Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. В, вх. Г и вх. Д, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Яне Сандански"

„СТИЛ КОМПЛЕКС" ООД

Наименование на участника

Иван Миладинов Достумски

(Трите имена на лицето, представляващо участника юридическо лице)

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:	
Седалище и адрес на управление: • Страна, код, град, община • Квартал, ул., №, • Телефон, факс, • E-mail:	РБългария, 2700, Благоевград, Благоевград ул. „Даме Груев" № 21 073/887740, 073/881026 office@stilkompleks.com

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като подробно се запознахме с условията на документацията за участие в обществената поръчка с предмет:**„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № 48. Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. В, вх. Г и вх. Д, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Яне Сандански"

Предлагаме:

гаранционен срок за СМР- 10,05 години

1	2	3	4	5	6	7
№ по ред	Вид СМР по отделните части	% от обема СМР /%/	Минимален гаранц. срок по Наредба 2	Предложен от участника гаранц.	Общ гаранц. срок	Среден гаранц. срок

КОНФИДЕНЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Подпис и печат:.....

/Иван Достумски/

„Стил Комплекс" ООД Благоевград

			/години/	срок /години/		
1.	Конструкции	0,9%	8.00	8.00	16.00	0,14
2.	Хидроизолации	6,2%	5.00	5.00	10.00	0,62
3.	Топлоизолации	59,5%	5.00	5.00	10.00	5,95
4.	Довършителни работи	28,9%	5.00	5.00	10.00	2,89
5.	Ел. инсталации	4,5%	5.00	5.00	10.00	0,45
6.						10.05

Където:

- в колона 3 се записва тежестта на всяка от отделните части спрямо общата стойност на обекта в %
- в колона 6 се сумират колона 5 и колона 4
- в колона 7 се умножават колона 6 и колона 3
- общият среден гаранционен срок се получава като сума от средните гаранционни срокове по отделните части.

- стойностите в колона 6 следва да бъдат цяло число

- посоченото в колона 7 следва да бъде по-малко число от колона 6

Максималният гаранционен срок е сбор от срока, посочен в колона 4 – минимален гаранционен срок по Наредба №2 и колона 5 – „Предложен от участника гаранционен срок". Този сбор е равен до 2 /два/ пъти минималните гаранционни срокове. Максималният гаранционен срок е равен на общ гаранционен срок за съответната позиция.

Указание: *Участниците трябва да предложат гаранционни срокове за изпълнените строителни работи, които не могат да бъдат по-малки от предвидените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоражнения и строителни обекти.*

Забележка: *Участниците могат да предложат гаранционни срокове по – дълги от предвидените в горепосочената наредба, които да бъдат не повече от 2 /два/ пъти минималният гаранционен срок,предвиден в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г.*

**В случай, че се констатира предложен под установения минимум или над максимум предложен срок по тези показатели, офертата на участника се предлага за отстраняване.*

Срок за изпълнение на строителството:30 /тридесет календарни дни/

Указание: *Срокът за изпълнение на строителството не следва да бъде по – малък от 30 календарни дни и не по – дълъг от 45 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число!*

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за строителство извън горепосочените такива.

Срок за проектиране 15 / петнадесет календарни дни/

КОНФИДЕНЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Подпис и печат:.....
/Иван Достумски/

/Срок за проектиране не се попълва, когато участникът подава оферта за обособена позиция № 71, обособена позиция №72 и обособена позиция №73. За същите има изготвени работни проекти неразделна част от настоящата документация/

Забележка: *Срокът за изготвяне на работен проект да бъде от 15 /петнадесет / до не повече от 20 /двадесет/ календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число!*

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за проектиране /изготвяне на работен проект/ извън горепосочените срокове.

Прилагам:

Подробен работна програма, линеен график и диаграма на работната ръка, изготвени съобразно изискванията от документацията за участие.

Забележка: Във всяка от таблиците, в които участникът сам прави изброяването, той може да добавя толкова редове, колкото са му необходими.

ВАЖНО!!! Всяка страница от техническата оферта трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

ДАТА: 05.08.2016 г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:

ЗАБЕЛЕЖКА:*:Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик - ПЛИК №2 за всяка обособена позиция по отделно!*

Участник, който представи програма, която не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата.

КОНФИДЕНЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Подпис и печат:.....

/Иван Достумски/

СТРОИТЕЛНА ПРОГРАМА

ЗА

ОРГАНИЗАЦИЯТА, ТЕХНОЛОГИЯТА И МЕТОДОЛОГИЯТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: **Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. В, вх. Г и вх. Д, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Яне Сандански"**

1.ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1.1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Разглежданата жилищна сграда е пусната в експлоатация през 1983г. и има 62 апартамента.

Сградата е разделена на три секции с три входа. Разликата между абсолютните коти на входовете няма.

Жилищната сграда е монолитна стоманобетонна конструкция с вертикални и хоризонтални носещи елементи.Секциите са разделени посредством дилатационна фуга от 1 см.Носещата конструкция е проектирана и оразмеренана на сеизмични въздействия от девета степен съгласно нормативните документи. Ограждащите елементи са сандвич панели с 4 см. пенополистирен във вътрешността. Голяма част от сградата е санирана и са сменени дограмите, общите части са сравнително поддържани но ограждащите им елементи са за подмяна и саниране. Дограмата на сградата при въвеждането и в експлоатация е била дървена, като при експлоатацията на сградата отделни собственици са направили подобрения и са подменили за своя сметка дограмата с PVC или такава с метални профили. Налице е усвояване на терасите с цел разширяване на помещенията. Парапетите на балконите са тънкослойни панели с растерна метална решетка.Съществуващата мазилка е вароциментова, на места растерна декоративна , като в зоната на цокъла е мита мозайка.

Покривът е изолиран с битумна хидроизолация, но без посипка. Улуците и водосточните тръби са от поцинкована ламарина и са вътрешно отводнени.

Основната цел на настоящия проект е да се подобрят качествата на сградата по отношение на енергийната и ефективност. Задължителните дейности, които са предвидени в този проект са:

Дейности по конструктивно възстановяване / усилване/ основен ремонт:

* Дейности по конструктивно възстановяване ;

- да се възстанови металната рамка и хоризонталната геометрията на парапетните панели на терасите по източната фасада на **бл.№3.вх.В, ап.9**;

-полагане на антикорозионно покритие върху видимите връзки на балконски парапети

КОНФИДЕНЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Подпис и печат.....

/Иван Петрунски/

и пана и връзките между рамките и корнизните панели в подпокривното пространство;

-основен ремонт на покривната хидроизолация и подмяна на ламарините по бордовете на корнизните панели и на машинните помещения на асансьорите;

- да се извърши ремонт с отстраняване на ръжда от видима армировка на панелите на жилищната сграда – **бл.№3 - вх.В; вх.Г и вх.Д**, чрез полагне на защитен грунд и на двукомпонентен възстановителен разтвор;

- обработка на фугите между фасадните панели където това е необходимо;

- доизграждане парапетите на терасите до нормативната височина 1,05м;

- обработка на видимата армировка от долната страна на подовите панели на I-ва плоча полагане на защитен грунд и полагане на двукомпонентен възстановителен разтвор преди полагане на топлоизилацията;

- измазване на комините на покрива и изпълнение на шапки на коминните тела на покривите на жилищната сграда – **бл.№3 - вх.В; вх.Г и вх.Д** където те са повредени;

- затваряне с предпазна мрежа на вентилационните отвори на подпокривното пространство по корнизните панели;

Обновяване на общите части на входовете:

- ремонтиране на хидроизолация, изпълнение на ново отводняване и ремонт на бучарда по борда на козирките на входовете на жилищната сграда – **бл.№3 - вх.В; вх.Г и вх.Д**;

- ремонт на стъпала от монолитна мозайка към сутерена на жилищната сграда – **бл.№3 - вх.В; вх.Г и вх.Д**;

- изкърпване, подмяна и почистване на дефектирали участъци от вътрешната мазилка в общите части на сутеренте на жилищната сграда – **бл.№3 - вх.В; вх.Г и вх.Д** и подходите към машинните помещения за покривите на блока;

- освежаване чрез боядисване на стълбищните клетки на жилищната сграда – **бл.№3 - вх.В; вх.Г и вх.Д**;

- изолиране с подходящ материал на откритата водопроводна инсталация в сградата;

Изпълнение на мерки за енергийна ефективност:

- подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.) където не е сменена дървената дограма;

КОНФИДЕНЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Подпис и печат.....

/Иван Достумски/

СпиКомплекс Благоевград

- топлинно изолиране на външните ограждащи елементи за жилищата (външни стени, покриви и подове).

- изпълнение на енергоспестяващо осветление и автоматизирано управление в общите части на жилищната сграда – **бл.№3 - вх.В; вх.Г и вх.Д**.

Подмяна на електроинсталациите:

- цялостна подмяна в жилищната сграда – **бл.№3 - вх.В; вх.Г и вх.Д** на заземителната и мълниезащитната инсталация.

1.2.Организация на работата

Предлагаме да изпълним СМР, предмет на обществената поръчка за **30 календарни дни**, съгласно приложения линеен календарен график. Началото на работите ще започне с датата на подписване на **Протокол обр.2** за откриване на строителната площадка.

В хода на работата и при необходимост имаме готовност за работа на удължен работен ден или при работа на сумирано работно време – събота и неделя, ако се наложи, за да може да спазим графика за изпълнение на възложените СМР в договора.

Продължителността на работите по всеки отделен етап е съобразена с трудоемкостта и обема на работите, отчетена е спецификата на дейностите и възможността за неблагоприятни атмосферни условия. Фирмата има достатъчно опит с подобни дейности и разполага с голям ресурс от работна ръка и техническа обезпеченост да контролира и спазва изпълнението на графика.

1.2.1.Етапи на изпълнение:

Изпълнението на работите разделяме условно на етапи, без това да влияе на плащания, смени на персонал, доставки и други подобни мероприятия.

Разделянето на тези етапи е до известна степен условно, защото ще има технологични застъпвания и прекъсвания.

I–ви етап „Подготвителни дейности“

* Изграждат се временни обезопасителни ограждения, ограждащи работната площадка, поставят се временни обекти / товарни платформи, скелета, противопожарни табла, фургони, информационни табели, знаци по безопасност и противопожарна охрана и пр./, прави се разстановка на основните елементи по изпълнението на СМР.

КОНФИДЕНЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Подпис и печат:.....
/Иван Достумски/

*Снабдяването с вода и електрическа енергия ще става от съществуващите източници в сградата след предварително съгласуване с Възложителя и живущите в нея.

*На подходящо място ще се доставят контейнери за разделно събиране на отпадъци, които редовно ще се подменят от фирмата за събиране на отпадъци, с която имаме договор.

*Строителните работи ще се изпълняват поетапно – по блокове, входове , етажи и помещения, след подаден фронт за работа от Възложителя и собствениците на апартаментите.

*Преди непосредственото стартиране на изпълнението на СМР, плана за организация ще подлежи евентуално на актуализиране и съгласуване с Възложителя.

*Достъпът до строителната площадка ще се осъществява основно от изградените за достъп, с временни обезопасителни ограждения, пътеки на преминаване. Чрез него ще се осъществява доставката на материалите и извозването на отпадъците.

*Не се налага промяна на съществуващата организация на движение в района през времето на строителството.

*На обекта ще изградим временен битов район, където ще монтираме фургони,/ местата на които предварително ще бъдат съгласувани с Възложителя и собствениците на апартаментите /.Същите , ще се използват за:

-преобличане, съхраняване и изсушаване на личното и работно облекло;

-хранене;

-кратък отдих;

-фургон за ИТР, собствени служители, в който ще има оборудвана аптечка за медицинско обслужване в случай на нужда;

-фургон за Координатор по безопасност и здраве оборудван като кабинет по БЗУТ;

- складове за материали и оборудване;

ИНЖЕНЕРНО – ТЕХНИЧЕСКИ СЪСТАВ И РАБОТНА СИЛА ЗА ЕТАПА:

Ръководен състав:

-Технически ръководител – 1 бр

-Координатор по безопасност и здраве – 1 бр

-Отговорник по контрол на качеството – 1 бр

Изпълнителски състав:

-Общи работници – 6 броя

Времетраенето на този етап ще бъде два календарни дни.

II-ри етап – Дейности по конструктивно възстановяване / усилване/ основен ремонт.

КОНФИДЕНЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Подпис и печат:.....
/Иван Достумски/

Работите по този етап ще започнат веднага след Подготвителния етап.Работите от вътре ще се изпълняват апартамент по апартамент в зависимост от подаването на фронт за работа от обитателите.

Трима работника ще изпълняват обработването на фугите и пукнатините по стълбищата за 3 дни.

След монтажа на фасадно скеле, ще се изпълни възстановяване целостта на балконските пана на трите входа.

Предвиждаме, изпълнението на затваряне на фугите и обработване на пукнатините в зоните на снаждане на таванските панели над стълбищните клетки, както и ремонта на челото на покривния панел да бъдат извършени последователно, като работите ще започнат на петнадесетия ден.

Полагането на антикорозионно покритие върху видимите заваръчни шевове за балконските пана ще се изпълнява преди полагането на топлоизолацията. Работите ще се изпълняват от двама работника в продължение на осемнадесет дни.

Двама работника ще ремонтират челата на покривните панели над Входовете след монтажа на скелето.

Инженерно-технически състав и работна сила за етапа:

Ръководен състав:

-Технически ръководител – 1 бр

-Специалист по здравословни и безоп. условия на труд – 1 бр

-Отговорник Контрол по качеството – 1 бр.

Изпълнителски състав:

Мазачи – 7 броя

Времетраенето на този етап ще бъде 11 календарни дни.

III – ти етап – Дейности по Обновяване на общите части на блока

Работите по този етап също ще започнат след Подготвителния етап.

Предвиждаме екип №1 от работници, след подготвителния етап, да започне работите вътре по стълбищните клетки на блока. Едновременно блок по блок и етаж по етаж ще се изпълнят изкърпване на дефектирали участъци, шпакловка и боядисване с латекс по стени и тавани. Блажна боя по цоклите,металните капаци на машинните помещения и стълбите към покрива.От готовите етажи ще започне и обновяването на металните парапетите и дървените ръкохватки.

Друг екип №2 от работници, ще изпълнява работите по обновяване и ремонт на козирките на входовете. Работите ще се изпълняват ,след като съответната фасада на даден блок е топлоизолирана и скелето по нея е демонтирано. За 4 дни ще се изпълнят демонтажните работи и новото хидроизолиране на козирките. Дъната и бордовете на

Подпис и печат:.....

/Иван Дюстумски/

СтройКомплекс ООД Благоевград

КОНФИДЕНЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

8

същите , ще бъдат измазани и шпакловани. Ще се монтират водосточните тръби за отводняване на козирките.

Независимо от работи по-горе трима работници за 5 дни ще ремонтират стъпалата от мозайка към сутерена на всички входове.

Подмяната на водосточните тръби, отводняващи покривите над асансьорните шахти ще се изпълни по време на подмяната на хидроизолацията на покривите.

Инженерно – технически състав и работна сила за етапа:

Ръководен състав:

-Технически ръководител – 1 бр

-Специалист по здравословни и безоп. условия на труд -1 бр

-Отговорник Контрол по качеството – 1 бр.

Изпълнителски състав:

Екип №2 за изпълнение на работите по козирките:

-Общи работници – 2 броя

-Мазачи – 3 броя

-Тенекеджии – 3 броя

-Хидроизолаторджия – 2 броя

-Настилкаджия – 2 броя

Екип №1 за обновяване на стълбищните клетки:

-Мазачи – 3 броя

-Бояджии – 7 броя

Независимо от двата екипа, в този етап ще работят още:

-Настилкаджии – 2 броя

-Тенекеджия – 2 броя

-Работник Топлоизолации – 2 броя

Времетраенето на този етап ще бъде 28 календарни дни.

IV - ти етап – Електроинсталации

Мълниезащитна и заземителна инсталация

Работите по мълниезащитната инсталация ще се изпълняват вход по вход и участък по участък, след като е положена новата хидроизолация.

Отводите ще се изпълняват заедно с топлоизолацията по фасадите и ще бъдат скрити под нея. Ел работника ще използва вече монтираното скеле за топлоизолацията.

След демонтажа на скелето 3–ма Ел работника ще изпълнят заземленията за мълниезащита и за ГЕТ.

Ден след това ще започнат лабораторните им изпитвания.

Подпис и печат:.....
/Иван Дост

Мерки за енергийна ефективност на стълбищното осветление.

Независимо от работите по-горе двама ел.работници ще подменят осветителните тела в стълбищните клетки на входовете, етаж по етаж. Единият ще демонтира старите плафони, тавана се шпаклова и боядисва, след което другият ел.работник монтира новото тяло с вграден датчик и енергоспестяваща крушка.

Инженерно – технически състав и работна сила за етапа:

Ръководен състав:

-Технически ръководител – 1 бр

-Специалист по здравословни и безоп. условия на труд – 1 бр

-Отговорник Контрол по качеството – 1 бр

Изпълнителски състав:

-Ел.работници – 3броя.

V-ти етап – Топлоизолиране на външните стени на сградата

Работите по този етап също ще започнат веднага след Подготвителния етап.

Поетапно, последователно ще се изпълняват монтажа на скелето, изкърпване на мазилката, грундиране, залепване на топлоизолационните плочи, дюбелирането им, армираната шпакловка, полагането на силикатна мазилка.

Външните тела на климатиците и сателитните чинии ще се демонтират преди топлоизолирането на съответния участък и ще се монтират веднага след това, за да не остават обитателите на апартаментите повече от ден без климатизация и/или телевизия.

Обръщането около прозорците ще се изпълнява заедно с топлоизолирането на фасадите.

Работите по цокъла на блока ще се изпълняват след като се демонтира скелето.

Обшивката от ламарина по бордовете ще се демонтира в началото на етапа, а монтажа на новата ще започне заедно с монтажа на новата хидроизолация на покрива.

Монтажа на скелето и топлоизолирането ще започнат от входните фасади, за да се даде фронт за работа по козирките на входовете.

Инженерно – технически състав и работна сила за етапа:

Ръководен състав:

-Технически ръководител – 1 бр

-Специалист по здравословни и безоп. условия на труд – 1 бр

-Отговорник Контрол по качеството – 1 бр

Изпълнителски състав:

-Монтажник скеле – 8 броя

-Работници топлоизолация – 31 броя

-Мазачи – 3 броя

-Тенекеджии – 2 броя

Подпис и печат: .....

/Иван Дочуски/

КОНКУРЕНЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

-Работници демонтаж и монтаж тех.съоръжения по фасадите – 4 броя
- Бояджии – 3 броя
Времетраенето на този етап ще бъде 29 календарни дни.

VI – ти етап – Топлоизолиране на под

Екипа от работници за изпълнението на работите по този етап ще работи в сутеренните на трите входа, като работите ще се изпълняват мазе по мазе след подаден фронт за работа от собствениците им. И така мазе по мазе екипа от топлоизолаторджии последователно ще изпълнява грундиране, залепване и дюбелиране на топлоизолационните плочи,армираната шпакловка и финишното покритие – силикатна мазилка.

Инженерно – технически състав и работна сила за етапа:
Ръководен състав:
-Технически ръководител – 1 бр
-Специалист по здравословни и безоп. условия на труд – 1 бр
-Отговорник Контрол по качеството – 1 бр
Изпълнителски състав:
-Работници топлоизолация – 16 броя
Времетраенето на този етап ще бъде 22 календарни дни

VII – ми етап – Топлоизолиране на покрива на сградата

Работите по този етап ще започнат след подготовката на строителната площадка.
Последователно ще се изпълняват:
* демонтажа на старата хидроизолация и воронките.
* очукване на компрометираната съществуваща циментова замазка. * * изкърпването й и изпълнението на холкерите.
* полагането на нова топлоизолация
* хидроизолация на покрива, включително воронките и изпълнение на детайлите около бордове, комини и пр.
* обшивката с поцинкована ламарина по бордове ще се изпълнява след завършване на топлоизолацията по стените на борда, тя ще застъпи и новата топлоизолация.
* направа на топлоизолираните покриви върху откритите тераси на последните етажи.

Инженерно – технически състав и работна сила за етапа:
Ръководен състав:
-Технически ръководител – 1 бр
-Специалист по здравословни и безоп. условия на труд – 1 бр
-Отговорник Контрол по качеството – 1 бр

Подпис и печат:.....
/Иван Достумски/
СтилКомплекс Благоевград

КОНФИДЕНЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Изпълнителски състав:

-Работници топлоизолация – 6 броя
-Работници хидроизолации – 6 броя
-Общи работници – 6 броя
-Тенекеджии – 2 броя

Времетраенето на този етап ще бъде 28 календарни дни.

VIII – ми етап – Подмяна на дограмата на сградата

Работите по този етап ще започнат с демонтажа на старата дървена и метална дограма по остъклени тераси – на първият ден от началото.

Предвиждаме подмяната на дограмата да става от вътре, след съгласуване и подаден фронт за работа от собствениците на апартаменти.

Дограмата ще се демонтира и ще бъде изпълнен монтажа на новата, етаж по етаж, помещение по помещение, така че да не остават отворени помещения повече от един работен ден.

Последователно ще бъдат изпълнени обръщането от вътре около прозорците и вратите с мазилка, шпакловка вкл. ръбохранители, боядисване с латекс и монтажа на вътрешните подпрозоречните дъски и външните алуминиеви поли.

След монтиране на новата дограма, същата ще се покрие от външната страна, за да бъде предпазена от последващите мазилки по фасадата.

Инженерно – технически състав и работна сила за етапа:

Ръководен състав:

-Технически ръководител – 1 бр
-Специалист по здравословни и безоп. условия на труд – 1 бр
-Отговорник Контрол по качеството – 1 бр

Изпълнителски състав:

-Работници демонтаж и монтаж дограма – 8 броя
-Мазачи – 3 броя
-Бояджия – 7 броя

Времетраенето на този етап ще бъде 27 календарни дни.

IX – та етап Предаване на обекта и почистване на площадката

По време на целия период на строителството ще бъдат съставяни и подписвани протоколите по Наредба № 3/2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Своевременно, с доставката на всички материали ще бъдат представяни и Декларации за съответствие/Декларации за експлоатационни показатели.

Ще се изготвя екзекутивна документация за направените промени на одобрените работни проекти / в случай че такива се наложат по време на строителството/.

Подпис и печат:.....
/Иван Достумски/

КОНФИДЕНЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Предвидили сме срок от 2 дни, в който да поканим участниците в строителството за съставяне на Констативен Акт обр.15 за установяване годността на строежа за въвеждането му в експлоатация. През тези 2 дни ще демонтираме временното строителство и ще изчистим строителната площадка.

Инженерно – технически състав и работна сила за етапа:

Ръководен състав:

-Технически ръководител -1 бр

-Специалист по здравословни и безоп. условия на труд – 1 бр

-Отговорник Контрол по качеството – 1 бр

Изпълнителски състав:

-Общи работници – 6 броя

Всички работници, извършващи СМР ще се инструктират по ТБТ, ще са подходящо облечени и оборудвани с лични предпазни средства за съответната вид дейност.

2.ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР – МЕТОДОЛОГИЯ НА РАБОТА.

2.1.Технология на обработка на фуга между панелите и пукнатини.

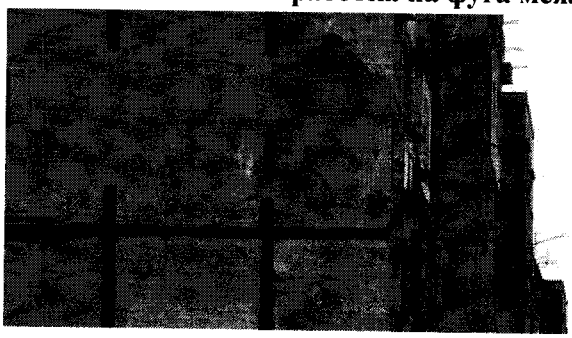

Запълването и запечатването на фуги и пукнатини ще се изпълни с циментов разтвор и ПВЦ мрежа.

Фугата и повърхността около нея ще се почисти ,продуха и обработи с цел по-добро сцепление и адхезия.

Фугата ще се запълни с циментов разтвор .Преди шпакловането и ще бъде армирана с ПВЦ мрежа по цялата й дължина.



2.2.Демонтаж и монтаж на вратите и прозорците

Подпис и печат:.....

/Иван Достумски/

КОНФИДЕНЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

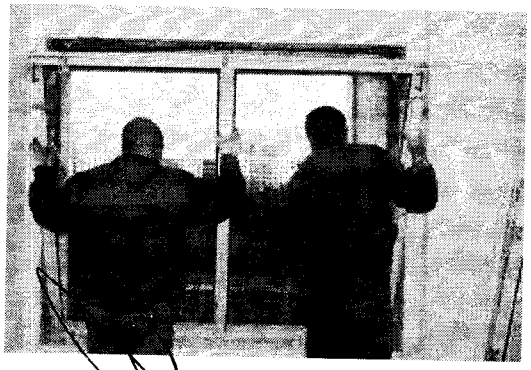

След демонтажа на старата дограма за всеки отвор ще се вземе мярка от място за производство на новите прозорци и врати.

Сглобяването на отделните части и елементи, начинът на окачване, отваряне, затваряне, както и уплътняването между прозорците и зидарията на отвора ще отговарят на спесификацията от проекта.

След изработването им същите се доставят до обекта със специално пригоден за това транспорт и се съблюдават мерки за правилното разтоварване и складирането им на обекта.

Монтажа се извършва от квалифицирани работници за монтаж на дограма, като при поставянето им се съблюдава тяхната центриране в оста на зида, хоризонтиране и вертикализиране.

Крилата на вратите и прозорците ще се монтират, така че да лежат в една равнина.

След закрепване на прозорците с по най-малко три винта на страна, останалите фуги се запълват с монтажна пяна. След втвърдяването й , остатъците се отстраняват внимателно, без да се нарушава боята по профилите.

Стъклопакетите се доставят на обекта и техния монтаж започва след обработката на страниците.

Материали:

-ПВС дограма по спецификация

-Алумниева дограма по спецификация

-Врати по спецификация

Контрол

Всички доставени изделия и изпълнени работи се приемат от Техническия ръководител

За приемането на дограмата се съставят два констативни акта:

-За съответствие и качество от производителя при доставка;

-На обекта след завършване и монтаж;

Подпис и печат:.....

/Иван Достумски/

Следи се за правилното хоризонтиране и нивелиране на дограмата, доброто уплътнение и отваряемостта.

Прозорците, вратите и витрините се приемат по брой, вид и размери.

Крилата на вратите и прозорците трябва да лежат в една равнина.

Забранява се разкрояването на мокри стъкла.

Забранява се извършването на стъкларски работи на открито при дъжд и вятър със скорост над 5 м/сек.

Забранява се оставянето на отпадъци от разкрояване на стъкла и счупени стъкла по работната маса , пода или терена. Същите ще се събират в определени за тях съдове.

При пренасянето на каси със стъкла, на единични стъкла, както и счупени стъкла или отпадъци от разкрояването им, работниците ще ползват брезентови ръкавици.

Пренасянето на големи единични стъкла ще става във вертикално положение, най-малко от двама работника, ползващи брезентови ръкавици и презрамни колани или въжета с каучукови подложки.

Безопасни условия на труд

1.За монтаж и демонтаж на дограма се назначават лица, които са:

-Навършили 18 години

-Преминали медицински преглед;

-Преминали начален инструктаж по безопасност на труда.

2.Работи се извършват само от работници, които са обучени и инструктирани по здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна и аварийна безопасност.

3.При всяко преместване на работници на друго работно място, се извършва инструктаж за изискванията по безопасност на труда на новото работно място.

4.Не се допуска до работа лица, които са без изискващите се за съответният вид работа предпазни средства и не са инструктирани и обучени за използването им.

5.Не се допуска надвесването през отворите на демонтираната дограма

6.Не се допуска опирането на дограмата, когато все още не е закрепена

7.Ново монтираните прозорци и витрини се маркират с лента „Х“, за да се избегне преминаването през тях, считайки ги за празни отвори.

2.3.Технология на полагане на топлоизолационната система с EPS плоскости

КОНСИДЕНЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Подпис и печат:.....

/Иван Дочумски/



Последователността на полагане има следните етапи:

1.Подготовка на основата

За да се предотвратят евентуални проблеми при залепване на топлоизолационните плочи към основата, ще да бъдат отстранени напълно всички стари боядисвания на варова основа. Всички цапащи / кредиращи/, но здрави боядисвания / например силикатни бои/, могат да бъдат запечатани посредством грундиране с дълбокопроникващ заздравяващ грунд.

В зависимост от състоянието на основата ще се вземат съответните мерки за нейната подготовка за полагане на топлоизолационните плочи. Тя ще се обезопраши и почисти от замърсявания и наслоявания. Компрометираните участъци ще бъдат изкъртени и отстранени. Изкъртените участъци ще се запълват с подходящ строителен разтвор, а по-големите неравности ще се изравняват. Леко ронливи основи ще бъдат добре грундирани с дълбокопроникващ и заздравяващ грунд.

2.Залепване на топлоизолационните плочи

При залепване на плоскостите, лепилото ще се нанася или върху топлоизолационната плоча или върху основата. Различават се три метода на лепене на плочите.

-Лепене на топки – при полагането на топки, по обиколката на плочата се нанася ивица лепило, което фиксира нейните ръбове и ъгли и така редуцира деформациите.

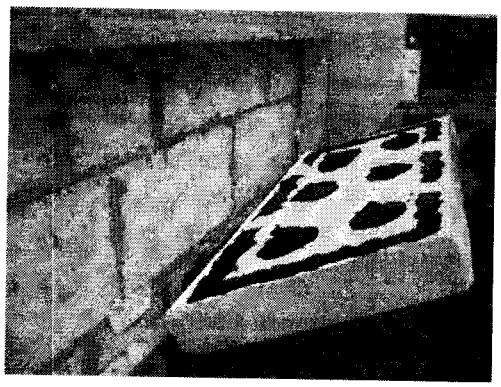

Подпис и печат.....

/Иван Достумски/

Нанасят се 3 до 6 топки в средата на плоскостта, което предотвратява нейното издуване напред / изпъкване/. Общата повърхност покрита с лепило ще бъде 40%



-Лепене по цялата площ – лепилото се нанася на гребен по цялата повърхност на плочата с помощта на назъбен шпаклар с ширина на зъбите 20 мм. При нанасянето зъбите на шпаклата ще достигат плоскостта, за да се оформят достатъчно големи канали, осигуряващи място за разстилане на лепилото след притискане на плоскостта към основата. При лепене по този метод може да се нанася лепило и върху основата.

-Машинно лепене – лепилото може да се нанася както върху плочата, така и върху основата. Общата повърхност покрита с лепило ще бъде 60%

3.Дюбелиране на топлоизолационните плочи

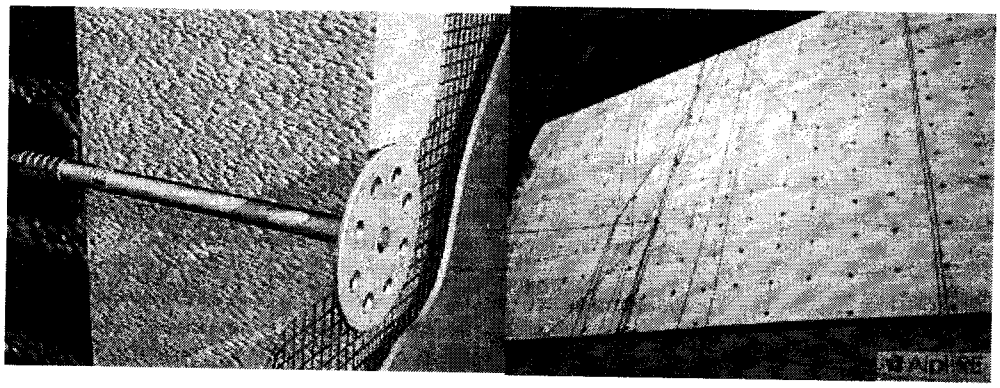

Минимум 24 часа след като са залепени плоскостите, ще се извърши така нареченото механично закрепване или дюбелирлане. Закрепването на плоскостите с дюбели задължително ще става след достатъчно втвърдяване на лепилото. Дюбелирането ще се извърши съгласно разработени схеми в зависимост от брой дюбели на квадратен метър. Най-често се прилагат 6 бр/м2.

Подпис и печат:.....
/Иван Достумект/

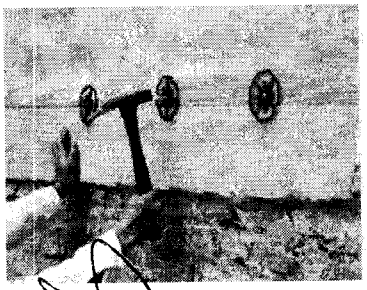
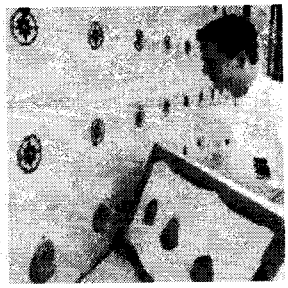

Дюбелирането ще става задължително през лепилен слой, т.е.през местата, в които плоскостта е залепена към стената. Дълбочината на анкериране в носещата основа ще бъде минимум 35 мм. При набиването главата на дюбела потъва леко в полистиреновата плоскост и след това се защпаклова отгоре. Потъването на дюбела е с цел да не пречи впоследствие при полагане на шпакловката, чията дебелина е от порядъка на 2 – 3 мм. Дюбелирането се извършва задължително, когато се полага топлоизолационната система върху мазилка или бетон.

След като се налепят плоскостите по фасадата и се дюбелират, следва пришлайфане на повърхността им като целта на тази операция е от една страна да се загладят всички възможни ръбчета и издатини и от друга – да се свали грапавината и праха. Полистиреновите плоскости, изложени на пряко действие от слънчевите лъчи, образуват по повъпхността си слой от деструктуриран материал, който от своя страна възпрепятства сцеплението с последния шпакловъчен слой. Визуално това се изразява в пожълтяване на плоскостите. Образуването на този слой започва 4 – 5 дни след като плоскостта се изложи на слънце. Ето защо шлайфането в този случай е от изключителна важност.

4.Оформяне на ъгли, фуги и допълнително армиране.

Преди да се положи шпакловката ,по цялата фасада ще се извършат подготвителни мероприятия, които ще предопределят завършения облик на фасадата. Това ще включва залагането на външни и вътрешни ъгли, завършващи профили, обработка на деформационни фуги и други. Ще се заложат и диагоналните армирания с размер на мрежата най-малко 20 х 40 см по ъгли на отвори, прозорци и над врати с цел уякчаване на армировката в зоната на действие на ръбовите напрежения.



Подпис и печат:.....
/Иван Достумски/

19

18

За изпълнението на деформационни, работни, разделителни, монтажни и др.- фуги ще се използват профили за фуги или уплътнителни ленти за фуги, с което ще се гарантира тяхната воднонепропускливост.



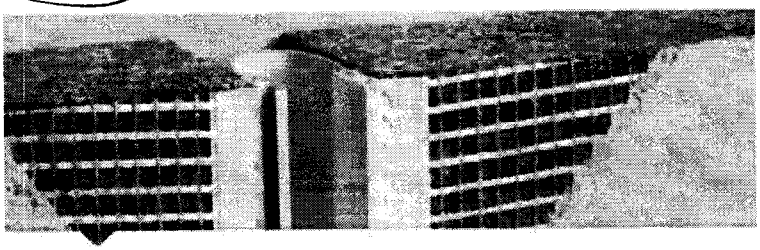

Профилите за фуги се състоят от един или два пластмасови ъгъла свързани с гумена връзка помежду си и заработена в тях армираща мрежа. Те са подходящи и ще се използват за фуги с ширина до 5 см. При изпълнението им ще се следи те да се застъпват вертикално и да не остава разстояние между тях. Уплътнителната лента се състои от импрегниран пенопласт и ще се използва за фуги до 2 -3 см.



Изпълнението на връзките на топлоизолационната система със страничните стени на отворите за врати и прозорци и техните рамки ще се извършва посредством уплътнителен профил, който притежава интегрирани уплътнение и армираща мрежа, гарантиращи сигурната и без пукнатини връзка. По този начин ще се образува нетвърда, уплътнена срещу пропускане на вода конструктивна връзка между мазилката и рамката / дограмата/. При изпълнението ще се съблюдава армиращата мрежа на профила да се застъпва най-малко 10 см с мрежата на фасадата.

Подпис и печат:.....
/Иван Достумски/

20

Минимум 24 часа след подготвителните действия ще сде изпълнява шпакловката по цялата повърхност. Шпакловъчната смес ще се нанася на гребен 10 см преди полагане на мрежата, след което мрежата се притиска към основата, така че шпакловъчната смес да избие през нея. Следва заглаждане. Застъпването на ивиците мрежа е около 10 см. Основно правило при полагането на мрежата е след заглаждане на шпакловката върху нея мрежата да не се вижда. При необходимост ще се добавя материал при заглаждането. Така подготвената и шпаклована повърхност се оставя да изсъхне от 4 до 7 дни в зависимост от атмосферните условия. В противен случай има опасност при нанасяне на финишното покритие да се запечата влага под повърхността му, което би довело до дефекти по фасадата.

6.Грундиране



С цел, създаване на по-добри контактна повърхност, върху армиращият шпакловъчен слой ще се нанася контактен грунд, който подобрява адхезията на финишното покритие към шпакловката и предотвратява бързото попиване на водата в нея. Контактният грунд задължително ще бъде оцветен, за да се предотврати евентуално прозиране на шпакловката през финишният слой.

7.Финишно покритие



Оформянето на повърхността на една топлоизолация може да бъде изпълнено по много различни начини. Заедно с облицовките от естествен камък, плочи и други видове керамични покрития, мазилките са най-често използвания като финишно покритие материал.

Монтаж скеле

Най-доброто качествено изпълнение на ТИ система е чрез работа от скеле. Така се работи спокойно и методично без да се пропускат технологичните изисквания на

Подпис и печат:.....
/Иван Достумски/

РЕПУБЛИКАНСКА ИДЕНТИФИКАЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ

СМР. Металното тръбно скеле е предназначено за изпълнение на довършителни работи по фасадите на сгради и съоръжения. Класифицира се като работно предпазно скеле и се изпълнява с тръби с диаметър 48,3 мм, като дебелината на стените им може да варира. Скелето ще бъде добре укрепено и правилно монтирано. То е предназначено да поема товари от машини, материали и движещи се хора.

Материали

-Фасадно тръбно скеле
-Топлоизолационни плочи от EPS
-Лепило за EPS
-Армираща PVC мрежа
-Дюбели
-Шпакловка
-Универсален контакт грунд
-Финишно покритие – Силикатна и Мозаечна мазилка
-Уплътнителна лента и профили, профили за фуги, водооткапващ профил, ъгъл с мрежа за оформяне на детайли

Контрол при изпълнение и приемане

При изпълнението на топлоизолация не се допускат:
-Механични повреди на ТИ конструкция
-Опъваане на армировъчна мрежа в отклонение от предписаното в проекта;
-Провисване / свличане/ усукване и междини на изолационната конструкция;
-Празнини и непълно полагане между защитни покритие и основния топлоизолационен слой;
-Изпълнение на температурни фуги в отклонение от предписаното в проекта

Топлоизолационните работи ще се изпълняват под контрола на техническия ръководител.

На приемане подлежат следните етапи от ТИ:
-Подготовка за изолиране повърхности преди полагане на ТИ плочи
-Броя и вида на положените дюбели
-Стъклофибърната мрежа
-Защитния слой шпакловка
-Участъците, които подлежат на запушване при изпълнение на други видове строителни работи

При окончателното приемане на топлоизолациите се проверява:
-Видът и показателите на използваните материали, изделия и полуфабрикати, съгласно предписанията в проекта и изискванията.
-Свидетелствата за качеството на материалите и изделията, предадени от производителите и протоколите от лабораторните изпитвания, ако има такива;

КОНФИДЕНЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Подпис и печат:.....
/Иван Дос[illegible]

-Констативните актове за скрите работи на отделните етапи на съответния вид работи;

-Изпълнението на детайлите в съответствие с проекта;

-Отклоненията в размерите и плътността на топлоизолационните конструкции и защитното покритие;

-Наличието на вдлъбнатини по повърхността на готовата ТИ

-Наличието на пукнатини, процепи и отвори в ТИ

2.4.Технология на топлоизолиране на под – поставяне на топлоизолация от страната на сутерена

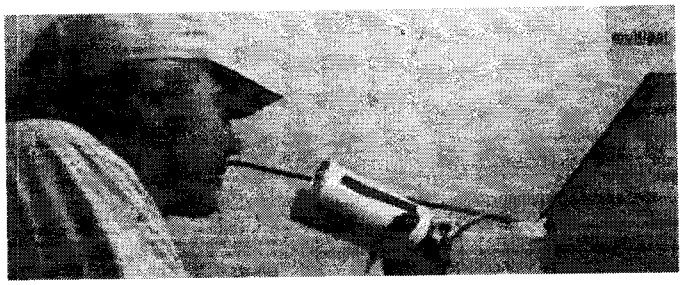

Тавана на сутерена също ще се топлоизолира с цел постигане на желаната енергийна ефективност.

Преди започване на работа основата ще се почисти от прах и нечистотии.

По тавана на сутеренните помещения ще се положи дълбокопроникващ грунд, след което ще се залепят топлоизолационните плочи

Плочите ще се нареждат плътно една до друга, без да се оставят кухини, ще се дюбелират и ще се шпакловат със стъклофибърна мрежа.

След изсъхването на шпакловката ще се нанася грунд и последвалата силикатна структурна мазилка.

Контрол при изпълнение и приемане

При изпълнението на топлоизолация не се допускат:

-Опъване на армировъчна мрежа в отклонение от предписаното в проекта;

-Празнини и непълно полагане между защитното покритие и основния топлоизолационен слой

Топлоизолационните работи ще се изпълняват под контрола на Техническия ръководител.

При окончателното приемане на топлоизолациите се проверява:

-Видът и показателите на използваните материали, изделия и полуфабрикати, съгласно предписанията в проекта и изискванията;

Подпис и печат.....

/Иван Доктумски/

-Свидетелствата за качеството на материалите и изделията, предадени от производителите и протоколите от лабораторните изпитвания, ако има такива;

-Констативните актове за скрити работи на отделните етапи на съответния вид работи;

-Отклоненията в размерите и плътността на топлоизолационните конструкции и защитното покритие;

-Наличието на вдлъбнатини по повърхността на готовата повърхност;

-Наличието на пукнатини, процепи и отвори.

2.5. Технология на изпълнение на мазилки

Вътрешната машинна вароциментова мазилка по бетонни стени и тавани ще се изпълни със сухи смеси.

Вътрешната циментова мазилка ще се изпълни със суха циментова смес. Основата преди изпълнение ще бъде добре почистена и обезпрашена. Повърхностите ще се грундират с дълбоко проникващ грунд между отделните слоеве от изпълнението, за по-добро сцепление и адхезия.

Мазилките ще се полагат след изпълнение на всички инсталационни работи и приемане на основата.

Мазилките ще се изпълняват по стените и таваните от разтвори с минерално свързващо вещество според проекта и по видове според:

-Броя на пластовете – едно, дву или многопластова;

-Физически качества на втвърдения разтвор – обикновенна, водоуплътняваща и др.

-Място на полагане – външна, вътрешна, по тавани, по стени

-Вид на основата – върху тухла, бетон или др.-

-Вид на свързващото вещество – варова, гипсова, циментова, варогипсова, вароциментова

-Начин на изпълнение – гладка, пръскана, влачена, мита, благородна и др.

Материали и инструменти

-Мазилка – съгласно проекта

-Шпакла

-Маламашка

-Пердашка

-Бъркалка

Всички материали за мазилките ще отговарят по вид и цвят на предписанията на проекта, както и на изискванията на съответния стандартизационен документ.

Материалите се доставят на партиди. Не се допуска при транспорт и складиране да се смесват материалите от отделните партиди.

КОНФИДЕНЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Подпис и печат:.....

/Иван Достумски/

Водата за приготвяне на разтворите, за подготовка на основата и за поддържане на влагата трябва да отговаря на изискванията на БДС

Спомагателните материали – лайсни, ъгли и водачи, трябва да отговарят на съответния БДС и да бъдат чистки от масла, ръжда и др. замърсявания. При гипсовите мазилки металните части трябва да са неръждаеми или изолирани срещу корозия.

Мазилките се изпълняват по технологичен ред в съответствие с графика на обекта.

Контрол на изпълнение и приемане

При приемане на мазилките ще се проверява следното:

-Мазилката, както и всеки от пластовете, да бъде здраво захваната за основата или по долния пласт;

-Повърхностите да бъдат равномерни, гладки, с добре оформени ръбове и ъгли, без петна от разтворими соли или замърсявания и без следи от обработващи инструменти;

-Мазилката не трябва да има пукнатини, шупли, каверни, подутини и други видими дефекти.

При приемане на мазилките се съставят пълна документация / протоколи, актове за скрити работи, удостоверения и др./ за доказване на качествата на материалите, марката на разтворите и на изискванията в проекта.

2.6.Технология на изпълнение на шпакловки

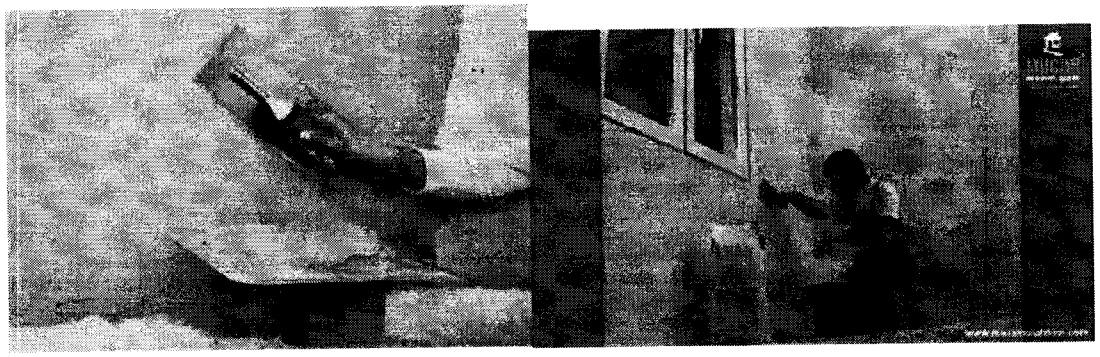

Грундирането с дълбоко проникващ грунд е подготвителна операция. Тя осигурява уеднаквяване на основата и улеснява полагането на следващото покритие. Синтетичните смоли, които се съдържат в грунда укрепват връзките между отделните частици и така заздравяват основата. Нанесеният слой с баданарка или с мече, ще образува фино покритие, което намалява попиваемостта на основата. След като грунда е изсъхнал, което става за около 4 часа, ще се пристъпи към нанасянето на първия слой шпакловка.

Подпис и печат:.....

/Иван Достумски/

Определени изисквания също има и при разбъркването на сухите строителни смеси. Взависимост от вида и предназначението им, те се бъркат на по бавни или по бързи обороти. При бавно разбъркване на сместа не се вкарва въздух в материали и така при нанасянето му върху основата, за която е предназначен, материала е гладък и лесен за работа. Много важно условие за постигането на добър краен резултат е също така узряването на сместа. След като първоначално се разбъркват с вода някои от съставките на сухите строителни смеси не се активират веднага. Необходимо им е известно време да останат под въздействието на водата и въздуха. За различните продукти това време е различно и производителите стриктно го отбелязват върху опаковките. За да достигне сместа своите най-добри показатели тя трябва да се разбърка отново. Едва тогава може да се пристъпи към същинската работа –нанасянето на сместа върху повърхността. С шпаклата или мистрията се поставя материал върху единия край на маламашката. С леко натискане като се започне отдолу нагоре се разнася материала. Това може да се направи повече от веднъж. След като се нанесе достатъчно материал се започва шпакловане. Маламашката се почиства с шпаклата, така че върху нея да не остава материал. След това с кръгови движения, под ъгъл от 30 градуса, само в едната посока, се започва изглаждането на стената. След изсъхване на първият изравняващ слой на шпакловката, всички неравности по стената се заравняват и шлифоват с шкурка.

С четка се отстранява прахта от стената за да се осигури по-добро сцепление между двата слоя и след това се нанася вторият завършващ слой. За финишното шпакловане се използва нова циментова шпакловка. Тя е предназначена за изглаждане на повърхности на стени и тавани на закрито. Максималната дебелина на слоя е 2 мм. И при разбъркването на тази смес важат същите правила, както и при предишната шпакловка – разбърква се на бавни обороти, и се изчаква около 5 минути.

За узряването на разтвора и след това финално разбъркване с миксера за получаването на идеална хомогенна смес за лесна работа. При съхраняването на сместа в добре затворен съд, тя може да бъде използвана 24 часа. Шпакловката се нанася на равномерен и тънък слой върху основата. Съставките на сместа предполагат едно малко по-дълго време за съхнене – около 24 часа на 1 мм слой. Естествено времето за съхнене изключително зависи от температурата и влажността на околната среда. Шпакловката е наложителна, когато стената ще се боядисва или дори, когато върху нея ще се лепят тапети. Така изчезват всички неравности, стената става гладка и върху нея лесно се нанасят следващите слоеве – грунд, боя или тапети.

Препоръчително е когато се пристъпва към шпакловане, температурата да е над 10 градуса. Това е важно, тъй като сухото строителство позволява работа и през зимата, но при шпакловането трябва да се следи за температурата. Иначе се рискува фугата да се напука след време.

След като изсъхване на първата ръка е задължително шпакловането през цялата повърхност на конструкцията. Така се уеднаквява повърхностния слой и при нанасяне на следващото покритие.

Подпис и печат.....

/Иван Десподов/

Материали и инструменти

-Шпакловка на циментова основа – съгласно проекта

-Гипсова шпакловка – съгласно проекта

-Маламашка

-Квадратна табла за материала

-Голяма бояджийска четка – за пръскане на вода

Последователност на изпълнение:

-Шпакловане

-Подравняване и заглаждане

-Втора ръка шпакловка

-Подравняване и заглаждане 2 ръка

-Полиране

Контрол на изпълнение и приемане

Следи се за следното:

-Повърхностите да бъдат равномерни, гладки, с добре оформени ръбове и ъгли, без петна от разтворими соли или замърсявания и без следи от обработващи инструменти;

-Шпакловката не трябва да има пукнатини, шупли, кавдерни, подутини и други видими дефекти

2.7. Технология на изпълнение на бояджийски работи

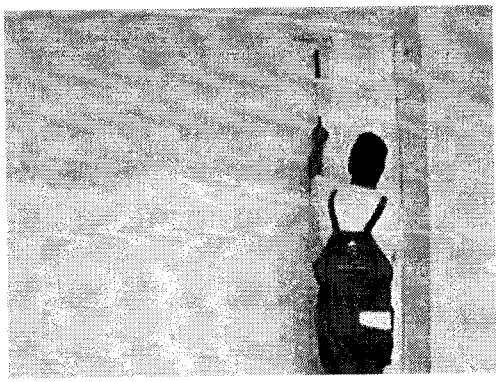

Грундът ще се нанася с баданарка по цялата повърхност. Той има няколко основни предназначения:

-заздравява основата

-фиксира прахта

-уеднаквява попиваемостта

Подпис и печат:.....

/Иван Достумски/

При нанасянето грундът е бледо жълт, но след изсъхване става прозрачен и не променя цвета на боята, която ще се нанася след това.

Всяко крайно покритие, както интериорните бои, така и тапетите, се нуждаят от здрава основа с уеднаквена попиваемост. Полимерните и други съставки уеднаквяват попиваемостта и заздравяват основата.

Върху избора на цвят при боядисване на помещенията влияят различни фактори. В добре осветени помещения могат да се използват и по-студени цветове на боята. Те правят помещенията да изглеждат по-просторни, но в същото време могат да създадат и усещане за хладнина. За по-тъмните помещения е препоръчително да се използват топли цветове, защото те отразяват по-добре светлината.

За по-добрия краен резултат от боядисването освен подготовката на основата и избора на боя, основна роля играе и правилният избор на подходящ инструмент – мече. За цветовото оформяне на даденото пространство трябва да се избере един основен цвят, който ще дава тона и може да се каже характера на помещението.

Важно е преди пристъпване към боядисване да се прочетът инструкциите на производителя. Така е сигурно, че боята е правилно подготвена за употреба. В повечето случаи цветът се избира по каталог и се получавна готовата оцветена боя. Така производителите гарантират, че всеки път ще се получава боя с еднакъв цвят. За получаване на добро покритие обикновено е достатъчно двукратното нанасяне на боята, но съгласно проекта и изискванията може да се нанесат и три. Между нанасянето на слоевете е необходимо да се изчака поне 3 – 4 часа.

Материали и инструменти

-Боя по спецификация
-Грунд
-Мече
-Телескопична дръжка за високите участъци
-Четка за малки участъци
-Хартиена лента за отсичане на тавана от стените и дограмата от стените
-Ваничка за латекса

Контрол на изпълнение и приемане

Полагането на бояджиийски разтвори се извършва при температура на най-студената външна стена най-малко плюс 8 градуса, измерена на 0,5 м от пода. При по-ниски от посочените температури няма да се допуска изпълнението на бояджийски работи.

При приемането на бояджийските работи ще се следи за:

-Повърхностите трябва да бъдат с еднакъв цвят, с равномерно наслояване и еднаква обработка

Подпис и печат:.....
/Иван Достумлиев/

-Няма да се допускат петна, ленти, напластявания, протичане, бразди, мехури, олющвания, влакнести пукнатини, пропуски, следи от четка, изстъргвания и видими поправки, различни от общия фон

Бордюрите и фризовете ще имат еднаква ширина по цялото си протежение

-Браздите, пръските и петната по релефно обработените повърхности ще бъдат разположени равномерно съгласно изискванията на проекта.

-Лицата работещи с вредни вещества при бояджийските работи ще ползват ЛПС, съгласно плана за безопасност и здраве.

-Работниците ще ползват очила и маски

2.8.Технология на изпълнение на замазки





Преди полагане на циментo-пясъчния разтвор бетоннатаповърхност ще се очуква, почиства се много добре от строителни отпадъцио, ще се измита и измива с вода. Стените ще се облепват с полиетилен до 30 мм от пода за предпазване от напръскване вследствие шприцоването и хоризонталното придвижване на разтвора по повърхността

Ще се извършва предварителна нивелация на подовете / основата/, като до касата на всяка врата върху стената или на самата каса ще се нанася маркировка, гарантираща сигурното определяне нивото на готовата замазка. При определяне нивото на готовата замазка се допускат разлики в зададените коти не повече от ± 3мм. Нивата на замазката се определят в зависимост от вида настилка и съгласно работния проект.

Добре почистена и изметена повърхност ще се намокря обилно с вода – двукратно на интервал от 30 минути с цел водонасищането й, като не се допуска образуването на локви. Това се извършва с маркуч, включен във водната инсталация или от варели с вода, шприцова се с циментов разтвор.-

Преди полагането на замазката ще се уплътняват всички отвори и процепи с цименто – пясъчни разтвори, приглаждат се достъпите на монтажни и инсталационни отвори, а така също и до вратите на стълбищни площадки.

Подпис и печат:.....

/Иван Достумеки/

Забърква се нужното количество циментo – пясъчен разтвор, или се ползва готова суха смес, пренася се ръчно до местополагането му,полага се заглажда се и се изпердашва до получаване на гладка хоризонтална повърхност.

Материали и инструменти

-Замазка съгласно проекта
-миксер за строителни разтвори или бормашина с бъркалка
-мистрии
-табла
-маламашка
-маркуч
-метла
-кофи и ръчни колички
-нивелир с водна либела
-чук

Контрол на изпълнение и приемане

Контролът за съответствието с проекта и нормативните изисквания при изпълнение на подовите замазки включва проверка на основата и основния пласт замазка като се следи за:

-Отклонения от хоризонталната проектна равнина
-Наклоните към сифони, канали, барабани и др.
-Дебелината на полаганата замазка
-Неравностите на повърхността / издатини, вдлъбнатини/
-Наличие на пукнатини, отслоявания, очуквани, ронещи се и замръзнали места.

Контрола върху качеството на доставените материали и изпълнението на замазките ще се осъществява от Отговорника по контрол на качеството и Техническия ръководител на обекта в съответствие с изискванията на проекта.

2.9.Топлоизолиране на покрива с минерална вата 12см в междинно покривно пространство

Покрива е тип студен и ще се топлоизолира с полагането на минерална вата 12см в междинно покривно пространство

Основата се почиства добре .

Плочите се нареждат плътно една до друга без да се оставят кухини върху армиран полиетилен.

Плочите ще се залепят към основата с цел фиксирането им на място и недопускане на разместване на отделните елементи .

При наличие на фуги между плочите ,те ще се с полиуретанова пяна.

Върху плочите ще бъде положена паропропусклива мембрана.

Подпис и печат:.....
/Иван Достумски/

2.10.Технология на монтаж на хидроизолация

Подготовка на основата

Повърхността на основата, върху която предстои да се полага хидроизолация, ще е равна с наклон съгласно проекта и без места с обратен наклон. При полагане на права летва с дължина 3 м по посока на наклона между летвата и основата не трябва да се образуват пролуки с височина, по-голяма от 5 мм, а в посока напречно на наклона, пролуки с височина, по-голяма от 10 мм.

Преди да се пристъпи към изпълнение на хидроизолационните работи, ще се провери дали повърхността на основата е достатъчно суха. Влажната основа ще се изчаква да изсъхне или ще се изсуши по изкуствен начин.

Към изпълнение на хидроизолацията ще се пристъпи, когато всички работи свързани с основата и вградените в нея елементи, са напълно завършени.

Готовата основа ще се почиства от прах и отпадъци, а след това цялостно ще се грундира.

Грундиране



Полагането на грунд върху основата има за цел да подобри адхезията между нея и хидроизолацията, а също така и да предотврати неблагоприятното действие върху адхезията на праховидни частици, намиращи се на нейната повърхност.

След изсъхване и почистване на бетоновите повърхности, те веднага ще се грундират с битумен грунд.

Няма да се оставят почистени и негрундирани повърхности, тъй като след запрашването им се налага ново почистване.

След грундирането веднага ще се положи първия изолационен слой, за да не се зацапва положения грунд.

Полагане на хидроизолация

Подпис и печат:.....
/Иван Достумски/

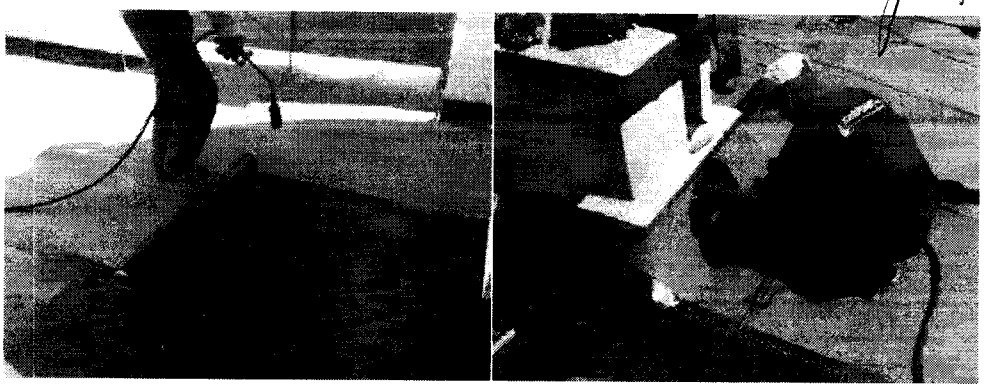

Върху така подготвената основа ще се полага първият пласт от хидроизолацията.

Хидроизолацията се полага върху основата чрез газопламъчно залепване. Ако тя е изложена на пряко слънчево греене ще бъде защитена с посипка.

При полагане на хидроизолацията не се отлепва защитното полиетиленово фолио – то се нагрява докато се разтопи и леко се размекне битумната смес.

Нагряването на материала се извършва чрез равномерни движения на газовия пламък по ширината на рулото до меко стапяне на битумния пласт.

Нагрява се тази страна на рулото, която ще се залепва към вече изолираната повърхност.

Залепването на мембраната се извършва от средата към краищата на рулото.

Мембраната трябва да се развива така, че да се получи застъпване на предшестващите ивици с 80 мм в надлъжна посока и 150 мм в напречна посока.

Застъпите и ръбовете се оформят с мистрия така, че да се получи водоплътна връзка.

В напречно направление снадките на мембраните от отделните пластове трябва да се разминат поне на 1/3 от ширината на мембраната.

В надлъжно направление снадките от отделните пластове трябва да се разминават поне на 1 м. С толкова трябва да се разминават и надлъжните снадки между мембраните от един пласт.

При връзка с бордове, вертикални стени и др. всички пластове от основната хидроизолация ще се извеждат до горен ръб на откоса, с който са оформени ъглите, върху така изведената хидроизолация, ще се спуска еднакъв брой пластове от горната страна, така че първият пласт да покрие целия откос и 10 см. от изолацията под откоса, а следващите пластове ще бъдат всеки с 10 см. по-дълъг от предишния.

Контрол

При изпълнение на хидроизолация се проверяват:

-Основата да бъда суха, устойчива, равна, плътни

-Параметрите на основата за полагане – дебелината, равността, наклона, разположението на предвидените в проекта фуги, оформянето при ъгли, чупки и др.;

-Сигурността на закрепване – в съответствие с изискванията на проекта

Подпис и печат.....

/Иван Достумски/

-Изпълнението на детайлите – в съответствие с изискванията на проекта

-Широчина на застъпване

При приемането на всеки елемент се представят всички необходими документи, с които се удостоверява, че при изпълнението са употребени материали с предписаните качества.

Ако при приемането се констатират недостатъци или неспазване на предписанията, съответният елемент няма да се приема, докато констатираните недостатъци не бъдат отстранени.

2.11.Технология на монтаж на водосточни тръби и аксесоари за отводняване на покрив

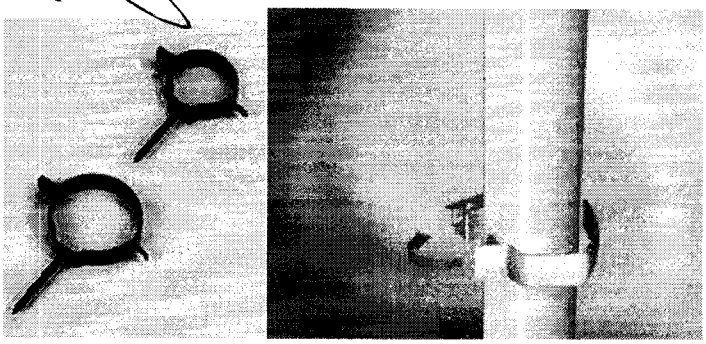

Водосточните тръби ще се закрепват към стената със скоби. Всяка скоба ще се закрепва с винт и дюбел, чиято дължина ще се подбира според дебелината на топлоизолацията и вида на материала, в които ще се закрепва. Минимум дюбелът трябва да проникне на дълбочина поне 50 мм в здрава основа, като се добави дебелината на топлоизолацията и плюс дебелината на скобата, ще са необходими дюбели с дължина поне 150 мм.

След като върху стената се определи местоположението на водосточната тръба, ще се пусне отвес или с помощта на лазерен нивелир върху нея се маркира вертикална линия, по която ще се разполагат скобите. Те се поставят на разстояние 2 – 2,5 м, една от друга, като тръбата трябва да бъде укрепена в началото и края на вертикалния участък, както и на местата, където има чупки, тройници или елемент за отклоняване на водата.

ВОРОНКИ

Подпис и печат.....
/Иван Достумски/

Воронката е предназначена за вертикално отвеждане на дъждовна вода от плоски покриви, козирки и др. Подходящи са за използване с всички видове АРР МОДИФИЦИРАНИ БИТУМНИ ХИДРОИЗОЛАЦИИ. Материалът, от който са изработени – има висока устойчивост на UV лъчио, озон и други атмосферни и химични агенти и висока гъвкавост при ниски температури. Това ще позволи използването им в широк температурен диапазон.

Решетка за воронка. Предназначението и е да спира проникването на листа, камъчета и други боклуци в отводнителната система на покрива. Може да се използва при воронки с диаметър е от 75 до 125 мм. Решетката се поставя отгоре в тръбата.

2.12.Технология на изпълнение на монолитна мозайка за ремонт на стъпала от мозайка.

При нарушена цялост на монолитната мозайка на стъпалата към сутерена във входовете, те ще бъдат ремонтирани като се очука старата мозайка и се изпълни нова такава.

Мозайките са двупластови настилки. Състоят се от основен пласт / хастар, замазка/ и горен / мозаичен/ пласт. Хастарът ще се изпълнява от циментов разтвор, а горният пласт – от цимент и мозаични камъчета. Полагането на мозайката ще се изпълнява в следната последователност:

Подготвителни работи:

Старателно ще се почисти подът от трески, прах, нечистотии, мазни петна и др. със стоманени четки. Петна от грес или масло ще се почистват с бензин или подходящ содов разтвор.

Ще се проверят правите ъгли и хоризонталността с ъгъл, мастар и либела.

Мозайката ще се полага върху стоманобетоновата плоча, като ще се следи основата да няма грапавини по-големи от допустимото.

Подготовката ще се смята за завършена, когато подовата конструкция е нивелира и почистена и се установи точната кота на готовия под.

Полагане на хастара

Хастарът щесе полага между предварително поставени водещи летви, които имат неговата дебелина. Разстоянието между тях не трябва да надминава 1,50 – 2,00 м. Водещите летви ще се нивелират преди изливането на разтвора, като мастарът се поставя върху две водещи летви, а върху него – либелата. Празнините останали след извъждането на летвите ще се запълват с разтвор.

Хастарът ще се подравнява с мастар, а след това и с маламашка. За подобряване на сцеплението му с мозаичния пласт повърхността на хастара ще се набраздява с

Подпис и печат.....
/Иван Достумски/

мистрия. Оставя седа свърже, като през това това време по него не трябва да се ходи или да се пренасят материали.

Нивото на хастара трябва да е по-ниско от това на готовия под толкова, колкото е дебелината на мозаичния слой.

Полагане на обикновена мозайка

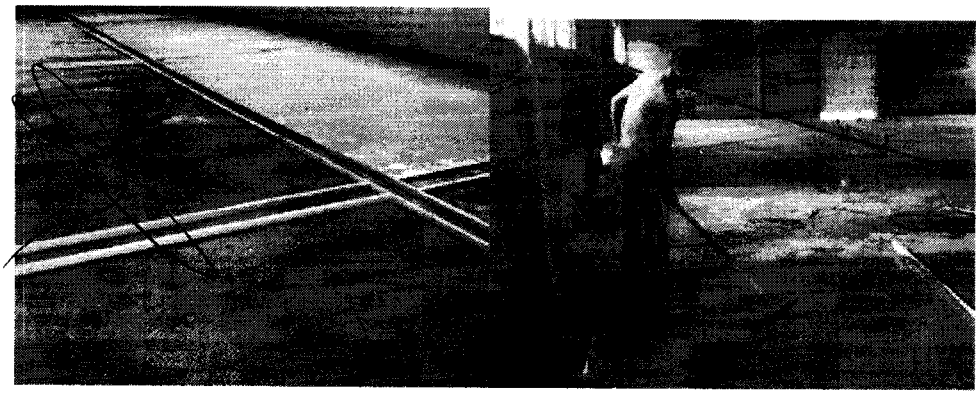

Много е важно мозаечната смес да се положи, подравни и остави впокой, преди да започне свързването на цимента, т.е. 30 – 40 мин. След забъркването му с вода.-

Мозайката ще се нанася върху обилно навлажнена основа / без локви/, за да не поеме подовата конструкция част от влагата на разтвора, което ще наруши нормалния процес на свързването.

Мозаечният пласт ще се полага върху хастара непосредствено след свързването му. Той трябва да е втвърдил, но да не е пресъхнал.

За да се получи равномерно разстилане на мозаечната смес, върху хастара ще се поставят летви с височина, равна на дебелината на мозаечния пласт. Хоризонталността им ще се проверява с мастар и либела. След нанасянето, разстилането и нивелирането на мозаечната смес, летвите ще се изваждат и оставените от тях фуги ще се запълват със същия разтвор. С помощта на мастара мозаечната смес не само ще се нивелира, но ще се и уплътнява. За целта мастарът ще се тръска непрекъснато във вертикално направление.

Заглаждането след това ще се извършва с мистрия и стоманена пердашка, ако същевременно пластът се уплътнява. Когато на повърхността се появи циментово мляко, се смята, че уплътняването е задоволително. Мляко ще се отстрани, за да не затруднява търкането на мозайката.

Мозайката престоява от 3 до 5 дни в зависимост от атмосферните условия, за да добие такава якост, че мозаичните камъчета да не се изронват при търкането й.

Шлифоване на мозайката

Подпис и печат.....
/Иван Достумски/

За да се разкрие структурата на мозайката, като същевременно се изравни и заглади повърхността й, тя ще се шлифова механизирано. В резултат на това ще се получи идеално гладка повърхност, удовлетворяваща изискванията.

При шлифоването мозайката ще се полива обилно с вода. Чрез постойнни измитания и поливки ще се отстранява на събралата се около машината гъста каша, която пречи на нормалния й ход. Самата машина не трябва да се застоява на едно място, за да не се получи вдлъбнатина от претъркване. При шлифоването машината ще се движи дъгообразно отляво надясно и обратно. Тази операция ще се повтаря до пълното разкриване на мозаичните камъчета. След това мозайката ще се измие обилно с вода.

Ако е необходимо и при наличие на остатъчни неравности и драскотини, те ще се запълнят с цимент. Това ще стане като се навлажни мозайка и след това се поръси със сух цимент. Той ще се размаже с метла по цялата повърхност. Образувалото се циментово мляко ще запълни всички драскотините и неравности. След 2 - 3 д–и мозайката отново се изтърква. Накрая се измива обилно с чиста вода.

Материали и инструменти:

-Материали – съгласно проекта
-Летва
-Либела
-Нивелачен маркуч
-Мистрия
-Мастар
-Пердашка
-Маламашка
-Лопата, четки и стъргалки
-кофи, зидарски канчета лейки и др.

Контрол на изпълнение и предаване

При приемане на подовите настилки трябва да се проверява следното:

-дали са спазени предписаните размери и наклони,
-предвидените качества на употребените материали
-уплътняването на отделните пластове на настилката и плътността на прилягане на горните пластове върху лежащите отдолу
-правилността на допира на настилката до другите конструктивни елементи
-запълването на фугите, ако има такива
-дали са изпълнение посочените в проекта детайли

Равността на настилката се проверява във всички посоки с двуметров мастар и либела, а при предписан наклон се използват и шаблони. Допустимите отклонения са: за бетонова основа / подложен пласт/ - 10 мм; за същинска настилка – 4 мм

Подпис и печат:.....
/Иван Достумски/

Отклоненията от хоризонталната равнина или даден наклон не трябва да превишават 0,2% от съответния размер на изпълнената настилка.

Отклонения на дебелината на подовата настилка от проектанта се допуска само на отделни места, като не трябва да надвишават 10% от предписанията / проверява се по време на изпълнението й/.

2.13. Технология на боядисване на метални парапети



Всички метални елементи ще бъдат антикорозионно обработени, защитени чрез боядисване с блажна боя, съгласно проекта.

Първо ще се подготви основата от метал, което е важен фактор за качеството на антикорозионната защита.

Преди боядисването повърхностите ще се почистват старателно от каквито и да е замърсявания и ще се подсушават добре. Местата с напуквания на старата боя, местата без достатъчно сцепление с метала или боята е изпадала, ще се почистват до чист метал и отново ще се боядисват.-

Боядисването ще се извършва на два пласта. Боята ще се нанася на тънки слоеве, без да се пропускат повърхности и без да се допуска образуването на петна и натичания.- Първият пласт боя ще бъде малко по-светъл от втория. Преди полагането на всеки пласт повърхностите ще се почистват добре.

Контрол

Следи се дали се спазва технологията на полагане, дебелината на покритието, дали има пропуски и появили се петна по повърхността, вследствие на недобре почистена повърхност на метала.

2.14. Технология на почистване и лакиране на дървени ръкохватки

Подпис и печат:.....
/Иван Достумски/

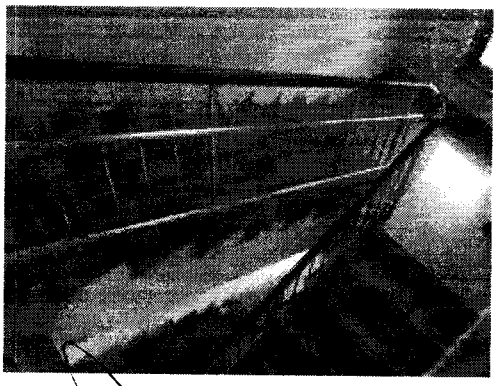

За да се промени и освежи естественият цвят на дървените ръкохватки, без да се закрие структурата на дървото, дървенииите ще се почистят, грундира и след това лакират.

Преди лакирането дървените ръкохватки ще се шлайфат и добре ще се почистят от прах и други замърсявания. Петната от туткал ще се отстраняват с топла вода, а мазните петна – с бензин. Дупките от гвоздеи и малки пукнатинки ще се запълват с безцветен кит.

Дървената повърхност ще се шлайфа преди да бъде лакирана с цел отстраняване на стария лак и постигане на максимално гладка повърхност.

За целта като начало ще започнем шлайфане с по-едра шкурка. Ще се шлайфа по дължина на естествените влакна, не напречно на тях. При по-дълги детайли ще се използва по дълго ренде за запазване правата повърхност и недопускане получаването на вдлъбнатини. След получаване назадоволителен резултат от шлайфането със шкуркта № 80, ще се премине към по-финна шкурка.

Следващата стъпка ще е навлажняване на дървото с гъба напоена свода, като се изчаква 10 – 15 мин., за да изпъкнат влакната / жилките/. Ще се изшлайфа, отново с по-финната шкурка и след пълното изсъхванеповърхността вече е готова за нанасяне на първа ръка грунд.

Грундът и лака ще се нанасят с четка на ръка по посока на дървесните влакна. Слоят ще бъде тънък и равномерен. След като изсъхне долния слой ще се премине към нанасяне на следващия. След лакиране дървените ръкохватки ще се полират за идеално гладка повърхност като се шлайфат леко с много фина шкурка, за да се премахнат власинките след настръхването на материала и за обиране на всякакви малки прашинки и грапавини. Ще се избърше така изшлайфаната повърхност с навлажнена в разредител памучна кърпа с цел отстраняване на всякаква прах.

Контрол на изпълнение и приемане

Контролът върху качеството на доставените материали и изпълнението на видовете работи се осъществява от техническия ръководител на обекта в съответствие с изискванията на проекта.

Подпис и печат.....

/Иван Достумски/

37

Следи се дали се спазва технологията на полагане, дали има пропуски и появили се петна по повърхността, вследствие на недобро изпълнение.

Лакираните повърхности се приемат след проверка на покривната способност на лака.

Ще се спазват стриктно указанията на производителя.

2.15. Изпълнение на работите по Електро инсталация

Мълниезащитна инсталация



След ремонта на покрива и монтажа на новата хидроизолация, ще започне изпълнението на мълниеприемната инсталация от мълниеприемници с изпреварващо действие и поцинкована стомана Ф 8мм. Отводите ще се изпълнят от стомана Ф 8 мм закрепена с поцинковани шини, положени скрито под топлоизолацията по стените.

На височина минимум 1 м от терена ще се монтират кутии, в които ще бъдат монтирани контролните съединители.

Заземленията ще се изпълнят с необходимия брой колове за постигане на преходно съпротивление 20 ома за мълниезащитата и до 10 ома за ГЕТ.

Преди въвеждане в експлоатация ще се направи измерване на съпротивлението от оторизирана ел. лаборатория.

Подмяна на осветителни тела с енергоспестяващи

Осветителни тела с нажежаема жичка, при работата си отделят голямо количество топлина, което нагрява токодовеждащите кабели и фасунги, те се износват, амортизират и накрая прегарят. Това налага подмяната на тези осветителни тела с нови енергоспестяващи. Най-малко топлина отделят луминисцентните осветителни тела / LED/ лампи и имат най-дълъг живот, което ги прави най-ефективни.

Осветителните тела ще бъдат с технически характеристики отговарящи на техническите спецификации.

Подпис и печат:.....

/Иван Достумски/

Изпълнението ще започне с демонтажа на съществуващите осветителни тела, като подмяната ще се изпълнява от квалифицирани работници при стриктно спазване на инструкциите за безопасност при работа.

При прегоряла изолация на меден проводник, тя ще се прерязва с клещи и отстранява до здрава част.

Кабелите на ел.инсталацията и осветителното тяло ще се свързват, като краищата им ще се заголват от изолацията и се притягат по двойки в единични лустерклеми. Така ще се постигне сигурна електрическа връзка, краищата на кабелите ще са изолирани и обезопасени срещу късо съединение, а при необходимост връзката лесно може да се разказа след развиване на притягащите винтове на клемата.

Няма да се допуска оставянето на оголени проводници, които могат да предизвикат късо съединение при допиране.

При вече свързани проводници ще последва монтажа на самите осветителни тела – плафониери с вграден датчик за движение и светлина

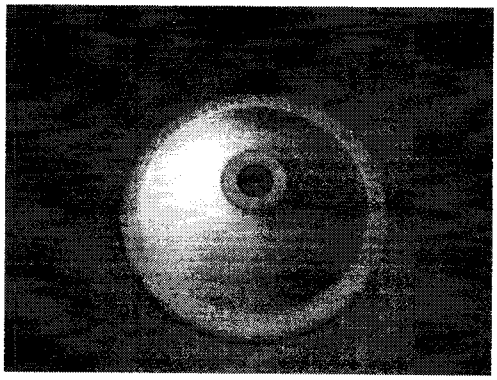



Вградения датчик ще повиши енергоспестяването, като осветителните тела ще светват само при движение и при неосветеност / през нощта и привечер/.

Осветителните тела ще бъдат неподвижно закрепени, така че да не изменят първоначално предаденото им направление.

Направлението на осветителния поток от осветителните тела, ако не е указано в проекта, ще бъда вертикално надолу.

Материали и инструменти:

-Осветителни тела с вграден датчик за движение и светлина – съгласно спесификация

-Клеми

-0Фазомер комбиниран с отвертка

-Клещи

-Отверка

-Изолирбанд

Контрол

Подпис и печат:.....

/Иван Достумски/

39

Ще се проверява сигурността на закрепване на осветителните тела.

Подвеждането на проводниците към осветителното тяло трябва да става по начин, който не позволява механическа повреда на изолацията за проводниците. Не се допуска понасяне на механически усилия от захранващите осветителното тяло проводници.

- Не се допуска съединяване на проводници вътре в конзолите и тръбите

Трябва да бъдат взети мерки против разхлабване на връзките, особено при сътресения и/или вибрации.

3.МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЗАТРУДНЕНИЯТА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ЖИВУЩИТЕ

Много важно е съгласуването и комуникацията между Изпълнителя и Ползвателите на жилищната сградата по инвестиционния проект

Всички строително – монтажни работи ще се изпълняват след уведомяване на Ползвателите с цел тяхната информираност и осигуряване от тяхна страна на фронт за работа. Дейностите, касаещи общи части на сградата, както и тези, които ще се изпълняват в домовете / като подмяна на дограмата/, ще се изпълняват след съгласуването с ползвателите и собственици на апартаментите. Едва след тяхното разрешение за работа в точно указан период от време, ще започват работите, като доставката на необходимите материали и оборудване ще е предварително организирана.

Изпълнителя ще изготви план – график на работите, съобразявайки се с Ползвателите, така че работите, които се изпълняват от вън на сградите да са през работно време / когато е предполага, че Ползвателите са на работа/, а работите изискващи достъп до помещенията, ще се изпълняват когато някой от Ползвателите е вкъщи или с негово разрешение и при даден достъп.

Техническия ръководител зорко ще следи за правилното изпълнение на СМР, същевременно и за запазването на помещенията чисти и във вида, в които са намерени / без счупени предмети и/или липсващи вещи/. Работниците ще бъдат специално инструктирани за работата в апартаментите на Ползвателите от Координатора по безопасност и здраве.

За да се избегнат жалби, протести, и всякакъв вид негативно отношение от Ползвателите на сградите, ще се вземат мерки срещу евентуален шум от работещи машини, замърсяване на околната среда, ограничаването на достъпа на хора до строителния обект – жилищната сграда.

За работа ще се изберат възможно тай-тихи машини и инструменти и ще им се извършва ежедневна поддръжка. Помощните машини, които са най-шумни, ще се шумоизолират посредством използването на заглушители при машините с вътрешно горене или със системи за въздушно налягането.

Подпис и печат:.....
/Иван Достумски/

Ще се отхвърли всяко превозно средство, което е необичайно шумно или прекомерно замърсява околната среда. Ако се установи, че определена машина надвишава приемливите прагове, ще се подмени й с друга.

Ще се избягва концентрацията на оборудване и строителни работи на едно място.

Оборудването, което е най-шумно, ще се ползва така, че да се спазва необходимият покой и времето за отдих от 14 -16 часа.

Предвид градския характер на работата и за да се намалят вредните въздействия от шума и вибрациите, работното време и условията на труд ще се съобразят с действащото законодателство, съгласно което най-шумните действия се извършват през деня, когато хората са на работа/училище.

Строителната площадка, сроковете и графика на изпълнение, датата на започване ще бъдат добре обозначени. Стриктно ще се спазва изготвеният и съгласуван с Ползвателите план-график на работите.

Няма да се допуска оставянето на ненужни за момента материали и строителни отпадъци по стълбищните площадки. Всички необходими инструменти и материали ще се подреждат и поддържат, така че винаги да има свободен достъп до апартаментите на Ползвателите.

Стриктно ще се спазват инструкциите за безопасност и хигиена на труда, всяко работно място ще се почиства след работа, като се оставя в приличен вид.

Ще се осигури възстановяване и поддръжка на всички звена, засегнати от строителната дейност в координация с органите, отговарящи за тях.

4.ВЪЗМОЖНИ РИСКОВЕ И ТЯХНОТО УПРАВЛЕНИЕ

1.Обща част

В практиката е възможно да се използват различни варианти за решаване на една и съща задача. Изпълнителят е длъжен да търси най-прекия, най-директният и най-ефективният начин за изпълнение на дадения процес. Това е свързано с икономия на време, сили, средства, ограничаване на риска от пропускане на възможност за изпълнение и пр., което определя същността на принципа на рационалността. В съответствие с този принцип е необходимо:

а/при анализа на дейността да се вземат предвид всички възможни рискове;

б/да не се изразходват излишни средства и време при провеждане на действията;

в/да не се извършват действия, които са лишени от практически смисъл и нямат значение за цялостния процес

г/ да се следи стриктно Линейният график и направената предварителна организация..

2.Анализ и управление на риска

Подпис и печат:.....
/Иван Достумски/

Анализът на риска има за цел да идентифицира, остойности и разпредели основните рискове на проекта. Рискът е възможността да настъпи определеното събитие, което да повлияе негативно или позитивно на развитието на проекта. Всеки риск има определена стойност, която трябва да бъде провизирана в изготвения финансов модел.

Целта на управлението на риска в проекта е увеличаване до максимална степен на вероятността за положително въздействие върху проекта и намаляване до минимална степен вероятността за отрицателно.

За рискове, които са били идентифицирани в предишни проекти са разработени стратегии за управление на риска

Управлението на риска представлява изпълнението на точно описани процеси с цел да не се допусне промяна на основните планирани и одобрени параметри, свързани с инвестиционния проект в негативно направление / удължаване на срока на проекта, надвишаване бюджета на проекта, отклонение от обхвата и др./

-Оценката на риска се преразглежда когато настъпят промени, които могат да окажат влияние върху риска:

-Настъпили промени в нормативната уредба на страната

-Икономическа ситуация в страната

-Фактори, свързани с екологията, културата, историята

-Фактори, зависещи от инфраструктурата и административното обслужване на местно ниво

-Изменение в инвестиционните намерения

-Съществена промяна в проекта

-Промяна в технологията на изпълнение

-При злополуки, аварии, бедствия и др. форсмажорни обстоятелства.

3.Количествена оценка на риска.

Идентифицирането на риска е интеративен процес на установяване на онези параметри, чиято промяна поотделно или заедно би предизвикала промяна в основните характеристики на проекта.

.Цел

-Обхват

-Срок

-Бюджет

-Качество

-Съответствие с изискванията на възложителя;

За количествена оценка на риска е прието цифрово степенуване на елементите на риска : вероятност /В/, тежест /Т/ и ниво на риска / НР/

Подпис и печат:.....
/Иван Достумски/

42

ВЕРОЯТНОСТ ЗА НАНАСЯНЕ НА ВРЕДА /В/

Вероятност	Описание на ситуацията	ОЦЕНКА
Невъзможна	Вероятността за сбъдване е почти нулева, такова събитие не се е сбъдвало в организацията или в сродни организации и се счита, че практически е невъзможно	0
Малко възможна	Възможно е да се сбъдне, но при съвкупност на различни взаимно свързани фактори, поради извършване на определена дейност, която ще се осъществи един път в периода 1 до 6 мес.	1
Възможна	Възможно е събитието да се случи при извършване на ежедневната трудова дейност, която се осъществява един път на ден	2
Висока степен на възможност	Възможно е събитието да се случи във всеки един момент, при извършване на ежедневната дейност	3

ТЕЖЕСТ на ВРЕДАТА / Т/

Тежест	Описание на вредата	Оценка
Малка	Незначителна,без последици	1
Средна	Умерена – има последици във времето	2
Средно висока	Сериозна – налага се да се вземат спешни марки	3
Висока	Опасна	4
Фатална	Катастрофална	5

НР – Ниво на Риска НР = В Т

Резултат	Оценка
НР = 1	Нищожна
НР = 2	Незначителна
НР = 3	Средна
НР ≥4	значима

Подпис и печат:.....
/Иван Достумски/

4. Възможни рискове за ненавременно и некачествено изпълнение на договора и предложения с мерки за преодоляването им.

При анализирането на настоящия проект е използван метода на експертна оценка на риска. Изхождайки от тръжната документация и вземайки в предвид инвестиционните намерения на възложителя и неговите възможности за финансиране, ние преценихме, че по време на изпълнение на Договора е възможна появата на разгледаните по-долу рискове, които имат значение за стойността на проекта и неговата реализация.

4.1.Времеви рискове:

4.1.1.Закъснение началото на започване на работите:

Необходимостта да се извадят документи / разрешителни за достъп до местонахождението на обектите; изготвяне и заверяване в съответните инстанции на проектна документация свързана с организация на изпълнението на строителството; изготвяне и заверяване на съответните инстанции на проекти за временна организация на движението и сигнализация на участъците, в които ще се изпълняват ремонтни работи и др. води до рискове от забавяне на началото на строителството.

КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА

№	Риск	Вероат Ност	Тежест на вредата	Оценка на риска /HP/	Ниво степен на риска
1	Закъснение поради забава издаване на разрешение за извозване на земни маси; разрешение за извозване на строителни отпадъци или други необходими документи и разрешения	2	1	2	Незначи Телно
2	Закъснение поради забава на изготвяне и съгласуване на план за временна организация на движението	2	1	1	Незнач.
3	Закъснение на строителството поради забавяне изготвянето на ПБЗІ и съгласуване	2	1	2	Незнач.
4	Забавяне поради обжалване от страна на класирани на по-задни места или отстранени участъци				
5	Забавяне на подписването на Договора между Възложител и Изпълнител	2	1	2	Незнач.

Подпис и печат:.....
/Иван Достумски/

6	Забавяне на одобрения на актуализираната Строителна / Работна програма и Линеен график от страна на Възложителя	2	1	2	Незнач.
7	Забавяне на одобрения за избора на материали за влагане в обекта от страна на Възложителя	2	1	2	Незнач.

Използвани входни данни

1	Наблюдения и огледи на обекта	Да
2	Комуникация с изпълнителя на дейността	Да
3	Изисквания на нормативни документи – изп.съгл.законодателството	Да
4	Анализ на ситуацията при изпълнение на подобни проекти	Да
5	Анализ на ситуацията в сродни по дейност организации	да

МЕРКИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ПРИ ВЪЗНИКВАНЕТО НА РИСКА

1	Своевременно придвижване и съгласуване на всички документи, както и заплащането на изискуемите такси
2	Изпълнителят следи за съставянето на план за Временна организация на движението, следи планът да отговаря за заложените в проекта и графика към техническото предложение срокове и етапи на изпълнение и дали те са приемливи за Възложителя и Консултанта
3	Изпълнителят следи за съставянето на ПБЗ, следи планът да отговаря на заложените в проекта и техническото предложение методи за изпълнение и дали тези методи са приемливи за Възложителя.
4	Изпълнителят ще съдейства на компетентните органи за по-бързото разрешаване на спора.
5	Изпълнителят ще осигури всички поискани от Възложителя документи за подписване на Договора и неговите Приложения в срок.
6	Изпълнителят ще предостави актуализирани Строителна програма и Линеен план- график за изпълнение на поръчката. Дори Възложителя да не спази сроковете за одобрение, не предвиждаме това да се отрази на сроковете по предложения график и да доведе до закъснение
7	Неспазването на сроковете за одобрение на материал пряко влияе върху сроковете за изпълнение и може да доведе до закъснение от графика. Преди започването на строително – монтажната част Изпълнителя ще подготви актуализиран списък с материалите за одобрение от Възложителя
	МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ / ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА

Подпис и печат:.....
/Иван Достумски/

1	Изпълнителят съставя чек лист с необходимите документи и срокове за набавянето им.
2	Изпълнителят изготвя план със срокове, съгласно Линейния календарен график, в рамките на които проекта / плана трябва да е изготвен, одобрен от Възложителя и съгласуван от компетентните органи.
3	Изпълнителят изготвя план със срокове, съгласно Линейния календарен график, в рамките на които проекта / плана трябва да е изготвен, одобрен от Възложителя и съгласуван от компетентните органи.
4	В подготовката на техническото предложение и офертата стриктно са спазени всички изисквания на Възложителя
5	Като евентуален Изпълнител на поръчката гарантираме, че предоставените документи са автентични, валидни, не са с изтекъл срок. Гарантираме, че имаме финансовите ресурси да обезпечим Гаранцията за изпълнение и Гаранцията за авансово плащане и са налице минималните технически изисквания за изпълнение на поръчката
6	Изпълнителят ще изготви план – график, съгласно Предложения Линеен – план график за изпълнение на поръчката, в който ще бъдат описани етапите, за които ще е необходимо одобрение от Възложителя, така че Възложителят / консултантътда има възможност да осигури необходимите му ресурси за спазване на сроковете по план – графика за одобрение.
7	Изпълнителят изготвя пълен актуализиран списък на материалите, които ще бъдат вложени в обекта, като описва произхода им, стандартите на които отговарят техническите характеристики и предоставя декларации за съответствие и/или сертификати за качество или протоколи за изпитване в лаборатория, като етапът на подбор на материали и доставчици е съгласно План за качество и внедрената Системата за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008
	МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА РИСКА
1	При забавяне на изпълнението поради неосигурени документи се предприемат мерки за експресното им издаване и ако тези мерки са недостатъчни Изпълнителят изготвя план за компенсиране на закъснението.
2	Изпълнителя следи за сроковете за изготвяне, съгласуване и одобрение, като в зависимост от ситуацията изготвя план за компенсиране на закъснението, като делегира и/или прехвърля права към други участници в изготвянето на проекта и/или включва допълнителни екипи към разработващите проекта.
3	Техническият ръководител и Отговорникът по ЗБУТ стриктно ще следят за спазването на Нормативната уредба в РБ и всички предписания и мерки за ЗБУТ
4	При изискване на разяснения по части от Строителната програма и Офертата ние ще предложените решения със съответните обосновки и изчисления, които да удовлетворят компетентните органи.

Подпис и печат:.....

/Иван Достумски/

5	Подготовката на документите за подписване на Договора ще започне при обявяването на резултатите от класирането на участниците и в случай, че сме класирани на първо място. В случай на липса на документ, ще предприемем всички необходими действия за най-бързото му предоставяне на Възложителя.
6	За да улесни Възложителя, Изпълнителят ще изготви доклад, в който ще бъдат отразени промените, които се предвиждат спрямо предадените с офертата Строителна програма и Линеен -- план график.В случай на забавяне Изпълнителят ще изготви план за редуциране забавянето на проекта.
7	Когато забавянето е в допустими граници. Изпълнителят ще изготви план за редуциране забавянето, като за целта, за да се спази графика на доставките за обекта е възможно да се включи втори доставчик, в случай че основният няма капацитета да изпълни заявените количества в по-кратък срок. В случай на забавяне на одобрение на материал, поради резерви към качеството или техническите характеристики на материала. Изпълнителят ще предложи на Възложителят алтернативен вариант, за одобрението, на който Възложителят ще може да реагира в по-кратки срокове.

4.1.2.Изоставяне от графика при текущото изпълнение на дейностите:

В процеса на изпълнение на СМР се предполага, че могат да се появят пречки в трудности, които биха представлявали предпоставка за закъснението или удължаване времетраенето на строителството.

КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА

№	Риск	Вероат Ност	Тежест на вредата	Оценка на риска /HP/	Ниво степен на риска
1	Закъснение на строителството поради забавяне изготвянето на актове и документи, съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството	2	1	2	Незн.
2	Доставка на некачествени материали, които е недопустимо да се вложат в обекта	2	1	2	Незн.
3	Прогниване на материали при лошо съхранение	2	1	2	Незн.
4	Кражби и нанасяне на щети от	2	1	2	Незн.

Подпис и печат:.....

/Иван Достумски/

	недобросъвестни лица				
5	Ненавременно заявено количество материал за доставка от технически персонал на обекта	2	1	2	Незн.
6	Доставен материал, който не съответства на изискванията на Възложителя	2	1	2	Незн.
7	Несъответствие на материала със заявения по вина на Доставчика	2	1	2	Незн.
8	Скрит дефект, незабележим при стандартен оглед на материала	2	1	2	Незн.
9	Риск от прекъсване на електроснабдяването поради евентуални аварии в системата	2	1	2	Незн.
10	Риск от технологични аварии	2	1	2	Незн.

Използвани входни данни

1	Наблюдения и огледи на обекта	Да
2	Комуникация с изпълнителя на дейността	Да
3	Изисквания на нормативни документи – изп.съгл.законодателство	Да
4	Анализ на ситуацията при изпълнение на подобни проекти	Да
5	Анализ на ситуацията в сродни по дейност организации	да

МЕРКИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ПРИ ВЪЗНИКВАНЕТО НА РИСКА

2	Успоредно с изграждането на обекта се съставят изискуемите по Наредбата протоколи, бетонов дневник, дневник на монтажните работи, дневник за заваръчните работи и др., както и се следи за навременното предаване на сертификатите и декларациите за съответствие на вложените материали и монтираното технологично оборудване
2	В политиката за качество на Изпълнителя е предвиден етап за входящ контрол / от договаряне до доставка до обекта/ на всички доставки преди да бъдат приети на склад за съответния обект. В попълваните анкетни карти се отразяват всички дефекти и се преценява дали е възможна употребата на материала с получаване на повече отпадък или той е негоден и се подменя с нов
3	В Плана по качество на Изпълнителя и съгласно разработената и внедрена Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008, са описани мерките за съхранение на материалите на обекта, начините на складиране и пренасяне.

Подпис и печат.....
/Иван Достумски/

48

4	Рискът от нанасяне щети при кражба или вандализъм се намаляват с осигуряване на жива охрана на обекта.
5	Преди началото на обекта се предвижда съставяне на вътрешен график / спецификация/ на доставките въз основа на подадения от Изпълнителя Линеен график за изпълнение. Графикът на доставките е разработен на база програмен продукт, с което се контролират не само сроковете за доставка, но и пълнотата на видовете материали и техните количества.
6	Още на етап проектна документация и преди започване на всеки етап на строителство ще се уточняват изискванията на Възложителя към съответните материали и ще бъде изготвен списък за одобрение. Едва след потвърждение от Възложителя ще бъдат предприети доставките на материалите.
7	При получаване на материал, различен от заявения Изпълнителя уведомява Доставчика да изтегли сгрешената партида и да достави одобрения материал. В случай на забавяне на доставката изпълнителят ще предприеме мерки за доставка на количества от материала от друг Доставчик.
8	При констатиране на скит дефект се прави рекламация на доставения продукт, съставя се протокол и се връща на производителя / доставчика.
9	Преди започване изпълнението на Изпълнителят ще осигури добра координация в екипа си и своевременно ще информира и съгласува действията си с основните институции – на регионално и местно ниво.
10	Спазване на технологичните изисквания на проекта. Наредбата за противопожарна безопасност, изискванията за безопасност на труда при работа на различните видове строително монтажни работи в обекта
	МЕРКТИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА
1	Изпълнителят съставя чек лист с необходимите документи и срокове за набавянето или подписването им и подготвя съгласно Линейния график за изпълнение на проекта уведомителни писма – покани към заинтересованите страни да присъстват на съставянето и подписването на протоколите на Наредба № 3
2	Всички материали ще бъдат предварително одобрени от Възложителя, като при одобрението на Изпълнителят предоставя всички необходими сертификати, одобрения, технически спецификации, инструкции за полагане и др.
3	Складирането на материалите се извършва съгласно изискванията на производителя, инструкциите за съхранение и складиране, РПОИС и грижата на добрия търговец. Изпълнителят доставя материалите по график, така че те да бъдат влагани максимално бързо, за да се намали риска от погиване или повреда до минимум.
4	Няма да се допускат лица, които не са участници в строителния процес, освен контролни органи, които са се легитимирали по установения начин.
5	Техническият ръководител отговаря за съставяне и изпълнение на графика за

Подпис и печат:.....
/Иван Достумски/

49

	доставките. Графикът се спазва стриктно, като заявките са материалите се предават в срок, съобразен с реакцията на Доставчика.
6	Изпълнителят няма да допуска на обекта да се приеме, скадира и влага материал, който не е в Одобрения списъкът на материалите.
7	`Всяка партида определена за доставка на обекта, минава през количествен и качествен контрол от служителите на обекта, отговорни за снабдяването на обекта с материали.
8	Задължително за всички доставяни материали се прави входящ контрол.
9	Преди започване изпълнението на всеки етап от проекта. Изпълнителят ще осигури добра координация в екипа си и своевременно ще информира и съгласува действията си с основните институции – на регионално и местно ниво.
10	Превантивно запознаване на личния състав, отговарящ за изпълнението на Договора с проектантите и технологични изисквания на проекта, наредбата за противопожарна безопасност, изискванията за безопасност на труда при работа на различните видове строително – монтажни работи и други дейности в обекта
	МЕРКИ ЗЦА ПРЕДООЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА РИСКА
1	Всички протоколи по Наредба № 3 се изготвят паралелно с изпълнението на отделните етапи. Страните, които ще подписват тези протоколи ще бъдат своевременно уведомявани. Няма да се допуска преминаване към следващ етап, ако не са съставени протоколи по Наредба 3. При изпратена покана към някои от страните и неосигуряване на представител за подписване на Протокол или непредоставяне на мотиви за отказ от подписите на Протокола, ще бъдат предприети действия съгласно инструкциите на Възложителя, но в никакъв случай няма да се предприемат неоснователни действия за спиране на строителството, водещо до удължаване на сроковете по Договора
2	Спазване на инструкциите и указанията на Плана по качество и Строителната програма. В случай на доставяне на неподходящ материал, Изпълнителят ще предприеме всички мерки за премахването му от строителната площадка и/или, ако има вложен материал в изпълнение СМР – за неговото демонтиране и подмяна с подходящ и одобрен материал. Изпълнителят гарантира, че всички дейности, предприети по отстраняването на неподходящи материали няма да се отразят на качеството на изпълнението на СМР
3	Спазване на инструктциите и указанията на Плана по качество в Строителната програма. Складовите площи се оформят съгласно ПБЗ. Изпълнителят ще съхранява материалите съгласно предписанията на Производителя
4	Техническият ръководител ще следи за стриктното спазване на правилниците за безопасност, вътрешните правилници за осигуряване на реда и охраната на обекта. В случай на възникване на криминално събитие на обекта ще бъдат

Подпис и печат:.....
/Иван Достумеки/

	своевременно уведомени компетентните органи и ще им се окаже пълно съдействие.
5	При ненавременно заявяване на количества от Изпълнителя се предвижда да бъдат подсигурени доставки от повече от един доставчик, в случай, че основният доставчик не може да изпълни цялата заявка в срок. При невъзможност да се доставят всички заявени материали. Изпълнителят изготвя план за ежедневни доставки на ненавреме заявените материали, съобразен с нуждите на бригадите, изпълняващи СМР.
6	Материалите, които не са в списъка на одобрените материали ще бъдат отстранени от строителната площадка незабавно.
7	Не се допуска приемането на материали, неотговарящи на спецификата на заявката- При забавяне на доставката на материала Изпълнителят ще изготви план – график за доставките, съобразен с ежедневните нужди на бригадите, изпълняващи СМР.
8	Вземат се мерки съгласно Плана по качество в Строителната програма. При констатирано забавяне от графика за изпълнение Изпълнителят ще изготви план – график за доставките съобразен с ежедневните нужди на бригадите, изпълняващи СМР
9	Максимално бързо превключване на ел.захранването към собствен агрегат.
10	Превантивно разработване на План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно – възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофа на обекта съдържащ сформирани и обучени ръководители и групи за действие при настъпване на съответната технологична авария- Съгласуване на План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно – възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи на обекта с институциите и организациите отговарящи за действия при аварии на регионално и местно ниво.

4.1.3.Риск за закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта:

Предложеният от " СТИЛКОМПЛЕКС ООД " ООД, гр. Благоевград график за изпълнение на СМР е разработен въз основа на справки за необходимите работници и механизация.Благодарение на професионалния опит на нашите технически специалисти и на богатата история на фирмата, свързана с изпълнението на отговорни проекти към различни общини и институции в Република България, в разработения от нас график са предвидени всички възможни рискове при изпълнение на проекта и предложените от нас срокове са абсолютно реални и съобразени с нашите технически възможности, климатичните особености на района. Ние обезпечаваме обекта с кфалифицирана работна ръка и механизация, с което намаляваме риска от влияние на външен фактор до минимум.

КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА

Подпис и печат:.....
/Иван Достумски/

№	Риск	Вероат Ност	Тежест на вредата	Оценка на риска /НР/	Ниво степен на риска
1	Забавяне вследстнвие лоши метеорологични условия	2	1	2	Незн.
2	Забавяне вследствие забавяне на доставки на материали	2	1	2	Незн.
3	Забавяне вследствие на инцидент при трудова злополука	2	1	2	Незн.
4	Забава причинена от недобра координация в технологичните процеси	2	1	2	Незн.
5	Забава вследствие промяна на техническото ръководство на обекта	2	1	2	Незн.
6	Забавяне поради отказ на Възложителя да подпише документи за окончателно завършване на работите	2	1	2	Незн.
7	Забавяне, причинено от промяна в проекта	2	1	2	Незн.

Използвани входни данни

1	Наблюдение	Да
2	Комуникация с изпълнителя на дейността	Да
3	Изисквания на нормативни документи – изп.съгл.законводателството	Да
4	Анализ на календарния график за обекта	Да
5	Анализ на ситуацията при изпълнение на подобни проекти	Да
6	Анализ на ситуацията в сродни по дейност организации	да

МЕРКИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ПРИ ВЪЗНИКВАНЕТО НА РИСКА

1	Графикът за изпълнение на СМР се изготвя така че са предвидени евентуални лоши метерологично условия. При невъзможност за изпълнение на някои вид СМР отвън на открито, се предвижда мобилизиране на хората за изпълнение на работите от вътре в сградата, които не зависят от времето.
2	Преди започване на строителния етап задължения на Изпълнителя е да изготви и получи одобрение за избор на видовете материали, които ще бъдат вложени в обекта. Въз основа на този списък и правилата в Плана за качество се избира Доставчик, като Изпълнителят съставя график за доставките, където се

Подпис и печат:.....
/Иван Достумски/

	уточняват сроковете за доставка на материали, така че да не се създават предпоставки за закъснения и прекъсване на строителството.
3	Съгласно системата OHSAS 18001:2007 и политиката за качество се предприемат всички необходими дейности по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците. Провеждат се задължителните инструктажи на всички работници. Съгласно Оценката нариска на работното място за различните звенаработещи се предвиждат лични предпазни средства.
4	Изготвянето на подробна работна програма, както и на програма за управление на качеството ще гарантират избягването на този риск и намаляването до минимум на щетите при възникването му.
5	Изпълнителят изготвя организационна схема, където за всяка една длъжност се дефинират задълженията и отговорностите, както и необходимата квалификация.- В случай на промяна в техническото ръководство на обекта ще се спазва стриктно заложената организационна схема и изискванията към позицията. Разполагаме с достатъчно на брой висококвалифицирани и добре подготвени технически кадри, които в случай на необходимост да се включат в изпълнението на проекта.
6	Изпълнителя стриктно изпълнява дейностите описани в Строителната програма и Плана по качеството за обекта, предоставя документите, изисквани от Възложителя за един етап на плащане на изпълнени СМР. За всеки завършен етап се съставят Протоколи по Наредба № 3 и се провеждат проби изпитвания.
7	Необходимостта от промяна на проекта ще бъде обоснована с Доклад отИзпълнителя като ще бъдат описани причините за промяната, тяхната ефективност, количествен, стойностен и времеви анализ напромяната в проекта. За предприемане напромяна в проекта ще се изисква изричното одобрение на Възложителя.
	МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА
1	При планирането за изпълнение на строителните работи се залагат лощи метеорологични условия. През този период се допуска изпълнението на СМР, качеството на които не са повлиява от лошите метерологични условия / главно работи които се изпълняват от вътре на сградата, на закрито/
2	Всички големи доставки се изпълняват съгласно изготвен вътрешен график за доставки, където са посочени сроковете за заявка, срок за доставка и др. необходима информация. Поддържа се постоянен контакт с доставчика и се следи дали изпълнението на поръчката се движи съгласно заложените времеви рамки. Ние разполагаме с добра финансова история на участващите дружества, с което се намалява риска от забавяне на доставки, вследствие ненавремнни плащания към доставчици. забавяния на плащания към работници,различни такси, които също могат да се отразяват върху срока за изпълнение.

Подпис и печат:.....
/Иван Достумски/

3	Техническият ръководител и Отговорникът по ЗБУТ следят за изпълнението на предписанията на ПБЗ, вътрешните правила по качество,марките по ЗБТ, ИНСТРУКТАЖИТЕ, ПЛАНОВЕТЕ ЗА АВАРИИ, ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА ИЗПЪЛнение на СМР и за работа със строителни машини и др.
4	Изпълнителя следи стриктно за изпълнението правилната технологична последователност на процесите, спазването на инструкциите за монтаж на материалите от производителя, както и на инструкциите за изпълнение на СМР.
5	На служителите и работниците ни се създават условия за работа, отговарящи на тяхната квалификация и изисквания към заеманата позиция.
6	Изпълнителя поддържа непрекъсната комуникация с Възложителя и изпълнява всички предписания и препоръка на Възложителя, които са технически обосновани, няма да навредят на качеството и срока за изпълнение на видовете СМР и няма да доведат до противоречие с нормативните и законовите изисквания, както и не противоречат с инструкциите за ползване на материалите от Доставчика и Производителя, Изпълнителя ще изпълнява само писмено зададените предписания и препоръки. При неоснователен и необоснован отказ за приемане на обекта от Възложителя Изпълнителя незабавно ще уведоми за това Управляващия орган.
7	Преди започване на строителството Изпълнителя се запознава обстойно с изискванията на проекта, съгласуваността между отделните части и дали са спазени нормативните изисквания към момента на изпълнение на строителството. При необходимост от промяна в проекта Изпълнителя ще следи стриктно за комуникацията между екипите, разработващи отделните части, за необходимите данни и документи за проектирането.
	МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НАПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА РИСКА
1	В случай на забава по каквито и да е причини ще се приемане към двусменен режим на работа за работници и механизация и/или ще се подсигурят допълнителни групи работници и механизация. Из пълнителя ще изготви план – график за компенсиране на закъснението на Линейния график.
2	В случай на забавяне на доставки или невъзможност доставките да бъдат извършени в заявените количества, Изпълнителят осигурява необходимите количества материали от други доставчици, като за материалите не се допуска да бъдат подменяни с други, невключени в списъка с одобрените материали, без изричното съгласие на Възложителя. В случай когато е невъзможна доставката на материал от друг доставчик или подмяна на материал в списъка на одобрените, Изпълнителят съставя план – график за компенсиране на евентуално закъснение на доставка, или преработва Линейния график, като премества напред във времето за изпълнение етапи от проекта, за които няма проблем с доставките. Всички предприети мерки няма да окажат влияние

Подпис и печат:.....
/Иван Достумски/

	върху качеството на изпълняваните СМР.
3	Вземат се всички предписания в ПБЗ, инструкциите и Плана по качеството предварителни мерки за осигуряване на безопасност на работниците и служителите по време на работа. За да се намали времето за реакция при трудова злополука има приети вътрешни правила, описани в Плана по качество. Отговорникът по ЗБУТ и Техническия ръководител своевремно уведомявам Възложителя и компетентните органи.
4	В Линейния график на обекта се съобразява технологичната последователност за всеки вид СМР, като на тази база се изготвят графиците за работна ръка и механизация. В случай на забавяне Изпълнителят ще даде предписание за коригиране на технологичните процеси и ще изготви график за компенсиране на възникналото закъснение.
5	Ние разполагаме с достатъчно на брой квалифицирани специалисти, отговарящи на критериите на Възложителя и които в случай на необходимост ще бъдат включени в ръководния персонал на обекта.
6	Изпълнителят изготвя план за отстраняване на забележките на възложителя. В подготвения план Изпълнителят разпределя задълженията и отговорностите на екипа за подготовка и предаване на обекта, така че забележките да бъдат отстранени максимално бързо и да се подпишат документите.
7	За преодоляване на риска от закъснение, Изпълнителят ще състави план – график, където ще са описани и отразени мерките за компенсиране на закъснението чрез реорганизация на етапите за изпълнение и компенсиране на закъснението или чрез прехвърляне на задължения към други или включване на нови участъци в етапа на изпълнение

4.2.Рискове за забава на строителния процес поради липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес:

№	Риск	Вероат Ност	Тежест на вредата	Оценка на риска /HP/	Ниво степен на риска
1	Риск, свързан със задължението на Изпълнителя да уведомява Възложителя за всички дейности, които ще бъдат предприети по време на изпълнение на договора	2	1	2	Незн.
2	Риск, свързан със задължението на Възложителя да уведомява	2	1	2	Незн.

Подпис и печат.....
/Иван Достумски/

55

	Изпълнителя за промени или допълнения в указанията, техническите спецификации и договорното споразумение				
3	Риск, свързан със задължението на Възложителя дса спазва срокове за вземане на решения, одобряване на детайли, проектни решения, предложения, строителна програма, технически спецификации и др., касаещи работата на Изпълнителя	2	1	2	Незн.
4	Риск, свързан с уведомяването на заинтересованите страни за срещи, дати на ключови събития и изпитвания и др.	2	1	2	Незн.
5	Риск, свързан с мерките за информация и публичност	2	1	2	Незн.
6	Риск, свързан с достъп до информация	2	1	2	Незн.
7	Риск, свързан с набавяне на необходимата информация за реализиране на целите на договора	2	1	2	Незн.

Използвани входни данни

1	Наблюдения	Да
2	Комуникация с изпълнителя на дейността	Да
3	Изисквания на нормативни документи . изп.съгл. законодателство	да
4	Анализ на ситуацията при изпълнение на подобни проекти	Да
5	Анализ на ситуацията в сродни по дейност организации	да

МЕРКИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ПРИ ВЪЗНИКВАНЕТО НА РИСКА

1	Изпълнителят ще следи Възложителя или негов упълномощен представител да бъдат информирани периодично /_ сроковете се договарят с Възложителя/ с хода на изпълнението на дейностите по Договора, сроковете за изпълнение и приключване, както и провеждането на тестовете и изпитанията, в които ще е необходимо Възложителят да вземе участие
2	Изпълнителят ще следи за изпълнението на комуникационния план, като цялата кореспонденция ще бъде описана в дневник на кореспонденцията с входящи респ. изходящи номера. Изпълнителят ще следи за сроковете по всички запитвания към Възложителя и ще изпраща уведомителни писма до

Подпис и печат:.....
/Иван Дос[illegible]/

	Възложителя при неспазване на сроковете по тях.
3	Изпълнителят ще следи за кореспонденцията и при забавяне на отговор, решение или одобрение на Възложителя, ще изпрати уведомително писмо до Възложителя в какви срокове е допустимо да се забави решението без да се наруши продължителността, взаимообвързаността и последователността на дейностите по предложения Линеен график.
4	Изпълнителят ще изготви комуникационния план, съгласуван с Възложителя, където ще се дефинирани всички задължения отговорности на заинтересованите страни и кои страни се предвижда да вземат участие периодичните работни срещи и кои ще бъдат уведомявани за присъствие изрично При под посвинане на Договора ще бъдат уточнени параметрите на работните срещи с Възложителя.
5	Изпълнителя ще се придържа стриктно към мерките за информация и публичност, заложени в Договора и Техническите спецификации.
6	Изпълнителя ще предостави на Възложителя разработен комуникационен план, като част от него с изготвена схема за предоставяне и достъп до необходимата на Възложителя информация
7	Изпълнителят отговаря за набавяне на необходимата информация за реализация на целите на Договора, като за целта ще изготви план и график за координация и взаимодействие между страните, от които се получава необходимата информация
	МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА
1	Изпълнителят ще изготви комуникационния план с график по ключови събития, където ще бъдат изготвени образци за комуникация с Възложителя и/или негови представители като всяка входяща и изходяща кореспонденция ще бъде записана в дневник на кореспонденцията под съответния входящ или изходящ номер
2	Изпълнителят ще следи за цялата кореспонденция, касаеща проекта и при системно забавяне на решения ще уведоми Възложителя и ще продължи мерки за подобряване на комуникацията.
3	Изпълнителят ще състави и предостави на Възложителя график за предстоящи искания за одобрения, решение и тестове, които Възложителят трябва да даде или изпълни, включително сроковете за одобрения, така че в случай на необходимост Възложителят да успее да подсигури и организира, в рамките на предложения срок, необходимите му технически специалисти.
4	Изпълнителят ще изпрати до Възложителя график с ключовите събития, проби и изпитвания, както и уговорените работни срещи. Също ще изпраща уведомителни писма с потвърждение /промяна на параметрите на срещата.
5	Изпълнителят ще предостави за съгласуване с Възложителя всички мерки за информация и публичност, касаещи проекта, преди да бъдат предприети.

Подпис и печат:.....
/Иван Достумски/

57

6	Изпълнителят ще следи цялата изисквана по Договора информация да се изготвя и съхранява във вида, указан от Възложителя, като му осигурява по всяко време достъп до необходимата му документация, в обхват описан в Договора и без да се засягат други Договори с други Възложителя.
7	Изпълнителят ще следи за спазване на плана за координация и взаимодействие и приложения към него график, като недопуска просрочване на заложените срокове.
	МЕРКИ ЗА ПРЕОДОБЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА РИСКА
1	Изпълнителят ще направи промени в екипа, като делегира допълнителни права, преразпредели или пренасочи изпълнението на част от дейностите към други звена, така че да се спазят изискванията по Договора за информираност и се създадат условия за непрекъснат контрол и проверка на изпълнението на договорните дейности.
2	В случай на установяване, че Възложителят бави решения поради некоректно подадени данни от Изпълнителя, то той ще направи промени в екипа, като делегира допълнителни права, преразпредели или пренасочи изпълнението на част от дейностите към други звена, така че да се спазят изискванията нае Договора за информираност и се създадат условия за непрекъснат контрол и проверка на изпълнението на договорените дейности.
3	В случай на забавяне на решение, одобрение или друга информация, водеща до забавяне на изпълняваните дейности по Линейния график, Изпълнителят ще състави план за компенсиране на закъснението с прилагане на коригиран Линеен график за съответните дейности.
4	Изпълнителят ще следи по графика за ключови моменти, проби и изпитвания, за които съгласно Договора трябва да уведоми Възложителя, който да осигури свои упълномощени представители в уговорения в комуникационна план срок.
5	Изпълнителят ще изготви инструкции към ръководния екип, където ще бъдат описани всички специфични условия на мерките и задълженията на Изпълнителя по тази част.
6	Изпълнителят ще предостави стхема на въвеждане и архивиране на документацията, като предостави на Възложителя информация за наличните документи и очаквани или в процес на одобрените документи.
7	Изпълнителят ще предложи на Възложителя план за преодоляване на последствията, като обоснове предложените решения и предложи за съгласуване нова организационна схема и срокове за предоставяне на информация, така че да не се забавят дейностите по предложения Линеен график.

4.3.Рискове за забава на строителния процес от липса / недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на

Подпис и печат:.....
/Иван Достумски/

проекта, а именно: Предоставящият безвъзмездната финансова помощ Управавляващ орган на програмата,1 Бенефициентът по Програмата и Възложителят на договорите, Изпълнителите на отделните договори;

КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА

№	Риск	Вероат Ност	Тежест на вредата	Оценка на риска /HP/	Ниво степен на риска
1	Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между Изпълнителя и Възложителя	2	1	2	Незн.
2	Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между Изпълнителя и Управляващ орган на Програма	2	1	2	Незн.
3	Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между Възложителя и останалите участници в проекта.	2	1	2	Незн.

Използвани входни данни

1	Наблюдения	Да
2	Анализ на ситуацията при изпълнение на подобни проекти	Да
3	Анализ на ситуацията в сродни по дейност организации	да

МЕРКИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ПРИ ВЪЗНИКВАНЕТО НА РИСКА

1	Изпълнителят стриктно ще спазва описаните му в Договора задължения. За по-добра организация на работата и осигуряване на качеството се разработват за обекта Строителна програма – актуализирана от тръжната документация, и План за качеството, където са описани взаимоотношенията между Изпълнител – Възложител.
2	Изпълнителят стриктно ще спазва описаните му в Договора задължения. За по-добра организация на работата и осигурява не на качеството се разработват за обекта Строителна програма – актуализиранана от тръжната документация, и План за качеството, където са описани взаимоотношенията между Изпълнител – Възложител. Не се предвижда Изпълнителят да контактува с Управляващия орган, освен в случаите, когато Възложителят изрично го упълномощи за това.
3	Изпълнителят ще съдейства на Възложител при контакта му с други участници в строителния процес, като ясно и точно подготвя необходимите документи, които са в правомощията му и за които съгласно Договора трябва да поеме

Подпис и печат.....
/Иван Достумски/

59

	отговорност.
	МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НАРИСКА
1	Изпълнителят ще следи за добрата комуникация с възложителя кореспонденцията ще се води, съгласно одобрен образец, като всички предавани документи ще са придружени с приемно – предавателен протокол, за всяко писмо, което се изпраща / получава ще се поставя изходящ входящ номер. При провеждане на работни срещи ще се съставят протоколи за работната среща, които ще бъдат свеждани до знанието на всички участници.
2	Изпълнителят ще спазва стриктно инструкциите на Възложителя и възложените с Договора отговорности, като ще съдейства, съгласно правомощията си на Възложителя за всички възникнали въпроси от Управляващия орган, касаещи строителството на обекта.
3	Изпълнителят подготвя документите, поискани му отн Възложителя съгласно инструкциите и установените образци, като спазва поставените му срокове.
	МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА РИСКА
1	В случай на събитие ще се вземат мерки съгласно План за качеството и Строителната програма, така че да се избегне влиянието на събитието върху строителния процес. Изпълнителят ще изготви план за комуникация с Възложителя, където ще са описани задълженията на изпълнителя, отговорния екип, списък на дейностите и упълномощените лица да ги изпълняват както и методите за контрол.
2	В случай на събитие ще се вземат мерки съгласно План за качеството и Строителната програма, така че да се избегне влиянието на събитието върху строителния процес. Изпълнителят ще изготви план за комуникация и план – график за необходимите съгласувания.
3	В случай на събитие ще се вземат мерки съгласно План за качеството и Строителната програма, така че да се избегне влиянието на събитието върху строителния процес. Изпъ лнителят ще изготви план за комуникация.

4.4. Рискове от промени в законодателството на България или на ес ПРОМЕНИ В ИЗИСКВАНИЯТА НА ПРОГРАМАТА ВЪВ ВРЪЗКА С НАБЛЮДЕНИЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРА СКЛЮЧЕН С БЕНЕФИЦИЕНТА.

Карта за оценка на риска

№	Риск	Вероат Ност	Тежест на вредата	Оценка на риска	Ниво степен на риска

Подпис и печат:.....
/Иван Достумски/

				/HP/	
1	Промяна на ЗУТ	2	1	2	Незн.
2	Промяна в наредбите за проектиране	2	1	2	Незн.
3	Промяна в изискванията за приемане на строежите	2	1	2	Незн.
4	Промяна на икономическата обстановка в страната – срив на икономиката, хиперинфлация, рецесия и др.	2	1	2	Незн.

Използвани входни данни

1	Наблюдения	Да
5	Анализ на ситуацията при изпълнение на подобни проекти	Да
6	Анализ на ситуацията в сродни по дейност организации	да

МЕРКИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ПРИ ВЪЗНИКВАНЕТО НА РИСКА

1	Рискът от промяна в ЗУТ НЕ Е ГОЛЯМ, ПОРАДИ ФАКТНА, ЧЕ ЕДНА ЕВЕНТУАЛНА ПРОМЯНА ЩЕ КАСАЕ ОТДЕЛНИ ПАРАГРАФИ И АКО ЗАСЕГНЕ ПРОЕКТА, ТО НЯМА ДА СЕ НАЛАГА ПРОМЯНА, КОЯТО ЩЕ Ангажира големи финансови и техничмески ресурси. При изготвянето и реализирането на проекта Изпълнителят ще следи за всички промени, които ще засегнат изпълнението на проекта и ще следи за изпълнението на уточнените видове СМР, така че да отговарят на всички изисквания
2	Рискът от промяна в наредбите за проектиране е нищожен. За евентуални промени в наредбите има информация много време преди влизането им в сила. Приравняването с европейското законодателство дава сигурност, че евентуална промяна няма да е непозната и неочаквана.
3	Рискът от промяна в изискванията за приемане на строежите е незначителен, поради факта, че тези изисквания се синхронизират съгласно препоръките на Европейския съюз и евентуална промяна няма да е непозната и неочаквана. Когато тези изисквания са заложени на етап проектиране е гаранция, че няма да повлияят върху графика за изпълнение.
4	При промяна на икономическата обстановка в страната Изпълнителят ще предприеме мерки за избягване на последствията, така че договорените условия с Възложителя да останат непроменени.
	МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НАРИСКА
1	Всички бъдещи промени се проследяват от Изпълнителя, който изготвя план за нанасянето им, ако не са били отразени при съставянето на проекта
2	Всички бъдещи промени се проследяват от Изпълнителя, който изготвя план за

Подпис и печат:.....
/Иван Достумски/

61

	нанасянето им, ако не са били отразени при съставянето на проекта.
3	Всички бъдещи промени се проследяват от Изпълнителя, който изготвя план за промяна в инструкциите за съставяне на документацията за приемане и списъка от дейности, които трябва да се извършат от Изпълнителя преди подписване на документите за предаване на обекта
4	Предвижда се при одобрение на работния проект да се сключат договори с доставчици на услуги и материали, като така риска от промяна в цените да се разпредели равномерно между Изпълнител и Доставчик, и с което да се гарантира, че цените за Възложителя по време на срока на строителството на договора ще остане непроменен.
	МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА РИСКА
1	Изпълнителят изготвя план за нанасяне на промените, вследствие промяна на ЗУТ, като в случай на удължаване на срока за изпълнение на дадени СМР или при отлагане началото за изпълнението им се съставя план – график, с който се компенсира времето за закъснение. В случай на закъснение Изпълнителя преценява дали сроковете да бъдат компенсирани чрез замяна на реда на изпълнение на етапи, чрез прехвърляне наресурси между етапите или чрез подсигуряване на допълнителни ресурси.
2	Изпълнителят изготвя план за нанасяне на промените, вследствие промяна на наредбите за проектиране, като в случай на корекции в проекта, при които се получава изоставане от Линейния график при етапите за изпълнение, се съставя план – график, с който се компенсира времето за закъснение.- В случай на закъснение Изпълнителят преценява дали сроковете да бъдат компенсирани чрез замяна на реда на изпълнение на етапи, чрез прехвърляне на ресурси между етапите или чрез подсигуряване на допълнителни ресурси.
3	Изпълнителят изготвя план за промяна в инструкциите за съставяне на документацията за приемане в списъка от дейности, които трябва да еѐ извършат от Изпълнителя преди подписване на документите за предаване на обекта, като в случай на удължаване на срока за предаване на обекта се съставя план – график, с който се компенсира времето за закъснение. В случай на закъснение Изпълнителят преценява дали сроковете да бъдат компенсирани чрез замяна на реда на изпълнение на етапи, чрез прехвърляне на ресурси между етапите или чрез подсигуряване на допълнителни ресурси.
4	Изпълнителят и финансовия ръководител на Изпълнителя изготвят план за реакция, където се описват мерките за намаляване на влиянието на икономическата обстановка в страната.

4.5. Рискове от неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя

Подпис и печат:.....
/Иван Достумски/

62

КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА

№	Риск	Вероат Ност	Тежест на вредата	Оценка на риска /HP/	Ниво степен на риска
1	Риск от преустановяване или забавяне на работа следствие забава на плащания от Възложителя поради непълна документация, изисквана от Възложителя, за да се одобри плащане.	2	1	2	Незн.
2	Забавяне на плащане от Възложителя поради препоръка от упълномощен представител на Възложителя отговарящ за контрола на изпълнението и качеството	2	1	2	Незн.
3	Забавяне на плащания от Възложителя поради системно неизпълнение на Договора от Изпълнителя	2	1	2	Незн.
4	Забавяне на плащания от Възложителя при изрядна документация на Изпълнителя – одобрени надлежни доказателства за извършените работи и издадена данъчна фактура	2	1	2	Незн.
5	Риск от системни нарушения на договора от страна на Изпълнителя	2	1	2	Незн.
6	Риск от системни нарушения на договора от страна на Възложителя	2	1	2	Незн.

Използвани входни данни

1	Наблюдения	Да
2	Комуникация с изпълнителя на дейността	Да
3	Изасквания на нормативни документи – изп. съгл. Законодателство	Да
4	Анализ на ситуацията при изпълнение на подобни проекти	Да
5	Анализ на ситуацията в сродни по дейност организации	Да

МЕРКИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ПРИ ВЪЗНИКВАНЕТО НА РИСКА

1	Преди предоставянето на документите от списъка, изискван от Възложителя , Изпълнителя ще съгласува коректността на всички документи с упълномощените от Възложителя представители, отговарящи за контрола на

Подпис и печат:.....
/Иван Достумски/

63

	изпълнението и приемане на изпълнените СМР
2	Изпълнителят ще спазва стриктно изискванията на нормативната уредба, проекта, Строителната програма, одобрена от Възложителя, изискванията на Възложителя, съгласно Договора, забележките, които са зададени по установения ред.
3	Изпълнителят следи за стриктното спазване на условията по Договора и срочното изпълнение на дейностите съгласно Линейния график.
4	При изрядно съставени и одобрени документи за плащане. Изпълнителят е предвидил, че Възложителят има нужда от време за изпълнение на задълженията си по Договора. При забавяне на плащането с повече от допустимото време и без основа от Възложителя за причините на забавянето, Изпълнителят изпраща до Възложителя уведомително писмо, с което го подканва да изпълни задълженията си по Договора. Изпълнителят осигурява известен резерв от средства за работа при забава на плащанията.
5	Изпълнителят следи за стриктното спазване на условията по Договора и срочното изпълнение на дейностите съгласно Линейния график. Ще се контролират задълженията на ръководния екип и няма да се допускат нарушения.
6	Изпълнителят уведомява своевременно Възложителя, ако при системно неизпълнение на задълженията му по Договора се създават предпоставки Изпълнителят да не успее да изпълни задълженията си По договора в срок и съгласно изискванията.
	МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА
1	Изпълниотелят следи за конкретното събиране, съставяне и съгласуване с упълномощените лица на документите, изисквани от Възложителя като доказателство за качествено изпълнени и завършени СМР.
2	Изпълнителят ще спазва стриктно изискванията на нормативната уредба, проекта, Строителната програма, одобрена от Възложителя, изискванията на Възложителя, съгласно Договора, забележките, които са зададени по установения ред.
3	Изпълнителят изготвя месечни Доклади за напредъка и състоянието на обекта, съгласно работната програма и изискванията на вътрешния одит за изпълнение на качеството. В месечните Доклади се посочват проблеми при изпълвнението на проекта, закъснения от графика, причините за появата им, както и се дава предложение за преодоляването им.
4	Изпълнителят ще предостави идейна схема за очакваните плащания по проекта, съгласно предложения Линеен графикс, така че възложителят да може да планува разходите си и да осигури необходимото финансиране.
5	Изпълнителят издава инструкции към ръководния екип на Проекта, с които определя отговорностите и задълженията на членовете, съгласно изискванията

Подпис и печат:.....
/Иван Достумски/

64

	на Договора.
6	Изпълнителят комуникира и координира изпълнението на дейностите с Възложителя, уведомява го предварително за всички дейности, които ще бъдат предприети по изпълнението на Проекта. Документацията и кореспонденцията ще се изготвят по установени и одобрени образци.
	МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА РИСКА
1	Изпълнителя съставя план за работа и организационна схема на екипа, работещ по организацията, контрола на качеството и отчитането на обекта. Съгласно изискванията на Договора и на Възложителя се описват процедурите, които е необходимо да се изпълнят за да се предостави пълния набор документи, изискани от Възложителя за доказване на изпълнение на СМР
2	Изпълнителя следи за стриктното изпълнение на Проекта и описаните в Строителната програма и Плана по качество дейности. Когато има забележки по изпълнението на Проекта, Изпълнителя проверява съответствието им с нормативната уредба, дали са удовлетворени изискванията на Проектанта документация, коригира ли се Договорната цена и др., като изготвя становище за изпълнение / отказ от изпълнение на направените забележки, като решението на Изпълнителя ще бъде аргументирано и подкрепено с доказателствен материал.
3	Изпълнителя стриктно контролира процеса на изпълнението на Договора, Строителната програма и План по качеството. С изготвянето на месечните Доклади, Изпълнителя ще проследява и одитира изпълнението на дейностите по проекта, контролира отговорниците по частите и в случай на неизпълнение на изисквания по Договора, съставя план за реорганизация и преразпределяне на задълженията и отговорностите в ръководния екип, ако проблемът е организационен. При забавяне на изпълнението на Графика Изпълнителя съставя план за компенсиране на закъснението, като за целта изготвя анализ на причините – количествен и качествен, на базата на който се вземат мерки или увеличаване на изпълнителския персонал, реорганизация и преразпределение на задълженията на персонала, корекция в графика на доставките или осигуряване на допълнителна механизация.
4	Изпълнителя координира с Възложителя етапите на плащане, очакваните стойности и сроковете за изпълнение на плащанията. В случай на забавяне на плащане от страна на Възложителя, Изпълнителя съставя план за намаляване на последиците, като се вземат мерки за осигуряване на допълнително финансиране от друга източници за осигуряването на доставки и ресурси, заплащането на осигуровки, данъци и такси. В случай на голямо забавяне на плащане по Договора се вземат мерки за договаряне с Доставчиците за отложено плащане.
5	Изпълнителя стриктно контролира процеса на изпълнението на Договора,

Подпис и печат.....
/Иван Дочумски/

	Строителната програма и Плана по качеството Не се допуска системно неизпълнение на Договора. При неспазване на клаузи от Договора, Изпълнителя съставя план за реорганизация и преразпределяне на задълженията и отговорностите в ръководния екип на проекта, коригира инструктциите за изпълнение, така, че да се покрият всички изисквания на Договора.
6	Изпълнителя информира своевременно Възложителя за възникнали събития, при които Възложителят не е изпълнил задълженията си, описани в Договора, подготвя и изпраща уведомителни писма на Възложителя, с които го подканва да изпълни задълженията си в установения срок

4.6. Рискове в следствие на трудности при изпълнение на проекта, продиктувани от непълното и/или неточности в проектната документация

КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА

№	Риск	Вероат Ност	Тежест на вредата	Оценка на риска /HP/	Ниво степен на риска
1	Риск от възникване на допълнителни видове работи, незасегнати в разработването на проекта, но касаещи качеството на предвидените за изпълнение СМР	2	1	2	Незн.
2	Риск от забава поради липса на работни чептежи по всички части	2	1	2	Незн.
3	Непълнота и неточности на проектно сметната документация	2	1	2	Незн.
4	Технически риск по отношение пълна и подробна разработка на работни проекти- чертежи, детайли, експертни становища	2	1	2	Незн.

Използвани входни данни

1	Наблюдения	Да
2	Комуникация с изпълнителя на дейността	Да
3	Изисквания на нормативни документи – изп. съгл. Законодателството	Да
4	Анализ на ситуацията при изпълнение на подобни проекти	Да
5	Анализ на ситуацията в сродни по дейност организации	да

Подпис и печат:.....
/Иван Достумски/

МЕРКИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ПРИ ВЪЗНИКВАНЕТО НА РИСКА

1	Изпълнителят стриктно следи за изпълнението на предложения график, Строителна / Работна програма и Плана по качество. При възникваненадопълнителни работи се разработва допълнение към Строителната програма, където се изготвят инструкции за изпълнение, така че да не се повлияе на качеството на изпълняваните СМР
2	Необходимостта от липсващите работни проекти ще бъде обоснована от Изпълнителя. За набавяне на работни проекти ще се изисква изричното одобрение на Възложителя.
3	Изпълнителят има голям опит в изпълнението на подобни обекти и разполага с високо квалифицирани специалисти по всички части на проекта. За всеки проблем, съгласувано с Надзора ще предложи на Възложителя най-доброто решение, без да се нарушава графика за изпълнение на обекта
4	Фирмата разполага с достатъчно на брой квалифицирани строителни инженери, които при нужда са се включват с разработка на технически действия.
	МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА
1	Изпълнителя проследява изпълнението на дейностите по проекта чрез изготвянето на месечни Доклади и одити.
2	Преди започване на строителството Изпълнителя се запознава обстойно с проекта, проверява наличието на всички необходими работни проекти и съгласуваността между тях. При установяване липса на проект по някоя част Изпълнителя ще уведомиш своевременно Възложителя и ще следи за комуникацията между екипите, разработващи отделните части,за необходимите данни и документи за проектирането.
3	Навременна комуникация с Възложителя
4	Навременна комуникация с Възложителя
	МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА РИСКА
1	При възникване на допълнителни работи Изпълнителя изготвя План за работа и план-график за изпълнение на допълнителните СМР. Съобразява се с изпълнението им с вече изпълнени дейности по проекта и следи да не се наруши качеството на завършените видове СМР.
2	За преодоляване на риска от закъснение, Изпълнителя ще състави план – график, където ще саописани и отразенимерките за компенсиране на закъснението чрез реорганизация на етапите за изпълнение и компенсиране на закъснението или чрез- прехвърляне на задължения към други или включване на нови участъци в етапа на изпълнение.
3	Изпълнителят изготвя План за работа и план – график за изпълнение на видовете работи, които липсват в Проектната документация, като следи да не се

Подпис и печат:.....

/Иван Дюдумеки/

	наруши качеството на изпълнение на СМР. При неточности в Сметната документация на Проекта, Изпълнителят ще изготви Заменителни таблици за компенсация на липсващите видове и/или количества СМР с оставащи количества и/или видове такива.
4	Изпълнителят ще състави план – график за реорганизация на работите чрез изместване назад във времето на неразработените детайли и/или или чрез прехвърляне на задължения към други или включване на нови участъци в етапа на изпълнение

4.7. Рискове в следствие на трудности при изпълнение на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.

КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА

№	Риск	Вероат Ност	Тежест на вредата	Оценка на риска /НР/	Ниво степен на риска
1	Жалби срещу ПУП	2	1	2	Незн.
2	Жалби срещу разрешението за строеж	2	1	2	Незн
3	Жалби, касаещи избора на технология на изпълнение на СМР и СРРН	2	1	2	Незн.
4	Жалби срещу шума	2	1	2	Незн.
5	Жалби срещу замърсяване на околното пространство	2	1	2	Незн.
6	Жалби и/или недоволство срещу ограничаване на достъп на граждани до обекта, в които се изпълнява договора	2	1	2	Незн.

Използвани входни данни

1	Наблюдения	Да
2	Комуникация с изпълнителя на дейността	Да
3	Изисквания на нормативни документи – изп. съгл. Законодателството	Да
4	Анализ на ситуацията при изпълнение наподобни проекти	Да
5	Анализ на ситуацията в сродни по дейност организации	да

МЕРКИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ПРИ ВЪЗНИКВАНЕТО НА РИСКА

1	Жалбите срещу ПУП не засягат пряко Изпълнителя, но може да окажат влияние

Подпис и печат:.....
/Иван Постумски/

	върху спазването на срока по Договора. Изпълнителят ще съдейства на Възложителя, в рамките на правомощията си, за разрешаването на евентуални конфликти.
2	Изпълнителят ще съдейства на Възложителя , в рамките на правомощията си за разрешаването на евентуални конфликти
3	Изпълнителят коректно и изчерпателно ще опише своята технология в Актуализираната Строителна / работна програма и Плана по качеството. Избраната технология за изпълнение ще отговаря на изискванията на Възложителя и Техническите спецификации избраната технология на изпълнение съответства на изискваните качество на изпълнение на работите, безопасното им изпълнени експлоатация, мерки за опазване на околната среда.
4	Изпълнителят ще предприеме всички мерки срещу шума.
5	Изпълнителят ще предприеме всички мерки по опазване на околната среда от замърсяване с отпадъци и др.
6	Изпълнителят ще предприеме всички мерки по информиране на обществеността за продължителността на договора за строителство и ще спази всички срокове по този договор.
	МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА
1	Изпълнителят ще изиска от Възложителя всички данни за ПУП.
2	Изпълнителят ще съдейства на Възложителя в мерките за информация и публичност, за да се информира коректно населението за ползите от проекта.
3	Изпълнителят стриктно ще спазва разработените Строителна програма и План по качество
4	Изпълнителят стриктно ще спазва разработените Строителна програма и План по качеството.
5	Изпълнителят стриктно ще спазва разработените Строителна програма и План по качеството.
6	Изпълнителят стриктно ще спазва разработените Линеен график,Строителна програма и План по качеството.
	МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА РИСКА
1	Изпълнителят ще преработи Линейният график и Строителната си програма, така че при наличие на жалби срещу Пп, ИЗПЪЛНЕНИЕТО НАЗАСЕГНАТИТЕ УЧАСТЪЦИ ДА СЕ ОТЛОЖИ ВЪВ ВРЕМЕТО.
2.	Изпълнителят ще подготви техническа обосновка на проектното решение и ще съдейства на Възложителя за предоставяне на необходимата Документация, свързана с обжалването.
3	Изпълнителят ще изготви техническа обосновка на избраната технология, като към нея ще приложи качествен, количествен и времеви анализ, ще се приложи и сравнителен вариант с друг метод на технология за изпълнение

Подпис и печат.....

/Иван Достумски/

69

4	Изпълнителят ще изпълни всички предписания на ПБЗ, Строителната програма, мерките за опазване на околната среда, като се изградят предпазни ограждения, машините се поддържат в изправно състояние на работния процес се организира по такъв начин, че да се работи в светлата част на деня, като всички шумни процеси се изпълняват в часовите пояси, когато живущите са на работа/училище и се избягва да се работи с механизация в часовия интервал 14 – 16 часа.
5	Изпълнителят ще предприеме всички мерки по опазване на околното пространство от замърсяване. Ще се спазват стриктно предписанията на ПБЗ, Строителната програма, Плана за качеството, мерките за опазване на околната среда. Ще бъдат изградени ограждения, за да се предотврати разпространението на отпадъци. Транспортните средства и механизацията ще са технически изправни, поддръжката им ще се извършва на обособени за целта места, няма да се допуска изхвърляне в местата за битови отпадъци на отработено масло, стари акумулатори, използвани гуми и др. Камионите ще се покриват при транспортирането на земни маси, строителни отпадъци и инертни материали и др.
6	Изпълнителят ще предприеме всички мерки по информиране на обществеността за продължителността на договора за строителство и ще спази всички срокове по този договор.

4.8.Рискове в следствие на трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от констатирано технологично неправилно или некачествено изпълнение на дейност.

Рискове, свързани с качеството на изпълнението

Качеството на изпълнение видове СМР е от съществено значение за дълготрайната и безаварийна експлоатация на обекта.

КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА

№	Риск	Вероат Ност	Тежест на вредата	Оценка на риска /HP/	Ниво степен на риска
1	Некачествено изпълнени СМР, вследствие на недобре обучен или неквалифициран персонал	2	1	2	Незн.
2	Некачествено изпълнени СМР, вследствие на некачествени материали	2	1	2	Незн
3	Некачествено изпълнени СМР, вследствие на лоши метеорологични	2	1	2	Незн.

Подпис и печат:.....

/Иван Достумски/

	условия				
4	Некачествено изпълнени СМР, вследствие на лошо управление	2	1	2	Незн.
5	Некачествено изпълнени СМР, вследствие на недобре подбрана или грешна технология на изпълнение	2	1	2	Незн.
6	Рискове от пропуски при планиране на дейностите	2	1	2	Незн.
7	Нарушена комуникация между Изпълнителя и Възложителя	2	1	2	Незн.
8	Измерване и изпитване на създадения продукт	2	1	2	Незн.
9	Управление на документи	2	1	2	Незн.
10	Архивиране и съхранение на документи	2	1	2	Незн.

Използвани входни данни

1	Наблюдения	Да
2	Комуникация с изпълнителя на дейността	Да
3	Изисквания на нормативни документи – изп. съгл. Законодателството	Да
4	Анализ на ситуацията при изпълнение на подобни проекти	Да
5	Анализ на ситуацията в сродни по дейност организации	да

Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска

1	Съгласно въведената система по качество ISO 9001:2000 на обекта се назначават само работници и служители с уредени трудово правни взаимоотношения, квалифицирани да изпълняват съответния вид дейност. На работниците се провеждат всички задължителни инструктажи и подробно се запознават с инструкциите за изпълнение на видовете СМР
2	За избора на доставчици и материали, както и за приемането им на обекта, в системата за осигуряване на качеството има разработени процедури, с което се намалява риска от допускане на некачествени или повредени материали на обекта. Не се допуска работа с некачествени материали.
3	Техническия ръководител отбелязва в дневника на обекта метеорологичните условия, които оказват влияние върху качеството при изпълнение на СМР. Техническият ръководител позволява или прекратява изпълнението на СМР в зависимост от спецификата и изискванията на изпълнение на съответния вид работа.
4	Изпълнителя изготвя организационна схема на обекта с делегирани права на всеки участник в строителния процес.

Подпис и печат:.....
/Иван Достумски/

5	Изборът на всяка технология за изпълнение е подробно анализиран и обоснованна етапа на изготвяне на офертата. Изпълнителя контролира съответствието на изготвената Строителна програма и проектната документация, предвидените в Линейния график срокове, необходимите доставки и оборудване, механизация и човешкия ресурс.
6	Изпълнителят проследява всеки един етап от изпълнението на строителството. Проследява графика, срочното изпълнение на строителните работи и качеството на готовия продукт.
7	Цялата комуникация между Възложителя и Изпълнителя се води в писмена форма която се архивира съгласно системата за управление на качеството ISO 9001:2000
8	Изпълнителят и Възложителят или негов представител на място установяват качеството и количеството на изпълнените видове СМР
9	Всички необходими документи се изготвят в срок, в установения вид и последователност и се представят за одобрение.
10	Архивирането и съхранението на документи по обекта се извършва съгласно изискванията на Възложителя , Програмата и въведената система по качество ISO 9001:2000
	МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ ПРЕДОТВДРАТЯВАНЕ НАРИСКА
1	Не се допуска назначаване на работници и служители без трудов договор и без квалификация и правоспособност за изпълнение на съответните видове СМР.
2	Задължително се осъществява входящ контрол на всички доставени на обекта материали. Стриктно се следи всички влагани материали да отговарят на изискванията на българските и европейските стандарти за качество.
3	Не се допуска изпълнението на СМР при условия, които са недопустими съгласно инструкциите на производителя или правилата за изпълнение, и могат да доведат до нарушаване на качеството на готовите СМР или застрашават здравето и безопасността на работниците.
4	Съгласно въведената система за качество, разработен и утвърден План за качество, подробно са описани функциите и задълженията на ръководния персонал, както и начина на контрол на всеки един участник в строителството на проекта. Работниците и служители на Изпълнителя задължително са квалифицирани да изпълняват съответния вид СМР, имат нужните документи / паспорти/ сертификати / дипломи, които се изискват от техническия контрол на проекта. Стриктно се спазва йерархичната структура на обекта и изпълнението на всеки един вид СМР се проверява преди да бъде приет и предаден готовия продукт на Възложителя.
5	Изпълнителят изготвя сравнителен анализ и обосновка за избора на подходяща технология за изпълнение на вид СМР.
6	Изпълнителя изпълнява периодични одити на етапа на изпълнение, изготвя

Подпис и печат:.....
/Иван Довгумски/

	доклади с оценка на етапа и препоръки.
7	Преди започването на строителните работи Изпълнителят изготвя план с образци на документите, които ще бъдат създавани между Изпълнителя и Възложителя – бланки, които се предоставят за съгласуване и одобрение на Възложителя.
8	Изпълнителя осигурява условия за безпрепятствен достъп за точното измерване на всички необходими и изискани от Възложителя показатели.
9	Стриктно прилагане на системата за управление на документи
10	Стриктно прилагане на системата за архивиране на документи
	МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА РИСКА
1	Техническия ръководител и Отговорника по качество следят и контролират за изпълнението на политиката в качество и вътрешните инструкции за назначаване на работници.
2	Некачествени или повредени материали се отстраняват своевременно от обекта. Не се допуска приемане и складиране на обекта на некачествени или повредени материали. Прави се рекламация на съответните доставчици / производители.-
3	При възникване на събитие – силен вятър, проливен дъжд и др. по преценка на Техническия ръководител се предприемат мерки за довършване на започнати видове СМР, така че да бъдат приключени на етап, в който е възможно съхранение на целостта на продукти и осигуряване на достатъчно качество
4	Стриктно се спазва организационната схема на обекта. Изпълнителят периодично изпълнява контрол на проекта и изготвя инструкции или план за преодоляване на последиците.-
5	В случай на избрана неподходяща технология за изпълнение, Изпълнителят изготвя план за действие, където се анализира смяната на технологията, организацията на работата, ефекта върху графика и цената.
6	Изпълнителят изготвя план на действие като анализира начина на изпълнение на видовете работи и изготвя препоръки за корекции в начинана изпълнение.
7	При необходимост Изпълнителя изготвя и предоставя за одобрение от Възложителя нови бланки на документите по Договора, така че да удовлетворяват условията и изискванията на Възложителя.
8	Изпълнителят ще уведомява предварително Възложителя за намеренията си, така че Възложителят да има възможност да подсигури необходимите ресурси за точното и коректно установяване на количеството и качеството на приеманите СМР.
9	Въвежда се система за управление на документите по проекта, отговаряща на изискванията на Възложителя, Програмата и въведената система по качество ISO 9001:2000.
10	Въвежда се система за архивиране на документите по проекта, отговаряща на

Подпис и печат:.....
/Иван Костумски/

43

	изискванията на Възложителя, Програмата и въведената система по качеството ISO 9001:2000

4.9. Рискове свързани с безопасността на работното място

За безопасната работа по време на изпълнението на проекта в офертата на **"СТИЛКОМПЛЕКС" ООД, гр. Благоевград** е определено правоспособно техническо лице – координатор по безопасност и здраве / КБЗ/, който да следи за стриктното спазване на инструкциите за безопасност, изправността на помощните средства, малка механизация и за екипирането на работниците с лични предпазни средства / ЛПС/ и каски.

Задължително за всеки подобект се предвижда да бъде доставена и съхранявана на достъпно място аптечка за спешна медицинска помощ.

Предвижда се да се монтират табели и предупредителни знаци на опасните места, строителната площадка ще бъде оборудвана с пожарогасители, съгласно изискванията на плана за безопасност и здраве.

КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА

№	Риск	Вероат Ност	Тежест на вредата	Оценка на риска /HP/	Ниво степен на риска
1	Риск от удар от падащи предмети	2	1	2	Незн.
2	Риск от неправилно стъпване и удряне	2	1	2	Незн
3	Рис от поражения от електрически ток	2	1	2	Незн.
4	Риск от прегазване от строителна техника и механизация	2	1	2	Незн.
5	Риск от претоварване	2	1	2	Незн.
6	Риск при високи нива на шум, вибрации и др.	2	1	2	Незн.
7	Риск от убождане срязване / порязване	2	1	2	Незн.

Използвани входни данни

1	Наблюдения	Да
2	Комуникация с изпълнителя на дейността	Да
3	Изисквания на нормативни документи – изп. съгл. Законодателството	Да
4	Анализ на ситуацията при изпълнение на подобни проекти	Да
5	Анализ на ситуацията в сродни по дейност организации	да

Подпис и печат.....
/Иван Достумски/

Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска

От 1 До	Техническият ръководител и Отговорника по ЗБУТ следят за спазване на изискванията на ПБЗ, инструкциите за изпълнение на СМР, инструктажите на работниците и за носене на ЛПС
	МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА
1	Всички служители задължително са инструктирани за безопасна работа при изпълнение на съответния вид СМР. Местата с опасност от падащи предмети се сигнализират по надлежния ред, описан в ПБЗ
2	Всички служители задължително са инструктирани за безопасно работа при изпълнение на съответния вид СМР. Местата с опасност и повишено внимание при преминаване се сигнализират по надлежния ред, описан в ПБЗ.
3	Всички служители задължително са инструктирани за безопасна работа при изпълнение на съответния вид СМР. Местата с опасност и повишено внимание за високо напрежение и протичане на ел.ток се сигнализират по надлежния ред, описан в ПБЗ. При работа с ел. ток работниците задължително преминават инструктаж, оборудвани са с проверени и неповредени ЛПС – диелектрични ръкавици, обувки и др. Всички табла на обекта се предвижда да се заключват.
4	Спазват се инструкциите за работа със строителна механизация. Със строителна механизация ще работят само правоспособни лица. При движение на строителните машини или части от тях ще се подава звукова сигнализация. Не се допуска работниците, работещи в обхвата на строителната механизация да носят ЛПС за защита от шум – тапи за уши, антифони и др. освен в случаите на изпълнение на СМР, когато изрично не се изисква това.
5	Спазват се инструкциите за ръчно пренасяне на товари и за ръчно изпълнение на СМР, като се спазват допустимите натоварвания и почивките, регламентирани в инструкциите Не се допуска да извършват тежка физическа работа работници със заболявания с противопоказания – повдигане на тежки предмети. Работниците се оборудват с ЛПС, съгласно оценката на риска на работното място.
6	Използват се ЛПС за защита от шум. Спазват се стриктно инструкциите за изпълнение на СМР и изискванията на плана за безопасност и здраве. Всички служители задължително са инструктирани за безопасна работа при изпълнение нта съответния вид СМР.
7	Всички работници и ръководният персонал при влизане на територията на обекта ще са оборудвани с ЛПС. Всички служители задължително са инструктирани за безопасна работа при изпълнение на съответния вид СМР, стриктно се спазват разработените инструкции за изпълнение на СМР и предвидените мероприятия в ПБЗ.
	МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА

Подпис и печат:.....

/Иван Достумски/

	РИСКА
От 1 До 7	Всички работници са оборудвани с МПС, съгласно ПБЗ и разработената оценка на риска на работниците. Където се предвижда по проект се вземат мерки за колективна защита на работното място. На обекта задължително има оборудван медицински пункт за оказване на първа помощ. При необходимост се сигнализира на Бърза помощ и/или Гражданска защита. Изпълнителя уведомява Възложителя и компетентните органи при възникване на инцидент.

4.1.Рискове свързани с нарушение на екологичните норми

КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА

№	Риск	Вероят Ност	Тежест на вредата	Оценка на риска /HP/	Ниво степен на риска
1	Риск от замърсяване със строителни отпадъци при транспортиране	2	1	2	Незн.
2	Риск от разпространение на отпадъци генерирани от строителния процес	2	1	2	Незн
3	Риск от нарушаване на екоравновесието, вследствие използвана механизация	2	1	2	Незн.
4	Риск от замърсяване с отпадъци генерирани от строителния процес	2	1	2	Незн.
5	Риск от разлив на горива и масла	2	1	2	Незн.
6	Липса на санитарно -0 битови условия за персонала и ограничаване на въздействието на персонала върху околната среда	2	1	2	Незн.
7	Замърсяване на атмосферния въздух с прахови и газови емисии	2	1	2	Незн.
8	Риск от замърсяване на плочи	2	1	2	Незн.

Използвани входни данни

1	Наблюдения	Да
2	Комуникация с изпълнителя на дейността	Да
3	Изисквания на нормативни документи – изп. съгл. Законодателството	Да

Подпис и печат:.....

/Иван Достумски/

4	Анализ на ситуацията при изпълнение на подобни проекти	Да
5	Анализ на ситуацията в сродни по дейност организации	да

Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска

1	Получените вследствие на обекта строителни отпадъци задължително се извозват на обозначено за целта място
2	Получените вследствие изпълнение на обекта строителни отпадъци задължително се складират съгласно изискванията на ПБЗ, инструкциите за изпълнение на видовете СМР и се извозват на обозначено за целта място. Работниците, подложени на риск от излагане на замърсен с прах въздух над допустимите норми се екипират с подходящите ЛПС – маски и др.
3	При разработване на Строителната програма се избира максимално неинвазивна технология за изпълнение на СМР, като се цели както да се ограничат разходите за изпълнение и така да се намали до минимум ефекта върху околната среда.
4	До работа на обекта се допуска механизация, преминала технически преглед и управлявана от правоспособно лице. Всички оператори на строителна механизация на инструктирани за изпълнението на съответния вид СМР и за мерките, които се предприемат за ограничаване на влиянието върху околната среда.
5	До работа на обекта се допуска механизация, преминала технически преглед и управлявана от правоспособно лице. Всички оператори на строителна механизация на инструктирани за изпълнението на съответния вид СМР и за мерките, които се предприемат за ограничаване на влиянието върху околната среда.
6	За всеки подобект ще бъде осигурени временни санитарно – битови възли, като се обособи възел за ползване само на работниците. Мероприятията, които ще се предприемат ще са в съответствие с ПБЗ – план на строителната площадка.
7	До работа на обекта се допуска механизация, преминала технически преглед и управлявана от правоспособно лице. Всички оператори на строителна механизация са инструктирани за изпълнението на съответния вид СМР и за мерките, които се предприемат за ограничаване на влиянието върху околната среда.
8	За предотвратяване замърсяване на почвите се извършва контрол на строителната механизация и транспортните коли. Транспортните средства се измиват на определените за тази цел места.
	МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА
1	На обекта не се предвижда да се съхраняват дългосрочно складиране на излишни материали и строителни отпадъци.-Когато има риск от разнасяне на леки отпадъци от вятъра или разрешаване над допустимите норми се предвижда

Подпис и печат:.....
/Иван Достумски/

	покриване и затискане на складираните на обекта материали. Ремаркетата на камионите при пълен ход се предвижда да бъдат покривани с платнища, за да се избегне риска от разпрашаване и изпадане на превозваните отпадъци
2	На обекта не се предвижда да се съхраняват дългосрочно складиране на излишни материали и строителни отпадъци.-Когато има риск от разнасяне на леки отпадъци от вятъра или разрешаване над допустимите норми се предвижда покриване и затискане на складираните на обекта материали. Изхвърлянето на отпадъци се извършва само на местата предназначени за депониране на строителни отпадъци – обектови контейнери, които са обезопасени или обозначени на плана на строителната площадка места. Изпълнителят осигурява периодичното им извозване. При изпълнение на СМР, където е възможно замърсяване на околната среда с прах и леки строителни отпадъци се вземат мерки за ограничаване на ефекта, като се спазват стриктно указанията на Строителната програма в мерките за постигане на качеството и мерките за опазване на околната среда.
3	Отговорникът по качество и Техническият ръководител следят за спазването на мерките за опазване на околната среда и мерките за осигуряване на качеството от Строителната програма. Не се допуска отсичане на дървета без изричното разрешение на компетентните органи. Не се допуска изпълнение на СМР без да се вземат мерки за предотвратяване или намаляване на ефекта върху околната среда. Всички предприети мерки ще бъдат съобразени с местоположението на изпълнение на СМР – градска среда.
4	Отговорникът по качество и Техническият ръководител следят за спазването на Строителната програма и мерките за опазване на околната среда и осигуряване на качеството. Проверява се изправността на машините, обособяват се специални места за изхвърляне на отработеното масло и други опасни отпадъци, които се извозват на определените за това места.
5	Проверява се изправността на машините, обособяват се специални места за изхвърляне на отработеното масло и други опасни отпадъци, които се извозват определените за това места. На обекта не се допуска източване или подмяна горива и масла. Техническата поддръжка на механизацията се извършва само в оторизирани сервизи и от квалифициран персонал.
6	Координаторът по безопасност и здраве, Отговорникът по контрол на качеството и Техническият ръководител следят за стриктното спазване ПБЗ и разположението на временното захранване сток, вода, химическите тоалетни и обслужваните помещения – фургони за преобличане, за столова и др.
7	Отговорникът по качество и Техническият ръководител следят за спазването на Строителната програма и мерките за опазване на околната среда и осигуряване на качеството Към тези мерки спадат: оросяване на строителната площадка, измиване на гумите на механизацията при напускане на обекта, всички автомобили са снабдени с филтри за отработените газове, съгласно

Подпис и печат:.....
/Иван Достумски/

	нормативните изисквания.
8	Отговорникът по качество и Техническият ръководител следят за спазването на Строителната програма и мерките за опазване на околната среда и осигуряване на качеството. На обекта не се допуска неизправна механизация, ремонт и поддръжка на механизацията на необозначени за това места, източване и смяна на масло на необозначени за това места, складиране на масла и акумулатори на необозначени за това места, събиране и изхвърляне на опасни отпадъци с битовите отпадъци
	МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НАПОСЛЕДЦИТЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА РИСКА
1	Отговорникът по качество и Отговорникът по ЗБУТ изготвят и следят за спазването на план за складиране и извозване на строителни отпадъци и излишни земни маси, като в плана се описват мерките, които се предприемат за опазване на околната среда и здравето на работниците.
2	Вземат се мерки за ограничаване на замърсяване на околната среда от разпрашване и разпространение на леки отпадъци съгласно мерките за осигуряване на качеството и мерките за опазване на околната среда, описани в Строителната програма, Отговорникът по качество и Отговорникът по ЗБУТ изготвят следят за спазването на план за складиране и извозване на строителни отпадъци и излишни земни маси, като в плана се описват мерките ,които се предприемат за опазване на околната среда и здравето на работниците.
3	Задължително преди напускане на строителната площадка се предвижда гумите на строителната механизация да бъдат старателно почистени с водоструйка на места специално предвидени за изпълнението на подобен род дейности. При разрушителни работи на настилките се предприемат мерки за намаляване на разпрашаването.
4	Отговорникът по качество и Техническият ръководител следят за спазването на Строителната програма и мерките за опазване на околната среда и осигуряване на качеството. Вземат се мерки за ограничаване на замърсяване на околната среда вследствие на работата на строителната механизация, като за целта се подбира механизацията да отговаря на екологичните норми, да е добре поддържана, като поддръжката се осъществява на определени за целта места, като не се допуска разлив на масла, изхвърляне на отработено масло, използвани акумулатори и др. опасни отпадъци с битовите.
5	При разливи на масла и други опасни материали се предприемат действия по отстраняване на замърсените участъци, обезопасяване, когато е необходимо и извозване на обозначените места на получените отпадъци. Отговорникът по качеството и Техническият ръководител следят за спазването на мерките за опазване на околната среда и мерките за осигуряване на качеството.
6	Изпълнителят предприемат действия по осигуряване на санитарно – хигиенните изисквания за работниците при мероприятия по изграждане на временното

Подпис и печат:.....
/Иван Достумски/

79

	строителство на обекта, като се осигуряват подаване на ток и вода, поставят се химически тоалетни и обслужващи фургони, които периодично се почистват.
7	Отговорникът по качество и Техническият ръководител следят за спазването на Строителната програма и мерките за опазване на околната среда и осигуряване на качеството. Вземат се мерки за ограничаване на замърсяване на околната среда вследствие на работата на строителната механизация, като за целта се подбира механизацията да отговаря на екологичните норми, да е добре поддържана, и при изпълнение на СМР операторите на строителната механизация да спазват инструкциите за работа със съответния вид механизация и мерки за ограничаване на ефекта от изпълнение на СМР върху околната среда.
8	При разливи на масла и други опасни материали се предприемат действия по отстраняване на замърсените участъци, обезопасяване, когато е необходимо и извозване на обозначените места на получените отпадъци. Отговорникът по качеството и Техническият ръководител следят за спазването на мерките за опазване на околната среда и мерките за осигуряване на качеството, предвижда се да се вземат всички необходими мерки по възстановяване и рекултивация на засегнати площи.

5.МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Настоящият План за организация на мерките за опазване на околната среда съдържа мерки за намаляване на отрицателното влияние върху околната среда, които са отнесени към потенциалните въздействия изброени по-долу, и които ще бъдат приложени по време на изпълнението на проекта.

Ще бъде извършен един предварителен преглед, чрез който да се оцени първоначалното състояние и да се определят всички тези аспекти, които могат да бъдат контролирани и по този начин да се избегне и/или да се минимизира вредното въздействие върху околната среда. Възможни аспекти, които ще се вземат предвид, са:

-използване на суровини
-управление на отпадъци
-емисиите в атмосферня въздух е емисии на шум
-генериране на отпадни води
-замърсяване на почвата

Отрицателните въздействия върху околната среда по време на строителството могат да бъдат ефективно редуцирани посредством подобаващо планиране на строителните дейности, както следва:

-опасните отпадъци ще бъдат отделно събирани и ще бъдат изхвърляни в съответствие с изискванията на разпоредбата за контрол на опасните отпадъци.

-По време на горещия летен сезон ще се извършва навлажняване на помещенията, за да се сведе до минимум образуването на прах, който има неблагоприятно въздействие най-вече върху работниците в живущото в близост с

Подпис и печат:.....
/Иван Достумски/

обекта население. Тази мярка има своя ефективен принос към контрола върху замърсяването на въздуха.

-Санитарни отпадъци : такива отпадъци ще бъдат събирани в контейнери и ще бъдат транспортирани до градското сметище или същите ще бъдат добавяни към общата маса подлежаща на биологично разпадане.

-По време на строителните работи на обекта ще се използват временни химически тоалетни, които няма да замърсяват заобикалящата околна среда и намиращите се в близост водоизточници.

За опазването на околната среда и минизирането на вредните въздействия от строителния процес, се предвиждат следните мерки и процедури:

1.При започване на работите по подготовка на строителната площадка за строителство РИОСВ ЩЕ БЪДЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЕН. Ще се спазва стриктно действащото в Република България екологично законодателство и специфичните изисквания в областта на опазването на околната среда.-

2.Ръководният персонал на обекта ще доведе до знанието на изпълнителския персонал политиката на фирма **"СТИЛКОМПЛЕКС" ООД,** гр. Благоевградпо отношение Управлението на околната среда и дейностите по управление на отпадъците съобразно конкретните видове и обеми на СМР.

3.При извършване на строителните работи ще бъдат взети мерки и ще се проведат измервания за недопускане на надвишаване на гранично допустимите нива на шума от строителните или транспортните машини.

4.Ще се вземат необходимите мерки за недопускане на замърсяване на прилежащите към обекта терени с битови отпадъци, строителни отпадъци, генерирани по време на изпълненението на строително – монтажните работи.

5.Събирането, извозването и депонирането на отпадъците ще е съобразно Закона за управление на отпадъците / ЗОУ/ Д.В.-, брой 86 от 2003г. и разпоредбите на Кмета на Общината. За целта ще се представи писмено искане до Кмета на Общината за разрешаване извозването на отпадъците с уточнени:

-вид на отпадъците за целите на разделното им събиране;

.количества

-период от време за депониране

-местоположение на обекта

-лице за контакти от страна на Общината

-отговорно лице от страна на Строителя.

С получаване на разрешението ще бъдат уточнени:

-мястото за депониране – общинско сметище

-транспортен маршрут за извозване на отпадъците

-необходими такси и начини на плащане

-други изисквания по Наредбата на Общината.

6.Канализиране на дъждовните води и отвеждането им до естествените места за оттичане, дерета, реки и др.

Подпис и печат:.....

/Иван Достумски/

7.В строителството ще се влагат само качествени материали, незамърсени с химически вещества, които в последствие могат да замърсят околните земи.

8.Внимателно ще бъдат планирани транспортните графици,1 за да се намали до минимум неудобството, причинено от транспортирането на материалите.

9.Всички течни и твърди отпадъци / при отмиване на повърхността и отпадни води/, изхвърляни от обекта, ще бъдат събирани и отстранявани от обекта посредством подходящо проектирана временна дренажна система и съхранявани на място и по начин, който няма да предизвика нито замърсяване, нито вредни въздействия.

10.Ще бъдат взети необходимите мерки за предпазване от разливане на петрол и смазки, получени вследствие на загуби от изтичане, до достигане на дренажната система или която и да е водна площ чрез мярка за Предпазване на загуби вследствие на изтичане.

11.Материалите и отломките, транспортирани от строителните обекти, ще бъдат покривани, за да не се допусне запрашаване на околната среда.

12.Всички камиони, превозващи отпадни материали, ще бъдат покрити и натоварени с достатъчно свободно място в каросерията, за да се предотврати разсипването отзад или отстрани на камиона.

13.Събирането, транспортирането и депонирането на отпадъците ще се извършва при спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците / ЗУО/ и подзаконовата нормативна уредба, и специфичните изисквания на общината.

14.Битовите отпадъци ще се събират в специализирани съдове / чували и ще се предават на фирми, с които съответните общини са сключили договор за дейности с битови отпадъци.

15.Строителните отпадъци ще се транспортират в съответствие с чл;.18, ал.2 на ЗУа – ПО МАРШРУТ И ДО ИНСТАЛАЦИЯ СЪОРЪЖЕНИЕ, ПОСОЧЕНИ ОТ КМЕТА на общината.

16.Отпадъците ще се транспортират по начин, който не допуска изтичане или замърсяване на прилежащите терени.

17.Няма да се допуска изгаряне на отломки, растителност или строителни отпадъци, а същите ще бъдат изнасяни от обекта.

18.В съответствие с йерархията при управлението на отпадъците, ще бъдат предприети мерки за тяхното повторно използване или рециклиране. В тази връзка всички отпадъци, които могат да бъдат рециклирани, ще бъдат транспортирани по възможно най-икономичен начин с помощта на местни компании, които са в състояние да използват икономично отпадъчните материали на обекта.

19.Металните отпадъци ще се събират в контейнери и ще се предават, въз основа на договор, на фирма, която притежава лиценз по чл.12 от ЗУО за търговската дейност с отпадъци от черни и цветни метали.

20.Отпадъците и отпадъчния материал, които не могат да бъдат използвани повторно или рециклирани, ще бъдат транспортирани за окончателно обезвреждане,

Подпис и печат:.....

/Иван Дюрумски/

след получаване на разрешение от компетентния орган – съответната община /за битови и строителни отпадъци/, РИОСВ или МОСВ.

21.Ще бъдат осигурени и необходимите средства за транспортиране и обезвреждане на отпадъците, генерирани по време на строителството на обекта.

22.Зоните за съхраняване на отпадъци ще се поддържат и почистват редовно.

23.При наличие на отпадъци, които съгласно Наредба № 3 от 1 април 2004г., за класификация на отпадъците могат да бъдат класифицирани като опасни, ще бъдат предприети мерки за сключване на договор за предаването им на фирма, която притежава Разрешение по чл.37 от ЗУО за дейности със съответния вид отпадък.

24.Проектодоговорът за третиране на опасни отпадъци ще бъде представенна Инженера за одобрение, преди да започне извозването на тези отпадъци от обекта.

След завършване на строителните работи ще се възстанови предишното състояние на строителната площадка.

Намаляване на шумовото, въздушното и почвеното замърсяване.

Шумово замърсяване.

Преди започване на строителните работи ще се извършат следните дейности.

Ще се изисква удостоверение за извършен Технически Преглед на всички машини, които ще влязат в употреба и които ще бъдат използвани при изпълнение на строително – монтажни работи.

За работа ще се изберат възможно тай-тихи машини и инструменти и ще им се извърши ежедневна поддръжка.

Помощните машини, които са най-шумни, ще се шумоизолират посредством използването на заглушители при машините с вътрешно горене или със системи за въздушно налягането.

Първоначална проверка на нивата на емисиите чрез определяне вида машина за всяка работна дейност, както и на шумовото поле, което се създава при нормални условия на труд.

Ще се отхвърли всяко превозно средство, което е необичайно шумни или прекомерно замърсява околната среда. Ако се установи, че определена машина надвишава приемливите прагове, ще се предложи подмяната й с друга.

Транспортните схеми в населените места за извозване на отпадъците до депата се съгласуват с общината през различните зони, които минимално да пречат на населението, както и на пътниците и служителите, посредством ограничаване на работните часове и интензивността на движение.

Ще се избягва концентрацията на оборудване и строителни работи на едно място.

Оборудването, което е най-шумно, ще се ползва така, че да се спазва необходимият покой.

Подпис и печат.....
/Иван Достумски/

Предвид градския характер на работата и това, че няма да се прекъсва работния процес на служителите в административната сграда, и за да се намалят вредните въздействия от шума и вибрациите, работното време и условията на труд трябва да се съобразят с действащото законодателство, съгласно което най-шумните действия се извършват през деня.

Строителните работи, които поради свои недостатъци не могат да се извършат през деня, трябва да са изрично разрешени от Общината, която ще определи пределните стойности на емисиите, които ще да бъдат осъществени, в зависимост от конкретните обстоятелства.-

Въздушно замърсяване

Демонтажните работи ще се извършват поетапно.

Операциите, които произвеждат много прах, ще се спират при ветровити условия / 60 км.ч./

За да се избегнат неудобствата, които нарушания по време на ремонтните работи прах може да предизвика върху околната среда, ще се извършват редовни обливания на помещенията с вода.

Транспортни средства ще се движат покрити с платнище.

За контрол на емисиите ще се прилагат разпоредбите на Директива 98/69/СЕ и изменящите я актове.

Замърсяване на почвата

Ще се извърши обозначаване на точната работна площ съгласно чертежа, с цел да се сведе до минимум завземането на терени и увреждане на растителност. Районите на спомагателните съоръжения и пътищата за достъп също ще се обозначат, за да се ограничи движението на хора и оборудване в рамките на предвидената зона.

Планове за действие при течове: незабавно третиране с абсорбиращи вещества, избирателно отделяне, съхранява върху водонепропусклива настилка и предаване на замърсения материал за управление от оторизирани фирми.

Токсичните вещества ще се съхраняват в контейнери, гарантиращи защита на почвата

Предвидените мерки и процедури за опазване на околната среда при изпълнението на обекта са съобразно система за управление и конкретно – сертификация ISO 14001 за управление на околна среда, внедрена във фирма „СТИЛКОМПЛЕКС" ООД

6. ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Подпис и печат:.....

/Иван Достумски/

Строително – монтажните работи ще се извършват съгласно Интегрираната система за Управление внедрена във фирма „СТИЛКОМПЛЕКС ООД“, отговаряща на изискванията на международните стандарти ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004; OHSAS 18001 : 2007

Дейностите в различните етапи на строителството ще се изпълняват в съответствие с изискванията на нормативните актове и различните технически спецификации, технологичните изисквания залегнали в различните части на проекта и в съответствие с действащата нормативна уредба по проектиране, изпълнение и контрол на строежите в Република България.

Всички обстоятелства, свързани със строежа, се документират от представителите на страните по сключените договори / инвеститор, строител, лицето упражняващо строителен надзор и други/.

Видовете контрол, които ще се осъществяват съгласно Интегрираната Система за Управление внедрена във фирма СТИЛКОМПЛЕКС ООД по време на строителния процес са:

-Авторски надзор от проектанта

-Инвеститорски контрол от инвеститора или негов представител

-Независим строителен надзор от лицензирани или регистрирани по съответния ред юридически лица и еднолични търговци

-Контрол на доставчици от определено лице от екипа на строителя

-Текущ контрол по изпълнението на СМР от страна на строителя.

7.1. Контрол на несъответствия – от доставчици

7.1.1. На материалите, доставени на обекта ще се извършва входящ контрол, за да се предотврати складирането и/или пускането в употреба/влагането на несъответстващи продукти.-

7.1.2.За несъответстващите стоки съответното упълномощено лице, след съгласуване с изпълнителния директор, разпорежда едно от следните действия:

-Стоките се връщат на доставчика като рекламация

-Стоките се заприходяват в съответния склад за влагане в производството

-Стоките се заприходяват в съответния склад за влагане в производството с дообработка

-Стоките се бракуват.

7.2.Контрол на несъответствия, възникнали в процеса на строителството.

7.2.1.На определени етапи от процеса ще се извършват рутинни проверки, които ще осигурят своевременното откриване на несъответстващи действия / операции/ и когато е възможно, засегнатия процес ще се коригира от съответния ръководител без прекъсване на работата.

7.2.2. Несъответствия по време на процеса могат да възникнат вследствие на:

Подпис и печат:.....

/Иван Достумски/

-Доставен несъответстващ материал

-Неспазване изискванията на заявителя

-Грешки и неточности в документацията

-Неспазване на технологичната последователност

-Неспазване на технологичните режими при изпълнение на операциите

-Използване на неподходящо или не съответстващо оборудване в процеса на производството.

7.2.3.Несъответствията възникнали в процеса на строителство ще се документират от лицата, определени от нормативната уредба, като се спазват точно определените изисквания.

7.2.4.Контрол на несъответствия – от Възложителя.

Рекламации / оплаквания от Възложителя ще се разглеждат, решават и уреждат по ред, определен от нормативната уредба на Р.България.

7.3.Контрол на несъответствия при управление на околната среда.

Несъответствия, свързани с управление на околната среда се регистрират по реда, установен в Интегрираната система за управление.

В случай, че бъде установено възникване на ново не идентифицирано досега неблагоприятно въздействие, Комитетът по Управление на Околната среда прави оценка / преоценка на аспекта на околната среда и въз основа на получените резултати взема решение за коригиращи действия за ограничаване или преодоляване на неблагоприятното въздействие върху околната среда.

7.4.Контрол на несъответствия при управление на условията на труд.

7.4.1.Несъответствия, свързани с управление на условията на труд се регистрират по реда, установен в Интегрираната система за управление. Несъответствия / злополуки/ за които реда на действие е определен в нормативната уредба на Република България се документират по този установен ред. За всеки констатиран инцидент се извършва разследване от КУТ / ГУТ на базата, на което се предписват съответните действия.

7.4.2.В случай че бъде установено възникване на нова неидентифицирана досега опасност или промяна в съществуващи контроли, КУТ/ГУТ предприема нова оценка на риска на съответното работно място и въз основа на получените резултати взема решение за коригиращи действия за защита на персонала и за ограничаване или преодоляване на опасността.

Персоналът на фирма "СТИЛКОМПЛРКС" ООД, гр. Благоевград е инструктиран за политиката и целите по управление на дружеството и за неговите ангажименти в тази връзка. Всеки служител е преминал курс на обучение по ИСУ, КАТО СТЕПЕНТА НА ЗАПОЗНАВАНЕ С ДОКУМЕНТАЦИЯТА И ФОРМИТЕ Е РАЗЛИЧНА ЗА ВСЕКИ СЛУЖИТЕЛ И ЗАВИСИ От функциите и длъжността, която заема.

Подпис и печат:.....

/Иван Дюстумски/

По този начин чрез ИСУ във фирма " СТИЛКОМПЛРКС " ООД, гр. Благоевград е създадена необходимата организация за качествен подбор на персонала и осигуряване на качество при изпълнение на всички мероприятия свързани със съответния контрол по Безопасни условия на труд,1 Опазване на околната среда и ПИПСМР.

5.МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Ще се спазват всички законови изисквания във връзка с правилата за безопасност и здраве, хигиена и охрана на труда, в това число Наредба № 2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и всички действащи към момента на изпълнение изисквания като, но не само: извършване на оценка на риска, изработване и актуализиране на инструкции за безопасност и др.

Преди започване на изпълнението на обекта, задължително ще се извършат следните подготвителни мероприятия, които ще гарантират успешното изпълнение и безопасността работа по време на строителството.

-В района на строителната площадка ще се поставят информационни табели предупредителни знаци и ограждания, съгласно Ситуационния план

-Снабдяване с вода и ел.енергия ще става от съществуващи източници на сградата

-Ще се доставят и монтират фургони за работниците, които ще се ползват за съблекални и почивка – след предварително съгласуване на мястото им с Възложителя;

-Ще се осигурят за ползване химически тоалетни

.Ще се изградят открити и закрити временни складове за съхранение на строителни материали на място съгласувано с Възложителя

-Ще се определят места за поставяне и ще се доставят различни контейнери за събиране на видовете строителните отпадъци съгласувано с Възложителя, като се спазват разпоредбите на Закона за управление на отпадъците.

Задължителни мерки, които ще се вземат при изпълнението на обекта са:

-Ще се осигури противопожарно табло;

-Ще се осигури аптечка с необходимите материали за оказване на първа долекарска помощ;

-Опасните места на обекта ще се оградят и означат със знаци

-На строителната площадка няма да се допускат външни лица

-Всички работници ще бъдат снабдени с подходящи работни облекла и ЛПС в зависимост от вида на изпълняваната от тях дейност

Подпис и печат:.....
/Иван Достумски/

-Всички строителни машини, съоръжения, оборудване, инструменти и др. ще се поддържат в изправност и готовност за работа, като се спазват изискванията за безопасна експлоатация.

-Ще се картотекират и отчитат извършените прегледи, изпитвания, техническа поддръжка и ремонти на съоръженията и работното оборудване

-Ще са взети мерки за осигуряване на хигиена на труда и противопожарна безопасност съгласно законовите и нормативни изисквания

Ще се осигури на обекта предварително разработен план за предотвратяване и ликвидиране на аварии и пожари, включващ и защита от аварии при дейности с опасни химични вещества и препарати.

При използване на работно оборудване, лични предпазни средства, продукти и вещества ще се спазват указанията и/или инструкциите на производителя за безопасна експлоатация.

При производствено обучение или практика на ученици и/или студенти на работните места ще се определят отговорници за осигуряване на ЗБУТ от предприятието и учебното звено и ще се извършва необходимият инструктаж.

През периода на изпълнението на обекта ще се прилагат и спазват изискванията на нормативните актове, касаещи изброените по-.долу елементи, но не само:

5.1.Здравословни и безопасни условия на труд, включително:

-Оценка на риска и съответни превантивни мерки

-Работно място и работно оборудване

-Консултиране и информиране на работещите

-Лични предпазни средства

-Обучения и Инструктажи – първоначален, инструктаж на работното място, периодичен, ежедневен и извънреден инструктаж

-Експозиция на химични, физични и биологични агенти

-Физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести

-Санитарно хигиенни норми и изисквания

-Знаци и сигнали

5.2.Координаторът по безопасност и здраве на етапа на изпълнение на строежа ще изпълнява следните работи:

1. Координира, осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно ЗБУТ при

2.Вземане на технически и/или организационни решения за едновременно или последователно извършване на етапите и видовете СМР

3.Оценяване на необходимата продължителност за извършване на етапите и видовете СМР

Подпис и печат:.....

/Иван Достумски/

4.Координира контрола по правилното извършване на СМР

5.Координира осъществяването на изискванията на ЗБУТ и на плана за безопасност и здраве

6.Отговаря за изправността, обезопасяването и правилната експлоатация на строителните машини, механизми, инструменти и др.

7.Отговаря за подредеността и чистотата на стр.площадка, проходите, подходите и работните места

8.Отговаря за правилното складиране и съхраняване на строителните материали, заготовка и полуфабрикати.

9.Осигурява и поддържа в изправност противопожарното табло и пожарогасителите, преносима аптечка с медикаменти, превързочни материали и средство за първа помощ

10.Незабавно осигурява първа помощ на пострадали

11.Своевременно обезопасява опасните зони – ел.проводи, машини, отвори и др.

12.Предприема необходимите мерки за допускане на стр.площадка само на лицата, свързани с осъществяване на строителството.

13.Недопускане на лица без необходимата мед.годност, без необ.квалификация и без предварителен инструктаж по БХТПБ документирано съответен сертификат, да изпълняват СМР.

5.3.Преди започване на работа на строителната площадка и до завършването на строежа ще се извършва оценка на риска

1.Оценката на риска ще обхваща всички етапи на договореното строителство, избора на работно оборудване и всички параметри на работната среда.

2.Ако по време на извършването на СМР настъпят съществени изменения от първоначалните планове, оценката на риска ще се актуализира

3.При извършването на оценка на риска ще се правят измервания на параметрите на работните среда и ще се документират, съгласно съответните нормативни изисквания.

5.4.Ще се осигури:

1.Извършването на СМР в тех.последователност и срокове, определени в инв.проект и в плана за безопасност и здраве

2.Изработването и актуализирането на инструкции по безопасност и здраве съобразно конкретните условия на строит.-площадка по видове СМР

3.Правиленподбор при съставяне списъците на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по договора, по отношение на проф.квалиф. и тази по без.на труда и избере местоположението на раб.места при спазване на условията за безопасен и удобен достъп до тях и определянето на транспортните им пътища и/или транспортни зони.

Подпис и печат:.....
/Иван Достумски/

4.Необходимите предназн. средства и работно облекло и употребата им всъответствие с норм.уредба и в зависимост от оценката на съществуващите проф.рискове за всеки конкретен случай.

5.Ще се предостави на работниците и служителите необходимите лични предпазни средства и ще изказва задължителното им ползване по време на работа

6.Ще се предоставят временни предпазни средства, в необходимите количества и на други лица, намиращи се във връзка с изпълняваната работа на Строителната площадка.

7.Ще се осигурят и предпазни каски за външни лица, които посещават стр.площадка от страна на Възложителя / имащи това право и фигуриращи в предоставени поименни списъци/ и тези лица, които осъществяват съответен контрол/ по спазване на здравословни и безопасни условия на труд, технически или строителен надзор и др./

8.Инструктажа, обучението и проверката на знанията по ЗБУТ на наетите работници и инструктажа на всички лица посетили Строителната площадка.

9.Картотекирането и отчета на извършваните прегледи, изпитвания, техническа поддръжка и ремонти на съоръженията на работното оборудване и постоянния им контрол с оглед отстраняване на дефекти, които могат да се отразят на безопасността или здравето на работниците.

10.Необходимите санитарно- битови помещения съобразно санитарно – хигиенните изисквания и изискванията за пожарна и аварийна безопасност, през времетраенето на строителството и човешките ресурси.

11.Поддържането на ред и чистота на строителната площадка

12.Разделянето и организирането на складовите площи за различни материали, особено когато това се отнася за опасни материали и вещества

13.Изискванията за работа с различни материали

14.Изискванията за съхраняване и отстраняване използваните опасни материали

15.Събирането съхранението и транспортните отпадъци и отломки

16.Адаптирането на етапите

17.Съвместната работа между строителите и лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност

18.Взаимодействието с промишлените дейности на територията

19.По всяко време да може да бъде оказана първа помощ на пострадалите при трудова злополука, пожар, бедствие или авария.-

20.При необходимост ще се изработват и утвърждават вътрешни документи

21.Ще се предприемат съответни предпазни мерки за защита на работещите от рискове

22.Няма да се допуска наличието на работни места извън границите на строителната площадка, а когато това е наложително – ще се прави специален инструктаж по ЗБУт НА РАБОТЕЩИТЕ

Подпис и печат:.....
/Иван Достумски/

23.Ще се организира вътрешна система за проверка, контрол и оценка на състоянието на безопасността и здравето на работещите.

24.Писмено ще се определи в длъжн.характеристики задълженията на отговорните лица и работещите по отстраняване на рисковете в работния процес.

25.-Ще се предприемат допълнителни мерки за защита на работещите на открити работни места при неблагоприятни климатични условия.

26.Ще се определят отговорни лица за прилагане на мерки за оказване на първа помощ, за борба с бедствия, аварии и пожари и за евакуация, като броят на тези лица, тяхното обучение и предоставеното им оборудване ще бъдат адекватни на спец.опасности и/или големината на строежа.

5.-5.Съгласувано с органите на ДА „ Гражданска защита“ и Национална служба „ Пожарна и аварийна безопасност“ ще се организира разработването и утвърждаването на:

1.план за предотвратяване и ликвидиране на пожари

2.План за предотвратяване и ликвидиране на аварии

3-план за евакуация на работещите и на намиращите се на Строителната площадка

Плановете ще обхващат всички възможни случаи на пожари и и аварии и породилите ги причини и ще съдържат сигнала, известяващ „ аварийно положение“, ще определят поведението и задълженията на всеки работещ, като ще се поставят на видни и достъпни места.

Работата на стр.площадка ще се организира и извършва по реда, определен в ЗУТ И ПОДЗАКОНОВИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ.-

Опасните за движение участъци ще се заграждат или на границите им ще се поставят съответните знаци, а при ограничена или намалена видимост – и светлинни сигнали.((Ще се категоризира територията на строителната площадка за ПАБ и ще се означава със знаци и сигнали съгласно норм.изисквания, като на видни места на стр.площадка ще се поставят и табели със:

1.Телефонния номер на служба за ПАБ

2.адреса и телефонния номер на местната медицинска служба

3.адреса и телефонния номер на местната спасителна служба

Пожароопасните материали и леснозапалими течности ще се съхраняват на стр.площадка в помещения и складове, отговарящи на норм. Изисквания за ПАБ.

За създаване на организацията на ПАБ на Стр.площадка ще се разработи съгласува със съответната РС „ПАБ“ и утвърдят необходимите инструкции и заповеди-

Ще се оборудват необходимите временни противопожарни табла на Стр.пл.с подръчни уреди и съоръжения за пожарогасене, съобразно спецификата на стр.площадка.

Подпис и печат:.....

/Иван Достумски/

6.7.Ще бъдат взети следните мерки и правилата за предпазване от трудови злополуки

За да се избегнат злополуки, трябва да се спазват следните стъпки

-Инструктаж и стриктно извършване на предписаните дейности

-Използване напредпазни средства / каски, ръкавици, очила/

-Обучаване

-Координиране на действията между отделните звена

-Работата трябва да се съобразява и с атмосферните условия и да се прекрати при силен вятър и лоши метеорологични условия

За предпазване от трудова злополука се изисква:

-Силен вътрешнофирмен контрол за спазване на изискванията за безопасност на труда и опазване на здравето при работа

-Спазване на технологичните изисквания при извършване на отделни работни операции

-Правилна организация на работното място

-Създаване на благоприятни условия на труд

-Писмени инструкции и информация за безопасност на труда

-Обезопасяване наработното оборудване

-Трудова и технологична дисциплина

-Добра квалификация на работещите

-Постоянно внимание, съобразени действия без прояви на излишна самоувереност

-Използване на лични иколективни предпазни средс0ства

За да се предотвратят злополуки на работното място, Изпълнителят ще разработи и прилага ефективна система за управление на безопасността на труда и опазване на здравето при работа, която включва оценка на риска, управление на риска и процедури за контрол. Работещите трябва да спазват всички указания за безопасност на труда и да сигнализират при възможни рискови ситуации.

Неразделна част от настоящата строителна програма са следните приложения:

-Линеен график за изпълнение на поръчката

-Диаграма на работната ръка.

Дата:05.08.2016 г

Подпис и печат:

Подпис и печат:.....

/Иван Достумски/

ЛИНЕЕН ГРАФИК

ОБЕКТ	***„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – IV – ти етап, Обособена позиция № 48. Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. В, вх. Г и вх. Д, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Яне Сандански"***
ИЗПЪЛНИТЕЛ	***СТИЛКОМПЛЕКС ООД***
ВЪЗЛОЖИТЕЛ	***ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД***

№	СМР	Мярка	количество	Човекодни	Начало	Край	Бр. работници	Брой календарни дни
1.	***Дейности по конструктивно възстановяване /усилване/основен ремонт/***							
1	Възстановяване на металната рамка и хоризонталната геометрията на парапетните панели на терасите по	м	24	3.36	01.09.16	03.09.16	2	2
2	Ремонт с отстраняване на ръжда от видима армировка на панелите на жилищната сграда ***бл.№3 - вх.В; вх.Г и вх.Д.***	м	64	2.32	03.09.16	04.09.16	2	1
3	Обработване на фугите между стенните елементи и пукнатините в стълбищните клетки посредством циментова	м	128.00	5.44	04.09.16	06.09.16	3	2
4	Доизграждане парапетите на терасите до нормативната височина 1,05м	м	105	11.42	06.09.16	12.09.16	2	6
5	Полагане на антикорозионно покритие върху видимите заварачни връзки на балконските пана и елементи, към които са	м	185.00	6.71	01.09.16	04.09.16	2	3
6	Обработка на видимата армировка от долната страна на подовите панели на 1-ва плоча полагане на защитен грунд и	м²	65.00	2.32	04.09.16	05.09.16	2	1

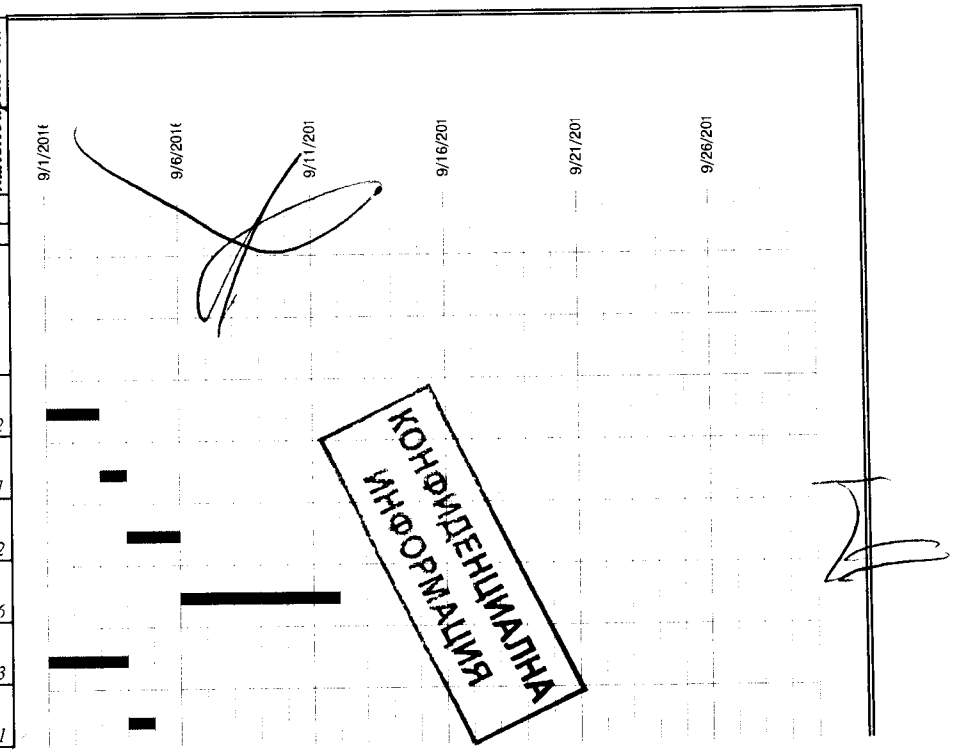

КОНФИДЕНЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Стилкомплекс Благоевград

7	Измазване на комините на покрива и изпълнение на шапки на комините тела на покривите на жилищната сграда бл.№3 -	м²	64.00	15.52	01.09.16	06.09.16	3	5
8	Затваряне с предпазна мрежа на вентилационните отвори на подпокривното пространство по корнизните панели;	бр	90.00	2.93	24.09.16	25.09.16	3	1
	ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА ВХОДОВЕТЕ							
1	Демонтиране на хидроизолация, изпълнение на ново отводняване и ремонт на бучарда по борда на козирките на входовете на	бр	18.00	2.27	22.09.16	23.09.16	2	1
2	Доставка и монтаж нова двуслойна хидроизолационна система от рулонна битумно-полимерна мембрана модифицирана с	м	12.00	0.32	23.09.16	24.09.16	1	1
3	Хидроизолация от два пласта воалит на газопламъчно залепване, горния с посипка	м²	18.00	2.50	25.09.16	26.09.16	2	1
4	Поли от поцинкована ламарина	м	21.00	3.02	26.09.16	27.09.16	3	1
5	Улуци от поцинкована ламарина	м	21.00	1.68	27.09.16	28.09.16	2	1
6	Демонтаж на подкожушена бучарда по борд на козирките	м	6.40	0.36	01.09.16	02.09.16	1	1
7	Доставка и монтаж на водооткапващ профил с мрежа	м	21.00	0.97	02.09.16	03.09.16	1	1
8	Очукване на стара мазилка и шпакловка в стълбищни клетки	м²	375.00	8.91	02.09.16	05.09.16	3	3
9	Изкърпване, подмяна и почистване на дефектирали участъци от вътрешната мазилка в общите части на сутеренте на	м²	287.00	13.99	02.09.16	08.09.16	2	6
10	Доставка и монтаж на метална стълба	бр	3.00	1.92	28.09.16	29.09.16	2	1
11	Остъргване на постна латексова боя по стени и тавани	м²	1,450.00	21.75	01.09.16	09.09.16	3	8
12	Шпакловане на стени и тавани по стълбищни клетки	м²	1,960.00	110.25	02.09.16	18.09.16	7	16
13	Ръбохранители за гипсова шпакловка	м	625.00	9.38	02.09.16	12.09.16	1	10
14	Освежаване чрез боядисване на стълбищните клетки-латекс	м²	1,450.00	58.00	08.09.16	24.09.16	4	16
15	Остъргване на блажна боя по цокъл, подготовка за боядисване	м²	510.00	8.93	06.09.16	14.09.16	1	8
16	Блажна боя по цокъл	м²	510.00	30.60	20.09.16	26.09.16	5	6
17	Остъргване на блажна боя по метални парапети и асансьорни врати с етажни табла	м²	148.00	2.59	26.09.16	27.09.16	3	1

18	Блажна боя по метални парапети и асансьорни врати с стажни табла	м²	148.00	8.88	27.09.16	29.09.16	4	2
19	Почистване на дървени ръкохватки и дъски на стълбищен парапет	м	265.00	3.31	24.09.16	27.09.16	1	3
20	Грундиране, лакиране на ръкохватка на парапет	м	265.00	15.90	25.09.16	28.09.16	5	3
21	Ремонт на стъпала от монолитна мозайка към сутуерена на всички входове	м²	24.00	9.33	23.09.16	26.09.16	3	3
22	Подмяна на водосточните тръби от поцинкована ламарина, отводняващи покривите над асансьорните шахти	м	24.00	3.57	26.09.16	28.09.16	2	2
23	Почистване и боядисване с блажна боя по метални капаци на машинни помещения, метални стълби за качване на покрива	м²	32.00	1.92	25.09.16	26.09.16	2	1
	Мълниезащитна и заземителна инсталация							
1	Мълниезащита от мълниеприемник с изпреварващо действие	бр	3.00	2.42	26.09.16	27.09.16	2	1
2	Направа на отводи от екструдиран алуминиев проводник Ф8мм, вкл. опорни блокчета	м	300.00	6.75	02.09.16	04.09.16	3	2
3	Заземителна инсталация с поцинковани колове	бр	6.00	2.10	04.09.16	05.09.16	2	1
4	Направа на контролен съединител в кутия	бр	6.00	1.42	05.09.16	06.09.16	1	1
5	Направа на заземление на Г. Е. Т. До 10 ома	бр	6.00	2.33	06.09.16	07.09.16	2	1
6	Полагане на поцинкована шина 40 4мм. в изкоп	м	12.00	1.37	07.09.16	08.09.16	1	1
7	Лабораторно изпитване на заземления	бр	6.00	3.84	27.09.16	29.09.16	2	2
	СТЪЛБИЩНО ОСВЕТЛЕНИЕ-МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ							
1	Демонаж на съществуващи осветители с неръждаема жичка	бр	32.00	1.64	01.09.16	02.09.16	2	1
2	Цялостна подмяна на електроинсталациите в общите части в сградата, съобразена с „Наредба № 3 от 09.07.2004г. за	бр	3.00	18.00	02.09.16	11.09.16	2	9
3	Доставка и монтаж на осветително тяло -плафониера с вграден фотодатчик за движение и светлина	бр	32.00	2.84	21.09.16	22.09.16	3	1
4	Инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на сградата	бр	3.00	2.58	22.09.16	23.09.16	3	1
5	Комплектоване на осветително тяло с енергоспестяваща лампа LED-7W, E-27	бр	32.00	1.880	22.09.16	23.09.16	2	1

	ТОПЛОИЗОЛИРАНЕ НА ВЪНШНИТЕ СТЕНИ НА СГРАДАТА							
1	Доставка и монтаж и демонтаж на тръбно скеле	м²	3,400.00	89.25	01.09.16	12.09.16	8	11
2	Демонтаж и монтаж на климатици и външни тела	бр	64.00	3.84	03.09.16	05.09.16	2	2
3	Изкърпване с вароциментова мазилка по фасади, парапети и дъна на тераси, вкл. подготовка на основата	м²	105.00	6.30	04.09.16	07.09.16	2	3
4	Измиване и полагане на дълбокопроникващ грунд преди полагане ан топлоизолация	м²	3,338.00	50.07	03.09.16	16.09.16	4	13
5	Доставка и монтаж на топлоизолационна система от експандиран пенополистирол d 10 см. и с коефициент на топлопроводимост λ 0.035w тк в т.ч. лепило и дюбели,	м²	2,858.00	525.16	04.09.16	25.09.16	25	21
6	Полагане на топлоизолационни плочи от EPS5 см. В т.ч. лепило и дюбели, стъклотекстилна мрежа и шпакловка-парапети на	м²	235.00	43.18	06.09.16	21.09.16	3	15
7	Обръщане около прозорци с топлоизолация от EPS 2см. и шпакловка кс мрежа ширина до 20см.	м	1,860.00	48.83	12.09.16	26.09.16	3	14
8	Полагане на топлоизолация от каменна вата 10см. С пл. 100кг м³	м²	138.15	25.39	05.09.16	16.09.16	2	11
9	Очукване на мазилка в зоните на връзка на нова със стара топлоизолация	м	384.00	6.72	06.09.16	12.09.16	1	6
10	Измиване и грундиране по съществуващи топлоизолирани стени	м²	235.00	14.10	07.09.16	13.09.16	2	6
11	Стъклотекстилна мрежа, шпакловка по съществуващи топлоизолиране стени	м²	235.00	14.98	08.09.16	14.09.16	2	6
12	Силикатна структурна мазилка по съществуващи топлоизолиране стени	м²	235.00	14.98	14.09.16	21.09.16	2	7
13	Силикатна структурна мазилка по стени и около прозорци	м²	3,338.00	212.80	08.09.16	27.09.16	11	19
14	Доставка и монтаж на ъглов профил с мрежа	м	1,840.00	9.20	05.09.16	14.09.16	1	9
15	Доставка и монтаж на водооткапващ профил с мрежа	м	148.00	0.74	06.09.16	07.09.16	1	1
16	Полагане на топлоизолационни плочи от XPS 10 см. В т.ч. лепило и дюбели, стъклотекстилна мрежа мрежа и шпакловка-	м²	245.00	45.02	18.09.16	25.09.16	6	7
17	Обръщане около прозорците на сутерена с XPS 2см. в. т.ч. грундиране, мрежа и шпакловка	м	152	3.99	18.09.16	22.09.16	1	4
18	Мозаечна минерална мазилка по цокли	м²	245.00	15.62	21.09.16	26.09.16	3	5
19	Доставка и направа на зидария от газобетон 10см при тераси	м²	296.00	78.07	09.09.16	24.09.16	5	15

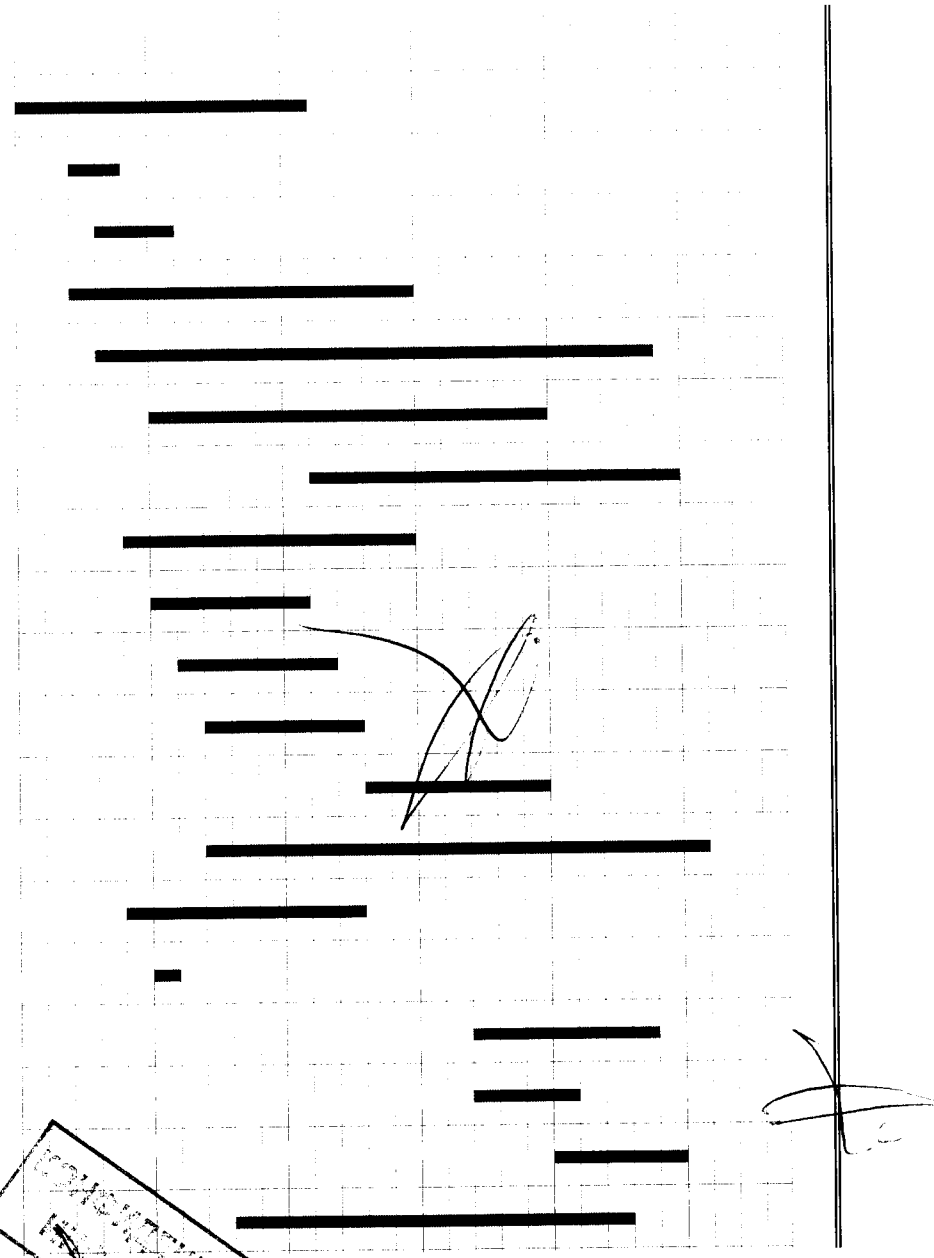

20	Доставка и монтаж на естествен камък за оформяне на шапка на неостъклени лоджии	м	84.00	11.76	21.09.16	24.09.16	4	3
21	Измазване и бояджисване от вътрешната страна на балкони и лоджии	м²	296.00	31.82	24.09.16	29.09.16	6	5
22	Доставка и монтаж на козирка от термопанел	м²	105.00	56.70	12.09.16	27.09.16	4	15
23	Доставка и монтаж на метален парапет за достигане на височина 105см	м	68.00	15.39	24.09.16	27.09.16	5	3
	ТОПЛОИЗОЛИРАНЕ НА ПОДОВЕ							
1	Полагане на дълбокопроникващ грунд - таван на сутерен	м²	632.00	9.48	07.09.16	12.09.16	2	5
2	Полагане на топлоизолационни плочи EPS5см (, в т.ч. лепило, дюбелиране, мрежа и шпакловка-таван сутерен	м²	724.00	133.04	04.09.16	26.09.16	6	22
3	Полагане на топлоизолационни плочи от EPS 12см., в т.ч. лепило, дюбели, мрежа, шпакловка по еркери	м²	92.00	16.91	10.09.16	18.09.16	2	8
4	Силикатна структурна мазилка по еркери	м²	92.00	5.87	12.09.16	13.09.16	6	1
	ТОПЛОИЗОЛИРАНЕ НА ПОКРИВА НА СГРАДАТА			-				
1	Полагане на минерална вата 12см вкл. пароизолация в междинно покривно пространство	м²	645.00	132.23	03.09.16	26.09.16	6	23
2	Полагане на EPS 12см.над машинно, вкл. грундиране, армирана замазка и пароизолация	м²	96.00	17.64	07.09.16	10.09.16	6	3
	Армирана циментова замазка 5 см върху топлоизолация	м²	96.00	21.72	10.09.16	20.09.16	2	10
3	Демонтаж на обшивка от ламарина по бордове.	м	185.00	10.87	04.09.16	09.09.16	2	5
4	Демонтаж на същ. покривни воронки, вкл. почистване и оформяне на отворите	бр	12.00	0.23	05.09.16	06.09.16	1	1
5	Демонтаж на съществуваща хидроизолация по покрива, вкл. демонтаж на тех. съоръжения на покрива, сваляне на отпадъци	м²	712.00	18.69	01.09.16	05.09.16	5	4
6	Очукване на съществуваща компрометирана циментова замазка , сваляне на отпадъци	м²	184.00	9.43	02.09.16	07.09.16	2	5
7	Изкърпване на очуканата циментова замазка	м²	184.00	22.31	04.09.16	09.09.16	4	5
8	Ремонт на холкери при бордове, машинни помещения, отдушници и комини	м	112.00	5.74	05.09.16	08.09.16	2	3
9	Доставка и монтаж на хидроизолация , включително обръщане около асансьорни шахти, по бордове, комини и отдушници	м	712.00	126.38	07.09.16	27.09.16	6	20

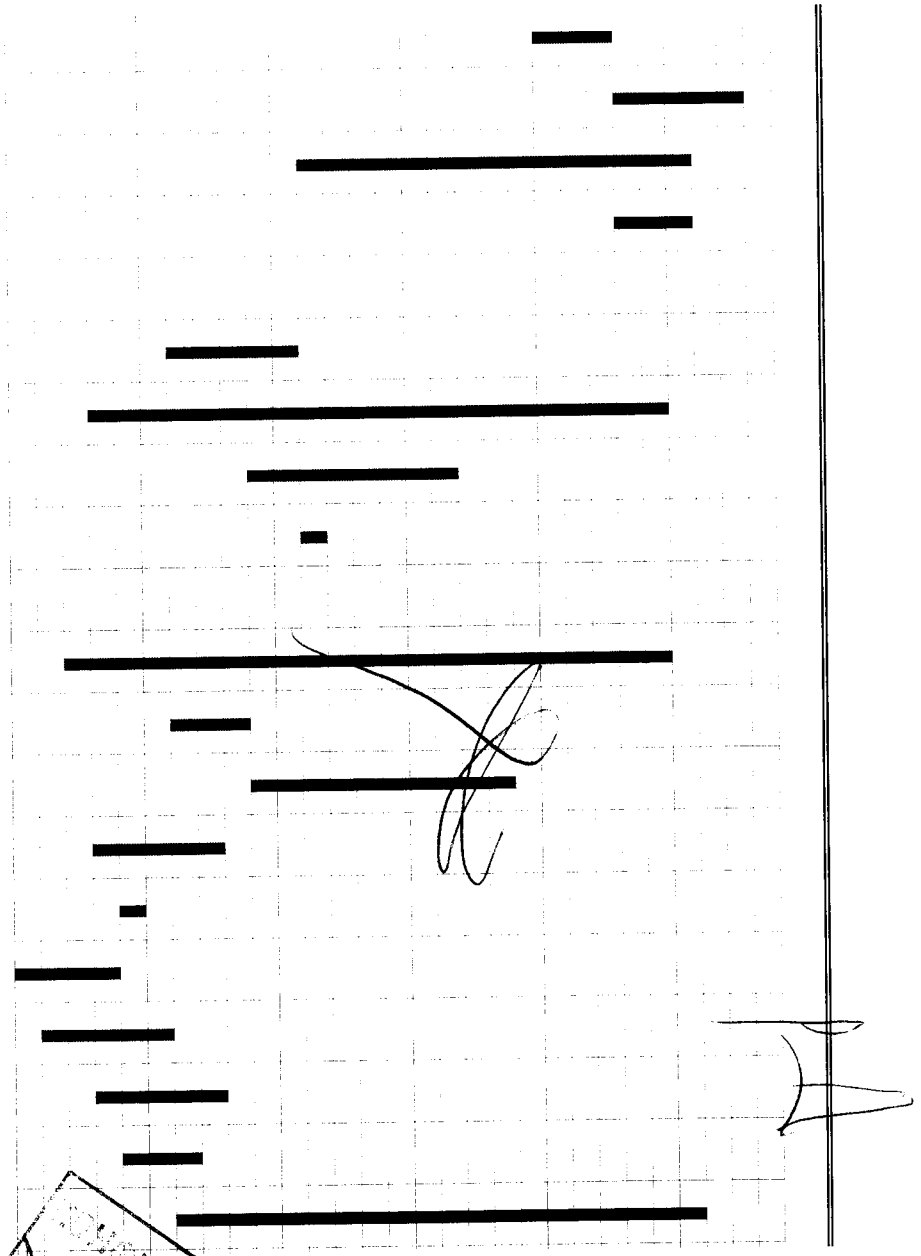

10	Доставка и монтаж на покривни воронки	бр	12.00	2.81	08.09.16	09.09.16	3	1
11	Обзиждане на комини тела, измазване с варо-циментова мазилка и направа на нова защитна шапка	бр	26.00	3.71	02.09.16	04.09.16	2	2
12	Направа на нов борд на машинни помещения (вкл. и обшивка от ламарина)	м	44.00	5.61	20.09.16	25.09.16	1	5
13	Направа на обшивка от ламарина по бордове	м²	138.00	17.60	23.09.16	29.09.16	3	6
14	Направа на обшивка от ламарина около машините помещения	м²	36.40	5.23	27.09.16	28.09.16	5	1
16	Доставка и монтаж на олук за машинни помещения	м	14.40	1.84	28.09.16	29.09.16	2	1
17	Защитни решетки на отвори за вентилиране на междинно покривно пространство	бр	90.00	2.70	27.09.16	28.09.16	3	1
	ПОДМЯНА НА ДОГРАМАТА НА СГРАДАТА			-				
1	Демонтаж на стара дървена дограма и метални остъклени тераси	м²	478.00	18.52	01.09.16	07.09.16	3	6
2	Доставка и монтаж на ПВЦ дограма	м²	455.50	64.91	05.09.16	18.09.16	5	13
3	Доставка и монтаж на алуминиева дограма с прекъснат термомост за входни врати	м²	22.50	5.09	18.09.16	19.09.16	5	1
4	Доставка и монтаж на автомат за външна врата	бр	3.00	0.53	16.09.16	17.09.16	1	1
5	Доставка и монтаж на метални капаци за сутерен	бр	62.00	16.59	19.09.16	26.09.16	2	7
6	Доставка и монтаж на пожароустойчива врата към сутерен с EI90	бр.	3	0.80	20.09.16	21.09.16	1	1
7	Доставка и монтаж на метален капак с топлоизолация към машинно помещение	бр.	3	0.80	16.09.16	17.09.16	1	1
8	Защитно покриване на прозорци и врати при изпълнение на фасадни мазилки	м²	826.00	16.52	19.09.16	25.09.16	3	6
9	Обръщане около прозорци с гипсова шпакловка вкл. ръбохранители отвътре	м	1,150.00	63.25	07.09.16	25.09.16	4	18
10	Боядисване с латекс в зоните на новата шпакловка	м²	565.00	31.78	15.09.16	26.09.16	3	11
11	Монтаж на подпрозоречни первази от алуминий на съществуваща дограма	м	365.00	8.67	22.09.16	25.09.16	3	3
12	Монтаж на подпрозоречни первази от ПВЦ с ширина до 20 см.- вътрешни	м	520.00	10.40	16.09.16	26.09.16	1	10

13	*Монтаж на подпрозоречни первази от алуминий*	*м*	*520.00*	*12.35*	*25.09.16*	*28.09.16*	*4*	*3*
	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ-ПБЗ							
1	*Сухотръбия с диаметър Ø2" с изводи със спирателни кранове и съединители тип „щорц", разположени в непосредствена*	*м*	*72*	*15.21*	*19.09.16*	*25.09.16*	*3*	*6*
2	*Изолация на откритите водопроводи в сутерена*	*м*	*63*	*6.46*	*25.09.16*	*29.09.16*	*2*	*4*
				2583				

Забележка:
Началната дата в графика е приета условно. За начало да се смята датата на подписване на протоколите за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво

Управител: Иван Дочумски

на ОБЕКТ	***„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – IV – ти етап,*** ***Обособена позиция № 48. Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. В, вх. Г и вх. Д, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Яне Сандански"***

ВЪЗЛОЖИТЕЛ	***ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД***

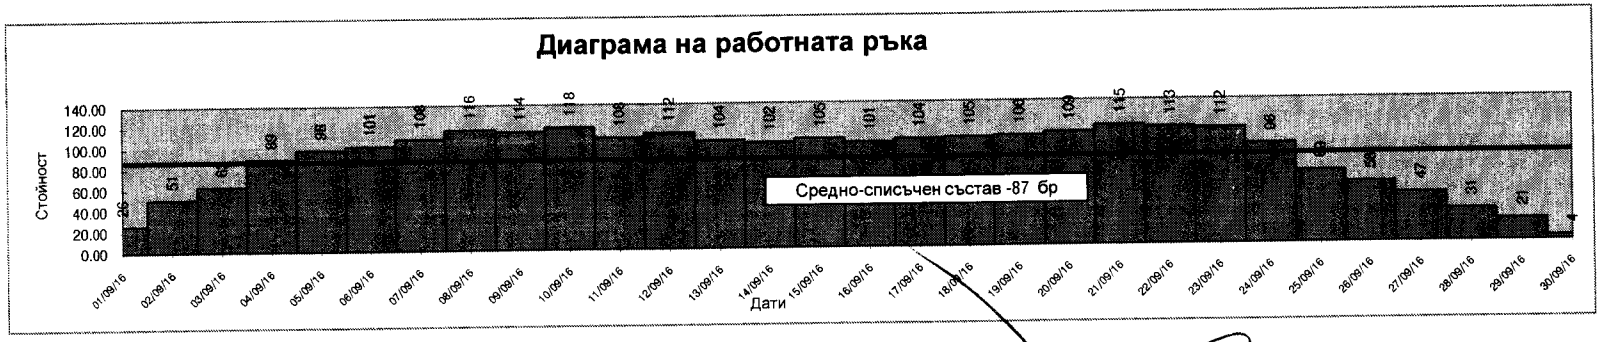

Срокът, за който ще осъществим строително-монтажните работи е 30 дни.

При необходимост фирмата ще наеме допълнирелно работници, съобразно диаграматана работната ръка

изготвил:Иван Достумски

Комплекс ООД
Благоевград

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ОБРАЗЕЦ №12

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция № 48. Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. В, вх. Г и вх. Д, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Яне Сандански"

От:„СТИЛ КОМПЛЕКС" ООД
с адрес: гр. Благоевград .ул. „Даме Груев" № 21,
тел.: 073/887740 , факс: 073/881026, e-mail: office@stilkompleks.com
регистриран по ф.д. № 838/2002 г. по описа на Благоевградски окръжен съд,
ЕИК / Булстат: 101618538,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

I. Ние предлагаме да изпълним поръчката за обща цена в размер на 695745,31 лв. (словом: шестотин деветдесет и пет хиляди седемстотин четиридесет и пет лв 31 ст) **без ДДС** или **834894,37лв.** (словом: осемстотин тридесет и четири хиляди осемстотин деветдесет и четири лв 37 ст) **с ДДС, както следва:**

За изготвяне на работен проект по всички части: 14098,00 лв. (словом: четиринадесет хиляди и деветдесет и осем лв) **без ДДС** или **16917,60 лв.** (словом: шестнадесет хиляди деветстотин и седемнадесет лв 60ст) **с ДДС; (В предлаганата цена за изготвяне на работните проекти, Участникът следва да калкулира всички разходи включително и тези за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта)**

За изпълнение на СМР 681647,31 лв. (словом: шестотин осемдесет и една хиляди шестотин четиридесет и седем лв 31ст) **без ДДС** или **817976,77 лв.** (словом: осемстотин и седемнадесет хиляди деветстотин седемдесет и шест лв77 ст) **с ДДС съгласно приложените КСС.**

Подпис и печат: Стил Комплекс Иван Дъбъмски/ 235

Десислава Несторова

Както и 0,00 лв без ДДС или 0,00 с ДДС представляващи **непредвидени разходи*** по време на изпълнение на СМР. (Непредвидените разходи следва да са в размер на максимум 10% от стойността на СМР) **Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по програмата.*

II. Елементи на ценообразуване за видоветеРСМР са както следва:

1. **П1** – Средна часова ставка 2,80 лв./час
2. **П2** - Допълнителни разходи върху труд 90 %
3. **П3** – Допълнителни разходи върху механизация 35 %
4. **П4** – Доставно-складови разходи 8 %
5. **П5** – Печалба 10 %

Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите и нормативите за такъв вид РСМР ,предвижданията и изискванията на Документацията за участие, предложените от нас условия за изпълнение на РСМР, проектодоговора, както и всички законови изисквания за осъществяване на строителство на обекти от вида и обема предмет на горепосочената обществена поръчка.

*посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на строителните работи в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.

Име и фамилия:Иван Достумски
Длъжност: Управител
Подпис и печат:_____

СтилКомплекс ЕООД Благоевград

ВАЖНО!!!

Участникът изготвя работните проекти съгласно техническият паспорт и енергийното обследване. При изготвяне на ценовата оферта Участникът следва да предвиди в Количествено стойностните сметки всички задължителни мерки предписани в техническият паспорт и енергийното обследване, както и съпътстващите ги дейности.

Подпис и печат:.....

СтилКомплекс ЕООД Иван Достумски

*Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.

Всяка страница от ценовото предложение трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

При офериране на цена над прогнозната УЧАСТНИКЪТ ще бъде отстранен от участие в процедурата.

ЗАБЕЛЕЖКА:*Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен - ПЛИК №3 .*

Подпис и печат:.....
/Иван Достумски/

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – IV – ти етап, Обособена позиция №48. Многофамилна жилищна сграда – блок № 3, вх. В, вх. Г и вх. Д, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Яне Сандански";

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "СТИЛКОМПЛЕКС ООД", гр. Благоевград

КОЛИЧЕСТВЕНО- СТОЙНОСТНА СМЕТКА					
№	**Видове СМР**	**ед.м.**	**к-во**	**ед. цена**	**стойност**
	Дейности по конструктивно възстановяване /усилване/основен ремонт/				
1	Възстановяване на металната рамка и хоризонталната геометрията на парапетните панели на терасите по източната фасада на бл.№3.вх.В, ап.9;	м	24	52.50	1,260.00
2	Ремонт с отстраняване на ръжда от видима армировка на панелите на жилищната сграда – **бл.№3 - вх.В; вх.Г и вх.Д**, чрез полагне на защитен грунд и на двукомпонентен възстановителен разтвор;	м	64	12.45	796.80
3	Обработване на фугите между стенните елементи и пукнатините в стълбищните клетки посредством циментова стабилизация;	м	128.00	9.15	1,171.20
4	Доизграждане парапетите на терасите до нормативната ви	м	105	22.19	2,329.95
5	Полагане на антикорозионно покритие върху видимите заваръчни връзки на балконските пана и елементи, към които са монтирани, преди изпълнение на външна топлоизолация	м	185.00	6.70	1,239.50
6	Обработка на видимата армировка от долната страна на подовите панели на I-ва плоча полагане на защитен грунд и полагане на двукомпонентен възстановителен разтвор преди полагане на топлоизилацията;	м²	65.00	21.12	1,372.80
7	Измазване на комините на покрива и изпълнение на шапки на коминните тела на покривите на жилищната сграда – **бл.№3 - вх.В; вх.Г и вх.Д** където те са повредени;	м²	64.00	18.31	1,171.84
8	Затваряне с предпазна мрежа на вентилационните отвори на подпокривното пространство по корнизните панели;	бр	90.00	21.45	1,930.50

СтилКомплекс ООД Благоевград

	Всичко по конструктивно възстановяване				**11,272.59**
	ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА ВХОДОВЕТЕ				
1	Ремонтиране на хидроизолация, изпълнение на ново отводняване и ремонт на бучарда по борда на козирките на входовете на жилищната сграда – **бл.№3 - вх.В; вх.Г и вх.Д**	бр	3.00	600.18	1,800.54
2	Направа на холкери при бордове на козирки	м		4.87	0.00
3	Доставка и монтаж нова двуслойна хидроизолационна система от рулонна битумно-полимерна мембрана модифицирана с АРАО полимер,горен пласт с посипка 5.4 кг и аксесоари-покриви,козирки и др.	м²	18.00	31.94	574.92
4	Очукване на стара мазилка и шпакловка в стълбищни клетки	м²	375.00	2.87	1,076.25
5	Изкърпване, подмяна и почистване на дефектирали участъци от вътрешната мазилка в общите части на сутеренте на жилищната сграда – **бл.№3 - вх.В; вх.Г и вх.Д** и подходите към машинните помещения за покривите на блока;	м²	287.00	12.85	3,687.95
6	Доставка и монтаж на метална стълба	бр	3.00	325.00	975.00
7	Остъргване на постна /латексова/ боя по стени и тавани	м²	1,450.00	1.59	2,305.50
8	Шпакловане на стени и тавани по стълбищни клетки	м²	1,960.00	6.24	12,230.40
9	Ръбохранители за гипсова шпакловка	м	625.00	2.12	1,325.00
10	Освежаване чрез боядисване на стълбищните клетки-латекс	м²	1,450.00	5.84	8,468.00
11	Остъргване на блажна боя по цокъл, подготовка за боядисване	м²	510.00	1.59	810.90
12	Блажна боя по цокъл	м²	510.00	6.78	3,457.80
13	Остъргване на блажна боя по метални парапети и асансьорни врати с етажни табла	м²	148.00	2.11	312.28
14	Блажна боя по метални парапети и асансьорни врати с етажни табла	м²	148.00	7.97	1,179.56
15	Почистване на дървени ръкохватки и дъски на стълбищен парапет	м	265.00	4.59	1,216.35
16	Грундиране, лакиране на ръкохватка на парапет	м	265.00	8.94	2,369.10
17	Ремонт на стъпала от монолитна мозайка към сутуерена на всички входове	м²	24.00	35.54	852.96
18	Подмяна на водосточните тръби от поцинкована ламарина, отводняващи покривите над асансьорните шахти	м	24.00	28.12	674.88
19	Почистване и боядисване с блажна боя по метални капаци на машинни помещения, метални стълби за качване на покрива	м²	32.00	7.97	255.04
	ВСИЧКО ПО ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА ВХОДОВЕТЕ				**43,572.43**
	ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ				0.00
	Мълниезащитна и заземителна инсталация				0.00

1	Мълниезащита от мълниеприемник с изпреварващо деистви	бр	3.00	1,980.00	5,940.00
2	Направа на отводи от екструдиран алуминиев проводник Ф8мм, вкл. опорни блокчета	м	300.00	12.45	3,735.00
3	Заземителна инсталация с поцинковани колове	бр	6.00	255.00	1,530.00
4	Направа на контролен съединител в кутия	бр	6.00	95.12	570.72
5	Направа на заземление на Г. Е. Т. До 10 ома	бр	6.00	128.36	770.16
6	Полагане на поцинкована шина 40/4мм. в изкоп	м	12.00	18.95	227.40
7	Лабораторно изпитване на заземления	бр	6.00	45.00	270.00
Всичко по Мълниезащитна и заземителан инсталация					**13,043.28**
СТЪЛБИЩНО ОСВЕТЛЕНИЕ-МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ					0.00
1	Демонаж на съществуващи осветители с неръждаема жичка	бр	32.00	3.20	102.40
2	Цялостна подмяна на електроинсталациите в общите части в сградата, съобразена с „Наредба № 3 от 09.07.2004г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии".	бр	3.00	2,850.00	8,550.00
3	Доставка и монтаж на осветително тяло -плафониера с вграден фотодатчик за движение и светлина	бр	32.00	74.25	2,376.00
4	Инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на сградата	бр	3.00	1,850.00	5,550.00
5	Комплектоване на осветително тяло с енергоспестяваща лампа LED-7W, E-27	бр	32.00	52.12	1,667.84
ВСИЧКО ПО СТЪЛБИЩНО ОСВЕТЛЕНИЕ-МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ					**18,246.24**
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ					0.00
ЕСМ: 1 ТОПЛОИЗОЛИРАНЕ НА ВЪНШНИТЕ СТЕНИ НА СГРАДАТА					0.00
1	Доставка и монтаж и демонтаж на дасадно тръбно скеле, носрщо, високоетажно с временни укрепвания към фасадата	м²	3,400.00	6.45	21,930.00
2	Демонтаж и монтаж на климатици и външни тела	бр	64.00	32.74	2,095.36
3	Изкърпване с вароциментова мазилка по фасади, парапети и дъна на тераси, вкл. очукване и консолидация на основата	м²	105.00	12.85	1,349.25
4	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди полагане на топлоизолационна система по фасади, вкл. страници на дограма	м²	3,338.00	1.96	6,542.48
5	Доставка и монтаж на топлоизолационна система от експандиран пенополистирол δ=10 см. и с коефициент на топлопроводимост λ=0.035w/mк в т.ч. лепило и дюбели, стъклотексилна мрежа, ъглови профили, крепежни елементи и шпакловка- по стени, стени на машинни помещения, калкани	м²	2,858.00	38.45	109,890.10

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

СтилКомплекс

6	Доставка и монтаж на топлоизолационна система по страници на прозорци от експандиран пенополистирол δ=2 см., ширина 25 см и с коефициент на топлопроводимост λ=0.035w/mk в т.ч. лепило и дюбели, стъклотексилна мрежа, ъглови профили, крепежни елементи и шпакловка	м²	235.00	33.84	7,952.40
7	Доставка и монтаж на топлоизолационна система от експандиран пенополистирол δ=5 см. и с коефициент на топлопроводимост λ=0.035w/mk в т.ч. лепило и дюбели, стъклотексилна мрежа, ъглови профили, крепежни елементи и шпакловка	м	1,860.00	16.51	30,708.60
8	Полагане на топлоизолация от каменна вата δ=10см. плътност 100кг/м³ и с коефициент на топлопроводимост λ=0.035w/mk в т.ч. лепило и дюбели, стъклотексилна мрежа, ъглови профили, крепежни елементи и шпакловка- по стени съобразно изисквания за пожарна безопасност	м²	138.15	48.15	6,651.92
9	Очукване на мазилка в зоните на връзка на нова със стара топлоизолация	м	384.00	2.11	810.24
10	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди шпакловка с мрежа на козарки, страници	м²	235.00	1.96	460.60
11	Стъклотекстилна мрежа, шпакловка по съществуващи топлоизолиране стени	м²	235.00	16.84	3,957.40
12	Силикатна структурна мазилка по съществуващи топлоизолиране стени	м²	235.00	19.58	4,601.30
13	Силикатна структурна мазилка по стени и около прозорци	м²	3,338.00	19.58	65,358.04
14	Доставка и монтаж на ъглов профил с мрежа	м	1,840.00	4.15	7,636.00
15	Доставка и монтаж на водооткапващ профил с мрежа	м	148.00	4.98	737.04
16	Доставка и монтаж на топлоизолационна система от екструдиран пенополистирол δ=10 см., с коефициент на топлопроводимост λ=0.035w/mk в т.ч. лепило и дюбели, стъклотексилна мрежа, ъглови профили, крепежни елементи и шпакловка- по цокъл на сграда	м²	245.00	49.65	12,164.25
17	Обръщане около прозорците на сутерена с топлоизолационна система от екструдиран пенополистирол δ=2 см., с коефициент на топлопроводимост λ=0.035w/mk в т.ч. лепило и дюбели, стъклотексилна мрежа, ъглови профили, крепежни елементи и шпакловка	м	152	17.34	2,635.68
18	Мозаечна минерална мазилка по цокли	м²	245.00	22.15	5,426.75
19	Доставка и направа на зидария от газобетон 10см при тераси	м²	296.00	52.14	15,433.44
20	Доставка и монтаж на естествен камък за оформяне на шапка на неостъклени лоджии	м	84.00	42.87	3,601.08
21	Измазване и боядисване от вътрешната страна на балкони и лоджии	м²	296.00	18.94	5,606.24
23	Доставка и монтаж на метален парапет за достигане на височина 105см	м	68.00	42.98	2,922.64

	ВСИЧКО ПО ЕСМ 1				**318,470.81**
	ЕСМ 2: ТОПЛОИЗОЛИРАНЕ НА ПОДОВЕ				0.00
1	Полагане на дълбокопроникващ грунд - таван на сутерен	м²	632.00	1.96	1,238.72
2	Доставка и монтаж на топлоизолационна система от експандиран пенополистирол δ=5 см. И с коефициент на топлопроводимост λ=0.035w/mк в т.ч. лепило и дюбели, стъклотексилна мрежа, ъглови профили, крепежни елементи и шпакловка-таван сутерен	м²	724.00	33.84	24,500.16
3	Доставка и монтаж на топлоизолационна система от експандиран пенополистирол δ=12 см. И с коефициент на топлопроводимост λ=0.035w/mк в т.ч. лепило и дюбели, стъклотексилна мрежа, ъглови профили, крепежни елементи и шпакловкапо еркери	м²	92.00	41.12	3,783.04
4	Силикатна структурна мазилка по еркери	м²	92.00	19.58	1,801.36
	ВСИЧКО ПО ЕСМ 2				**31,323.28**
	ЕСМ 3: ТОПЛОИЗОЛИРАНЕ НА ПОКРИВА НА СГРАДАТА				0.00
1	Полагане на топлоизолация от каменна вата δ=12см. плътност 13кг/м³ и с коефициент на топлопроводимост λ=0.035w/mк в т.ч. лепило и дюбели в подпокривното пространство	м²	645.00	44.58	28,754.10
2	Доставка и монтаж на топлоизолационна система от екструдиран пенополистирол δ=12 см. И с коефициент на топлопроводимост λ=0.035w/mк в т.ч. лепило и дюбели, стъклотексилна мрежа, ъглови профили, крепежни елементи и шпакловканад машинно, вкл. грундиране, армирана замазка и пароизолация	м²	96.00	41.12	3,947.52
	Армирана циментова замазка 5 см върху топлоизолация	м²	96.00	18.93	1,817.28
3	Доставка и полагане на пароизолация-фолио	м	96.00	2.25	216.00
4	Демонтаж на същ. покривни воронки, вкл. почистване и оформяне на отворите	бр	12.00	5.88	70.56
5	Демонтаж на съществуваща хидроизолация по покрива, вкл. демонтаж на тех. съоръжения на покрива, сваляне на отпадъци	м²	712.00	2.62	1,865.44
6	Очукване на съществуваща компрометирана циментова замазка , сваляне на отпадъци	м²	184.00	3.45	634.80
7	Изкърпване на очуканата циментова замазка	м²	184.00	13.85	2,548.40
8	Ремонт на холкери при бордове, машинни помещения, отдушници и комини	м	112.00	4.27	478.24
9	Доставка и монтаж нова двуслойна хидроизолационна система от рулонна битумно-полимерна мембрана модифицирана с АРАО полимер,горен пласт с посипка 5.4 кг и аксесоари-покриви,козирки и др.	м	712.00	31.94	22,741.28
10	Доставка и монтаж на покривни воронки	бр	12.00	45.57	546.84

11	Възстановяване на комини, очукване, консолидация, измазване с разтвор, доставка и монтаж на олекотени шапки, боядисване с вододисперсионни бои	бр	26.00	128.23	3,333.98
12	Направа на нов борд на машинни помещения	м	44.00	41.29	1,816.76
13	Подмяна на ламаринената обшивка по бордове, комини, стени, дилатационни фуги и др.	м²	138.00	26.12	3,604.56
14	Направа на обшивка от ламарина около машините помещения	м²	36.40	24.12	877.97
16	Доставка и монтаж на олук за машинни помещения	м	14.40	18.94	272.74
22	Доставка и монтаж на козирка от термопанел с δ=10 см. и с коефициент на топлопроводимост λ=0.035w/mк	м²	105.00	198.47	20,839.35
17	Защитни решетки на отвори за вентилиране на междинно покривно пространство	бр	90.00	9.58	862.20
	ВСИЧКО ПО ЕСМ:3				**95,228.01**
	ЕСМ:4 ПОДМЯНА НА ДОГРАМАТА НА СГРАДАТА				0.00
1	Демонтаж на стара дървена дограма и метални остъклени тераси	м²	478.00	12.00	5,736.00
2	Доставка и монтаж на ПВЦ дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисийно стъкло, с коефициент на топлопреминаване <1.40 w/m2k, петкамерна	м²	455.50	172.45	78,550.98
3	Доставка и монтаж на алуминиева дограма , с коефициент на топлопреминаване <2.20 w/m2k, входни врати	м²	22.50	196.12	4,412.70
4	Доставка и монтаж на автомат за външна врата	бр	3.00	285.00	855.00
5	Доставка и монтаж на метални капаци за сутерен	бр	62.00	85.00	5,270.00
6	Доставка и монтаж на пожароустойчива врата към сутерен с EI90	бр.	3	828.00	2,484.00
7	Доставка и монтаж на метален капак с топлоизолация към машинно помещение	бр.	3	196.85	590.55
8	Защитно покриване на прозорци и врати при изпълнение на фасадни мазилки	м²	826.00	1.50	1,239.00
9	Обръщане около прозорци с гипсова шпакловка вкл. ръбохранители отвътре	м	1,150.00	9.74	11,201.00
10	Боядисване с латекс в зоните на новата шпакловка	м²	565.00	5.84	3,299.60
11	Доставка и монтаж на подпрозоречни первази от алуминий на съществуваща дограма	м	365.00	23.00	8,395.00
12	Доставка и монтаж на подпрозоречни первази от ПВЦ с ширина до 20 см.-вътрешни	м	520.00	21.50	11,180.00
13	Доставка и монтаж на подпрозоречни первази от алуминий	м	520.00	23.00	11,960.00
	ВСИЧКО ПО ЕСМ4:				**145,173.83**
					0.00
	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ-ПБЗ				0.00

СтилКомплекс
Благоевград

1	Изпълнение на сухотръбия с диаметър Ø2"с изводи със спирателни кранове и съединители тип,,щорц", разположени в непосредствена близост до входа и евакуационните стълбища на всеки етаж в съответствие с чл.207(1) от Наредба № I з – 1971 от 29.10.2009 г. за строителнотехнически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар	м	72	58.00	4,176.00
2	Изолация на откритите водопроводи в сутерена	м	100	9.50	950.00
3	Изпитване на водопроводна инсталация	м	1	190.84	190.84
	ВСИЧКО ПО ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ-ПБЗ:				**5,316.84**
	ВСИЧКО ЗА ОБЕКТА:				**681,647.31**

ДДС 20% 136329.46

Всичко с ДДС 20% 817976.77

Подпис и печат:.....

/Иван Достумски/

СтилКомплекс ООД Благоевград

СтилКомплекс ООД Благоевград

10
