

Списък на документите

ПЛИК №1

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата
2. Предложение, попълнено по образец - Образец № 1
3. Единен идентификационен код- декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец съгласно - Образец №2
4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“ - „д“ /без б.„е“/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП попълнена по образец - Образец №3 (оригинал)
5. Списък – Декларация на строителството, еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка, изпълнени за период от 5 години- Образец №4
6. Списък - Декларация на лицата, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката - Образец №5
7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители - Образец №6
8. Документ за внесена гаранция за участие – екземпляр на вносната бележка
9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора – Образец №9
10. Декларация по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Образец №10
11. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - Образец №14
12. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 56, ал. 1, т.11 от ЗОП - Образец № 15
13. Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП. - Образец № 16
14. Списък на инженерно-техническия състав и екип от проектантите за изпълнението на поръчката - Образец № 17
15. Декларация за техническа спецификация на материалите - Образец № 18
16. ISO 9001:2008 Система за управление на качеството за дейностите или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП
17. ISO 14001:2008 Система за управление на околната среда или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП
18. Копие на застраховка „Професионална отговорност“
19. Декларация за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка - Образец № 19

ПЛИК №2


1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Образец №11
2. Подробен Линеен график за видове СМР
3. Диаграма на работната ръка

ПЛИК №3

1. Ценово предложение - Образец № 12
2. КСС
3. Анализни цени

15.05.2015г.

Подпис и печат:.....



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Запад” №55 ”

I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта е подадена от: "Строителство и саниране-инженеринг- консулт" ЕООД
/наименование на участника/

и подписана от: Петкана Петрова Николова
/три имена/

в качеството му/им на Управител
/длъжност/

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес : Жк.Западен парк, ул.Суходолска 2, бл.31, ет.1, ап.3
/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./

Телефон №: 02/9500980
факс №: 02/9500980
e-mail: ssik_eood@abv.bg

2. Лице за контакти: Петкана Петрова Николова
Длъжност: Управител
Лична карта № 194976797, издадена на 07.02.2006 от МВР София
телефон / факс: 02/9500980


3. Обслужваща банка: ТБ Инвестбанк АД
Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:

IBAN BG17IORT80381000217600BIC IORTBGSF
Титуляр на сметката Петкана Петрова Николова

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:

IBAN BG17IORT80381000217600 BIC IORTBGSF
Титуляр на сметката Петкана Петрова Николова

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,



1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет при условията, обявени в тази документация и приети от нас.

Заявяваме, че представяме оферта за участие в процедурата с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции

Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Запад” №55 ”
Обособена позиция №2 „Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Братя Иванови” №1 ”

3. Запознати сме и се задължаваме да спазваме условията за участие в процедурата.

4. Запознати сме и се задължаваме да спазваме етичните клаузи на настоящата процедура.

5. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

6. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в откритата процедура.

7. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 180 дни, но не по-малко от **180 календарни дни** от датата на получаване на офертата и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

8. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Като неразделна част от настоящата оферта, представяме **Списък на документите съдържащи се в офертата** в подписан и подпечатан вид.

/Описват се всички представени от участника документи (задължителни и други - по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника и относно подизпълнителите - ако такива се предвиждат, документи относно икономическото и финансово състояние на участника, доказателства за техническите възможности и/или професионална квалификация на участника, които съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП и настоящата документация следва да бъдат поставени в плик № 1 „Документи за подбор”/.

Дата: 15.05.2015 г.

.....
(Подпис и печат)

**** Когато Участник в процедурата е обединение, настоящия образец на оферта се представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението/договорът за създаване на обединение.*

**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР**

Подписаният: Петкана Петрова Николова
(трите имена)

Данни по документ за самоличност л.к.№194976797, издадена на 07.02.2006 от МВР
София (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Управител (длъжност)

на Участник: "Строителство и саниране-инженеринг- консулт" ЕООД, в
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на
Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни
сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции**

**Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к.
„Запад” №55 ”**

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и
неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: 131405777

Дата: 15.05.2015

ДЕКЛАРАТОР:

.....
(подпис, печат)

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ I - TV 011016

Комисията за качество, контрол и лицензиране на Камарата на строителите в България, поканата на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителя, издава настоящото удостоверение на:

Строител: СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ - ИНЖЕНЕРИНГ - КОНСУЛТ ЕООД

седище: гр. София, ул. "България" № 1373, София, ж.к. "Западен парк", ул. "Суходолска" № 2, бл. 31, ет. 2, ап. 5

Председател: Петко Петров Николова

ЕИК: 131405777

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0357/04.09.2014 Централният е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строително-монтажни работи.

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

• **ПЪРВА ГРУПА** - строително-монтажни работи, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

• **СРЪБНА ОУПРЕТА ДО ПЕРИОДА** - (с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 1.4.4 и т. 1.5.6)

Конкретният вид на строителните работи, за които се издава настоящото удостоверение, се определят чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и възразка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № I - TV 04

Строител: СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ - ИНЖЕНЕРИНГ - КОНСУЛТ ЕООД

ЕИК: 131405777

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 1 ОТ ПРАВИЛНИКА
ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР
НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ


№ I - TV 011016

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА 30.09.2015

Председател на комисията:

доц. д-р инж. Георги ПИНКОВ

София • 2014



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

(доц. д-р инж. Георги ПИНКОВ)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

(инж. Светослав ГЛОСОВ)

Настоящото удостоверение е неважидно без приложението талон с указан срок.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“ - „д“ /без б.„е“/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Подписаният: Петкана Петрова Николова
(три имена)

Данни по документ за самоличност .к.№194976797, издадена на 07.02.2006 от МВР София
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Управител (длъжност)
на Участник: "Строителство и саниране-инженеринг- консулт" ЕООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции

Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Запад“ №55 ”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:
 - а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
 - б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
 - в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
 - г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
 - д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

1. **Не съм** свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

2. **Представяваният от мен участник не е** обявен в несъстоятелност;

3. **Представяваният от мен участник не е** в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

4. **Представяваният от мен участник не се намира** в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;

5. **Не е** виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,

6. **Представяваният от мен участник няма парични задължения** към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.

7. **Не съм осъден** с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;

8. **Представяваният от мен участник не е** в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност до смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 15.05.2015 г.
гр.София

ДЕКЛАРАТОР: _____

СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП

на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата с обекти еднакви или сходни с предмета на поръчката.

Подписаният: Петкана Петрова Николова (три имена)

Данни по документ за самоличност 194976797, издадена на 07.02.2006 от МВР София
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Управител

(длъжност)

на "Строителство и саниране-инженеринг- консулт" ЕООД -

(наименование на участника)

участник: "Строителство и саниране-инженеринг- консулт" ЕООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции**

Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Запад” №55 ”

ДЕКЛАРИРАМ:

През последните пет години, считано от датата на подаване на офертите, представляваният от мен участник е изпълнил следното строителство еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка:

№ по ред	строителство (кратко описание)	Възложител	Период на изпълнение	Стойност /лева/
1	„Жилищна сграда с кафе-грил“, София	ТМ „КОМЕРС“ ООД, София, жк. Бояна, ул.Божур 2, Тел.0888 563 264	04.01.2010г.- 29.10.2010г	225 000,00
2	Обновителни работи по бл.„Извор” 6, гр.Смолян	ПРООН, София, ул.Иван Денкоглу №2 Тел02/ 96 96 100	02.02.2011- 05.10. 2011	199 076,02
3	Обновителни работи по бл.4, и Бл.Строител 1, гр.Смолян	ПРООН, София, ул.Иван Денкоглу №2 Тел02/ 96 96 100	02.02.2011- 05.10. 2011	260 179,00
4	СМР /ремонт на ПГ „Св. Патриарх Евтимий, гр.Асеновград	ПГ „Св.Патриарх Евтимий“, гр.Асеновград, ул.Училищна №16	10. 2011- 12. 2011	161 717,05
5	Саниране на фасади към вътрешен двор на административни сгради в гр.Шумен на ул.Сан Стефано №2 и ремонт на спортна зала	ОДМВР – гр.Шумен, ул.Сан Стефано №2 0887 752 026	3.04.2013- 17.04.2013	52 845,09
6	СМР за енергоспестяващи мерки в сградата на НМА „Проф.Панчо Владигеров“, София	НМА „Проф.Панчо Владигеров“ 0887 802 675	10. 2011- 12. 2011	449 477,36

7	Ремонтни дейнос-ти по подобряване на енергийната ефективност на 78 СОУ, р-н Банкя, СО, Банкя	СО, р-н Банкя	16.05.2013-25.07.2013	1 112 389,80
8	Внедряване на мерки за енергийна ефективност в НЧ „Хр.Ботев-1892“, Белене	Община Белене, тел. 0658/3-46-72	27.03.2014-21.05.2014	131 900,86
9	Изграждане на две жилищни сгради- сграда А и сграда Б, гр.София	Ем То Трейд ООД	06.01.2014-21.10.2014г	750 674,08
10	Административна сграда на ДУССД- МВР София	Престиж Бизнес-93 ООД	26.03.2014-26.05.2014	97 000,00
11	„Подобряване енергийната ефективност на сградите на: Детски ясли „Слънчо“, ОМГ „Акад. Кирил Попов“ и ОП „Чистота“ в гр. Пловдив по обособена позиция № 2 – ОМГ ”Академик Кирил Попов“	Община Пловдив	15.10.2014-07.11.2014	80 702,59

Изпълнението на изискването се доказва с:

- а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или
- б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или
- в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;


За „строителство с предмет, сходен с предмета на поръчката“, възложителят ще приема: **СМР по полагане на хидро и топло изолация на обществени или жилищни сгради.**

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

15.05.2015г.

(дата на подписване)

Декларатор: _____



Възложител: ТМ „КОМЕРС“ ООД, гр.София, ж.к.Бояна,ул.Божур №2, ЕИК 130458691,
представявано от Тодор Ранков – управител

Изх. № 9
Дата: 29.10.2011г.

Лице за контакти: Тодор Ранков
Тел.: 0888 563 264

ОБЕКТ: „Жилищна сграда с кафе – грил – УПИ Х-645 кв. „Бояна“, район „Витоша“
намиращ се в гр. София, кв. „Бояна“, площад „Сборище“ №3

РЕФЕРЕНЦИЯ

ТМ „КОМЕРС“ ООД дава настоящата референция за дейността на „Строителство и
саниране-инженеринг-консулт“ ЕООД в качеството и на строителна организация,
доказала коректността си като Главен изпълнител на обект: „Жилищна сграда с кафе
– грил“ – УПИ Х-645 кв. „Бояна“, район „Витоша“ гр.София



Общата стойност на изпълнените видове строително-монтажни работи по договор
от дата 04.01.2010г. възлиза на 225 000 лв/ двеста двадесет и пет хиляди лв./ без
ДДС.

Изпълнените видове СМР са както следва:

- Топлоизолационна система по фасади
- Покривни работи – скаген и плосък покрив(дървена конструкция,
топлоизолация, хидроизолация, обшивка по бордове, тенекиджийски работи)

➤ Доставка и монтаж на PVC дограма

Сградата е с РЗП 994м² на 4 етажа.

Патрерът е на кота + 0,00м и представлява кафе – грил с 32 места за посетители. Входът е от площадка посока югоизток.

Вторият и третият етаж са идентични, разположени съответно на кота +3,70м и +6,50м. Всеки етаж представлява един апартамент.

Подпокривният етаж е на кота +9,30м и е прибран до линията на наклона по ъгъл 45°. Тук е разположен мезонет, със складове на второто ниво. Подпокривният етаж е изнесен с капандури и кули, които са в допуски на застрояването.

В периода от 04.01.2010г. до 29.10.2010г. „Строителство и саниране-инженеринг-консулт“ ЕООД изпълни следните видове строително-монтажни работи:

1. Топлоизолационни работи

- Топлоизолационна система по фасади EPS d=8см, вкл. силиконова мазилка – 560 м²
- Топлоизолация по страници
- Топлоизолационна система XPS по калкан – 420 м²

2. Покривни работи

2.1. Скатен покрив

- Дървена конструкция – 266 м²
- Топлоизолация – минерална вата
- Битумни керемиди, ламаринена обшивка, олуци, водосточни тръби, водосборни казанчета

2.2. Плосък покрив

- Топлоизолация – XPS – 180 м²
- Хидроизолация -2 пласта битумна мембрана
- Ламаринена обшивка, олуци, водосточни тръби, водосборни казанчета

3. Доставка и монтаж на PVC дограма – 220 м²

Гореизброените видове строително-монтажни работи са изпълнени прецизно, в изключително кратки срокове – при безусловно спазване на действащата в страната нормативна техническа уредба.

Дата:

гр.София





ПРОЕКТ "ДЕМОНСТРАЦИОННО ОБНОВЯВАНЕ" НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ○ ПРОГРАМА НА ООН ЗА РАЗВИТИЕ

№ 00176/02.02.2012

РЕФЕРЕНЦИЯ

Относно извършването на обновителни работи по проект "Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради" – съвместен проект на Програмата на ООН за развитие и МРРБ

Настоящата се издава от Проект „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради“, в уверение на това, че фирма „Строителство и саниране - инженеринг консулт“ ЕООД, след спечелени търгове и по силата на договори подписани между нас, през периода от 02.05.2011г. до 05.10.2011г. извърши строително-ремонтните дейности по обновяването на:

- **Жилищна сграда в гр. Смолян, кв. Райково, ул. "Бяло море" №2, блок Извор-6, вх.А и вх.Б по проект "Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради"**

Общата стойност на изпълнените видове строително - монтажни работи по договор № 2011-008-56192 възлиза на 238 891,23 лв. с ДДС/ двеста тридесет и осем хиляди осемстотин деветдесет и един лв. и 23 ст. / в следния обхват:

1. Ремонт и отводняване покрив, подмяна хидроизолация
 - Демонтаж стара и направа на нова дъсчена и летвена обшивка по покрив – 630 м²;
 - Доставка и полагане на хидроизолационна мушама - 630 м²;
 - Препокриване покрив с марсилски керемиди - 630 м²;
 - Демонтаж стара и направа нова обшивка от поцинкована ламарина, висящи улуци, водосточни тръби и казанчета – 207 м²;
2. Изпълнение на топлоизолационна система по покрив, ограждащи стени и плоча над сутерен
 - Топлоизолационна система по фасади и по калкани EPS 8см, вкл.грундиране, шпакловане и полагане на силикатна мазилка – 1591 м²;
 - Топлоизолационна система по страници на прозорци EPS d=2см и ширина 15см, вкл.грундиране, шпакловане и полагане на силикатна мазилка – 1113 м²;
 - Топлоизолационна система по покрив XPS с деб. 12 см – 470 м²;
 - Доставка и монтаж на минерална вата на сутеренна плоча - 200 м²;
 - Доставка и монтаж на EPS по сутеренна плоча - 242 м²;
3. Подмяна / ремонт на външна дограма
 - Демонтаж стара, доставка и монтаж нова PVC дограма - 203 м²;
 - Демонтаж стара, доставка и монтаж нова Al входна врата;
4. Ревизиране и подмяна на амортизирани части на инсталациите в сградата
 - Демонтаж стари, доставка и монтаж нови осветителни тела, ел. ключове, контакти и домофонна инсталация;



ПРОЕКТ "ДЕМОНСТРАЦИОННО ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ"

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ○ ПРОГРАМА НА ООН ЗА РАЗВИТИЕ

- Направа гръмоотводна и заземителна инсталации;
- 5. Строително-ремонтни работи в общите части на сградата: боядисване стени на стълбищна клетка, подмяна входни врати, входна козирка, стъпала.
 - Гипсова шпакловка – 1380 м²;
 - Боядисване с латекс – 1500 м²;
 - Боядисване с блажна боя – 210 м²;

➤ **Жилищни сгради в гр. Смолян, ул. "Първи май" №61, блок 4 и ул. "Миньорска" №1, блок „Строител -1“ по проект "Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради"**

Общата стойност на изпълнените видове строително - монтажни работи по договор № 2011-010-56192 възлиза на 312 214,81 лв. с ДДС/ триста и дванадесет хиляди двеста и четиринадесет лв. и 81 ст./ в следния обхват:

1. Ремонт и отводняване покрив, подмяна хидроизолация
 - Демонтаж стара и направа на нова дъсчена и летвена обшивка по покрив – 578 м²;
 - Доставка и полагане на хидроизолационна мушама - 744 м²;
 - Демонтаж стара и направа нова обшивка от поцинкована ламарина, висящи улуци, водосточни тръби и казанчета – 578 м²;
2. Изпълнение на топлоизолационна система по покрив, ограждащи стени и плоча над сутерен
 - Топлоизолационна система по фасади и по калкани EPS 5см, вкл. грундиране, шпакловане и полагане на силикатна мазилка – 2158 м²;
 - Топлоизолационна система по страници на прозорци EPS d=2см и ширина 15см, вкл. грундиране, шпакловане и полагане на силикатна мазилка – 1330 м²;
 - Доставка и монтаж на топлоизолация XPS с d=6 см на сутеренна плоча - 660 м²;
 - Топлоизолационна система по покрив с минерална вата – 520 м²;
 - Топлоизолационна система по покрив XPS с деб.12см – 180 м²;
3. Подмяна / ремонт на външна дограма
 - Демонтаж стара, доставка и монтаж нова PVC дограма - 238 м²;
 - Демонтаж стара, доставка и монтаж нова Al входна врата;
4. Ревизиране и подмяна на амортизирани части на инсталациите в сградата
 - Демонтаж стари, доставка и монтаж нови осветителни тела, ел. ключове и контакти;
 - Направа гръмоотводна и заземителна инсталации;



ПРОЕКТ "ДЕМОНСТРАЦИОННО ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ"

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО • ПРОГРАМА НА ООН ЗА РАЗВИТИЕ

5. Строително-ремонтни работи в общите части на сградата: боядисване стени на стълбищна клетка, подмяна входни врати, входна козирка, стъпала.
- Гипсова шпакловка – 320 м²;
 - Боядисване с латекс – 1355 м²;
 - Боядисване с блажна боя - 240 м²;

Фирма „Строителство и саниране - инженеринг консулт“ ЕООД работи професионално и изпълни в срок и с много добро качество строително-ремонтните работи, свързани с обновяването на жилищните сгради в гр. Смолян.

Проект „ДОМЖС“ препоръчва фирма „Строителство и саниране - инженеринг консулт“ ЕООД, като надежден партньор на общини, частни лица, фирми и държавната администрация за изпълнение на строително-ремонтни дейности и дейности по обновяването на сгради.

07 февруари, 2012 г.
гр. София



Мениджър Проект „Демонстрационно
обновяване на многофамилни жилищни
сгради“


Изх. № 144/24.02.2021

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ПГ "Св. Патриарх Евтимий", гр. Асеновград, с директор Йордан Диков

ОБЕКТ: „Саниране на сградата на Професионална гимназия „Св. Патриарх Евтимий“, гр. Асеновград”

РЕФЕРЕНЦИЯ

Професионална гимназия "Св. Патриарх Евтимий", гр. Асеновград дава настоящата референция за дейността на "СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ – ИНЖЕНЕРИНГ – КОНСУЛТ" ЕООД в качеството и на строителна организация, доказала коректността си като Главен изпълнител на обект: „Саниране на сградата на Професионална гимназия „Св. Патриарх Евтимий“, гр. Асеновград”

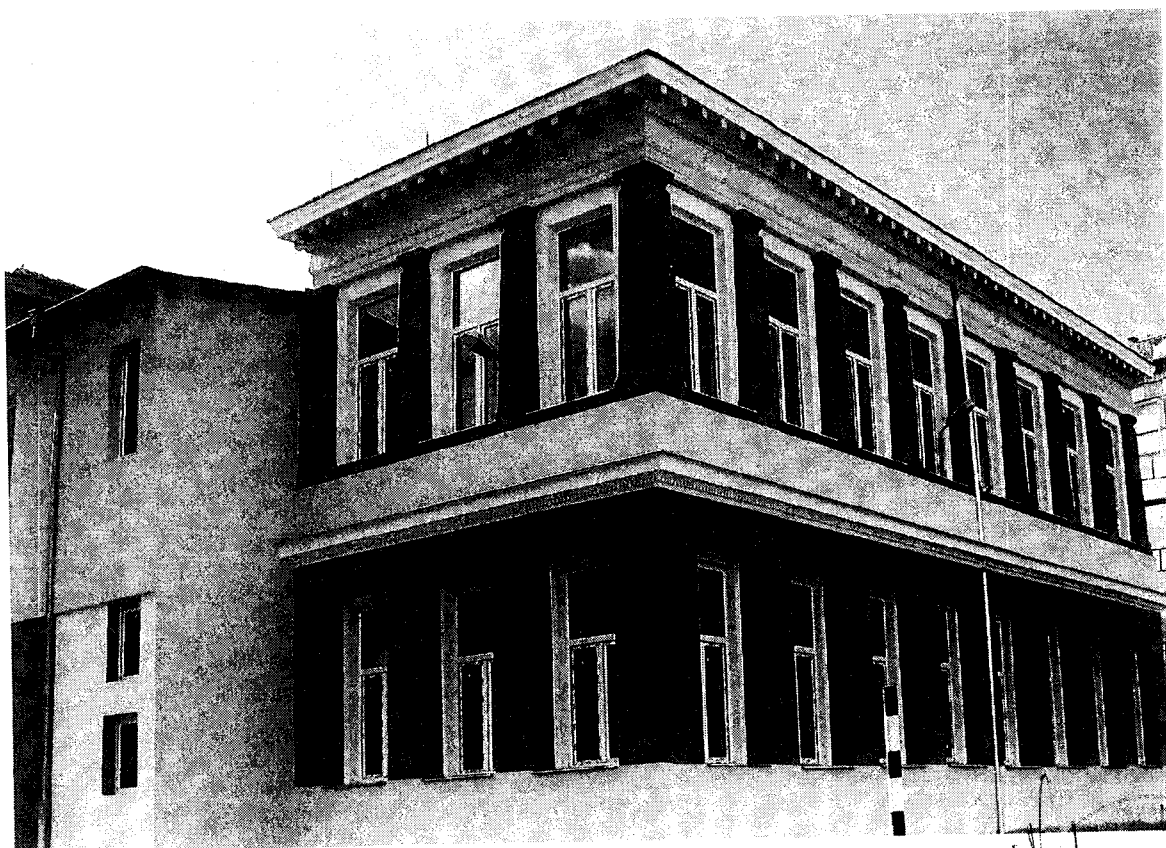

Общата стойност на изпълнените видове строително – монтажни работи възлиза на 161 713,41 лв (сто шейсет и една хиляди седемстотин и тринадесет лева и четиридесет и една стотинки) без ДДС.

В периода от октомври 2011г. до декември 2011г. фирма "СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ – ИНЖЕНЕРИНГ – КОНСУЛТ" ЕООД изпълни следните строително – монтажни работи:

- Демонтаж стара и монтаж на нова PVC дограма;
- Изпълнение на топлоизолационна система по фасади с EPS;
- Изпълнение на топлоизолационна система по страници на прозорци с EPS d=2cm;
- Полагане на фасадна мазилка;
- Покривни работи;
- Демонтаж стара и направа нова обшивка от поцинкована ламарина;
- Подмяна на водосточни тръби;

Настоящата референция се издава в уверение на това, че строителна фирма "СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ – ИНЖЕНЕРИНГ – КОНСУЛТ" ЕООД, представявана от инж. Янко Янков, работи професионално и изпълни в срок и с много добро качество горепосочените видове строително – монтажни работи.

27.02.2012г.

гр. Асеновград

Директор:



/Иордан Диков/

Въложител: ОДМВР - гр. Шумен, ул. „Сан Стефано“ № 2

Договор № 11/2011 г. № 1

Лице за контакти: Димитър Горчев

Датум: 18.07.2011 г.

Тел.: 0887752026

ОТНОСНО: "Саниране на фасади към вътрешен двор на административни сгради в гр. Шумен на ул. „Сан Стефано“ №2 и ремонт на спортна зала"

РЕФЕРЕНЦИЯ

ОДМВР - гр. Шумен дава настоящата референция за дейността на „Строителство и саниране-инженеринг-консулт“ ЕООД в качеството и на строителна организация, доказала коректността си като изпълнител на обект: "Саниране на фасади към вътрешен двор на административни сгради в гр. Шумен на ул. „Сан Стефано“ №2 и ремонт на спортна зала".



Общата стойност на изпълнените видове строително-монтажни работи възлиза на 62 645,09 лв / петдесет и две хиляди осемстотин четиридесет и пет лева и тевет сто без ДДС.

A handwritten signature in dark ink, likely belonging to the official responsible for the reference.

В периода от **03.04.2013г.** до **17.04.2013г.** „Строителство и саниране-инженеринг-консулт“ ЕООД изпълни следните видове строително-монтажни работи:

1. Топлоизолационна система по фасади:

- * доставка и полагане топлоизолационна система 5см EPS по фасади;
- * Доставка и полагане топлоизолационна система 2см EPS по външни страници на дограма;
- * Доставка и монтаж на ръбоохранителни около прозорци и външни ръбове фасади
- * Доставка и монтаж на водооткачиващ профил;

2. Дограма:

- * Демонтаж дограма;
- * Доставка и монтаж на PVC дограма;
- * Обриване по страници вътрешно около дограма;
- * Доставка и монтаж на подпрозоречен плот;

3. Ремонтни дейности спортна зала и санитарни помещения.


- * Подмяна на ВиК инсталация;
- * Подмяна на Електро инсталация;
- * Окачен таван от гипсокартон;
- * Предстенна обшивка от гипсокартон;
- * Подлагане на PVC настилка;
- * Облицовка по стени с фаянсови плочки;
- * Настилка от теракотни плочи по под;
- * Доставка и монтаж санитарни прибори;
- * Гипсова шпакловка по стени и тавани;
- * боядисване с латекс по стени и тавани;

Фирма „Строителство и саниране-инженеринг-консулт“ ЕООД работи професионално и изпълни в срок и с много добро качество строително-монтажните работи в сградата на ОДМВР - гр. Шумен, ул. „Св. Стефан“ № 2.


ОДМВР - гр. Шумен, препоръчва фирма „Строителство и саниране-инженеринг-консулт“ ЕООД, като надежден партньор на общини, частни лица, фирми и държавната администрация за изпълнение на строително - монтажни дейности и дейности по поддържането на сгради.

.....
гр. Шумен

.....
Комисар Захарий Захариев
Директор ОДМВР Шумен



НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ „Проф. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“



Изх. № 06-18-175 / 11.03. 2013 г.

РЕФЕРЕНЦИЯ

ОТНОСНО: „Изпълнение на строително монтажни работи за реализиране на енергоспестяващи мерки в сградата на Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, гр. София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94

Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ дава настоящата референция за дейността на „Строителство и саниране-инженеринг-консулт“ ЕООД (водеща фирма в Обединение „ТЕХНО – ИНЖЕНЕРИНГ“) в качеството и на строителна организация, доказала коректността си като изпълнител на обект: „Изпълнение на строително монтажни работи за реализиране на енергоспестяващи мерки в сградата на Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, гр. София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94



Общата стойност на изпълнените видове строително-монтажни работи по договор № 12/19.10.2012г. възлиза на 449 477,36 лв./ четиристотин четиридесет и девет хиляди

1505 София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №94, тел.: 4409-740, факс: 944-14-54
<http://nma.bg>, e-mail: info@nma.bg

четиристотин седемдесет и седем лева и тридесет и шест ст./ без ДДС.

В периода от 19.10.2012г. до 13.02.2013г. „Строителство и саниране-инженеринг-консулт“ ЕООД (водеща фирма в Обединение „ТЕХНО – ИНЖЕНЕРИНГ“) изпълни следните видове строително-монтажни работи на обща стойност 244 375лв /двеста четиридесет и четири хиляди триста седемдесет и пет лева / без ДДС:

1. Покривни работи:

- Доставка и монтаж на дървена скара за топлоизолационни панели;
- Изграждане на дървена покривна конструкция;
- Доставка и монтаж на пенополиуретанови термopanели 10 см.

2. Теплоизолационна система по фасади:

- Доставка и полагане топлоизолация 8см EPS;
- Доставка и полагане на PVC мрежа - върху топлоизолация, вкл. шпакловка;
- Минерална мазилка;
- Доставка и полагане топлоизолация 2см XPS външни страници дограма;
- Доставка и полагане на PVC мрежа - върху топлоизолация, вкл. шпакловка по външни страници дограма;
- Минерална мазилка - по външни страници дограма;
- Доставка и монтаж на ръбоохранители около прозорци и външни ръбове фасада;
- Доставка и монтаж на водооткапващ профил.

3. Дограма:

- Демонтаж дограма;
- Доставка и монтаж на PVC дограма бяла 5 камерна, стъклопакет 24 мм;
- Обръщане по страници вътрешно около дограма;
- Доставка и монтаж на подпрозоречен плот.

4. Други:


- Направа на външна вароциментова мазилка
- Доставка и полагане топлоизолация по под 10 см XPS на лепене
- Настилка по тераса с гранитогрес, студоустойчиво лепило;
- Цокъл от гранитогрес по тераса;
- Доставка и монтаж на шапка от камък по борд;
- Доставка и монтаж на каменни плочи по цокъл над стреха;
- Доставка и монтаж на облицовка от каменни плочи по стреха.

Фирма „Строителство и саниране-инженеринг-консулт“ ЕООД работи професионално и изпълни в срок и с много добро качество строително монтажните работи за реализиране на енергоспестяващи мерки в сградата на Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, гр. София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94.

Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, гр. София препоръчва фирма „Строителство и саниране-инженеринг-консулт“ ЕООД, като надежден партньор на общини, частни лица, фирми и държавната администрация за изпълнение на строително-ремонтни дейности и дейности по обновяването на сгради.

Лице за контакти: инж. Евгени Вълков
Тел.: 0887802675

Пом. Ректор:



инж. Евгени Вълков



СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „БАНКЯ“





1320 – гр. Банкя, ул. „Цар Симеон“ № 1; тел: 997 71 06,
факс: 997 71 63. E-mail: bankya@bankya.bg

064000. 15.03.2012.
(Регистрационен индекс, дата)

ОТНОСНО: Изпълнение на строително-монтажни работи на 78 СОУ „Христо Смирненски“, район „Банкя“ на Столична община, във връзка с изпълнение на Договор за финансиране по националната схема за зелени инвестиции с реф. №РД-56-234/15.03.2012г. на „Националната схема за зелени инвестиции“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Ос 1 – Проекти, които се финансират на базата на редуцирани емисии и сключен договор за продажба на Предписани емисионни единици (ПЕЕ), сключен между Столична община и НДЕФ по проект: „Подобряване на енергийната ефективност“ на 56 СОУ „Константин Иречек“, р-н „Люлин“ и 78 СОУ „Христо Смирненски“, р-н „Банкя“ на Столична община.

РЕФЕРЕНЦИЯ

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „БАНКЯ“ дава настоящата референция за дейността на „Строителство и саниране-инженеринг-консулт“ ЕООД (водеща фирма в Обединение „ТЕХНО – ИНЖЕНЕРИНГ“) в качеството и на строителна организация, доказала коректността си като изпълнител на обект:

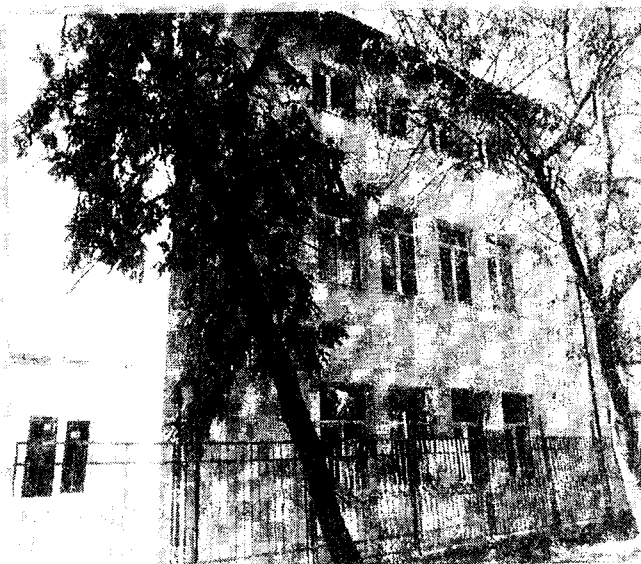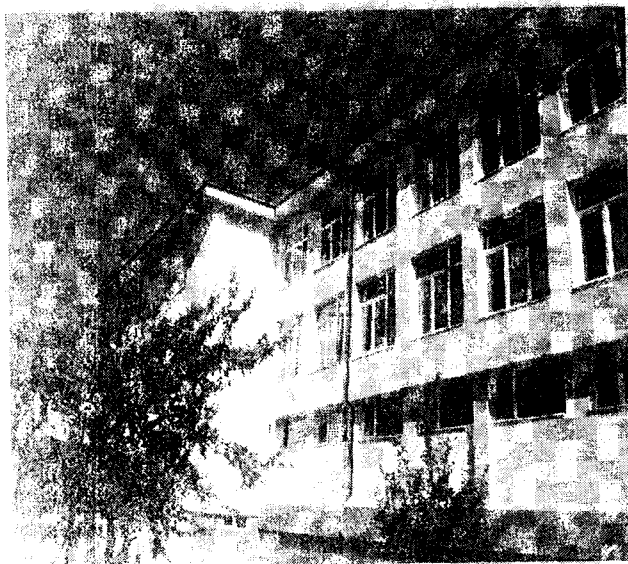

(Handwritten signature)

- Изпълнение на строително-монтажни работи на 78 СОУ „Христо Смирненски“, район „Банкя“, във връзка с изпълнение на Договор за финансиране по националната схема за зелени инвестиции с реф. №РД-56-234/15.03.2012г. на „Националната схема за зелени инвестиции“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Ос 1 – Проекти, които се финансират на базата на редуцирани емисии и сключен договор за продажба на Предписани емисионни единици (ПЕЕ), сключен между Столична община и НДЕФ по проект: „Подобряване на енергийната ефективност“ на 56 СОУ „Константин Иречек“, р-н „Люлин“ и 78 СОУ „Христо Смирненски“, р-н „Банкя“ на Столична община.

Общата стойност на изпълнените видове строително-монтажни работи по договор РД 56 – 27/29.04.2013 г. възлиза на 1 112 389,80лв/ един милион сто и дванадесет хиляди триста осемдесет и девет лева и осемдесет стотинки./ без ДДС.

Разгънатата застроена площ (РЗП)на обекта– 13467m²

В периода от 16.05.2013г. до 25.07.2013г.,„Строителство и саниране-инженеринг-консулт“ ЕООД(водеща фирма в Обединение „ТЕХНО – ИНЖЕНЕРИНГ“) изпълни следните видове строително-монтажни работи на обща стойност 1 030 793,20 / един милион тридесет хиляди седемстотин деветдесет и три лева и двадесет стотинки / без ДДС:

1. Топло и хидроизолационни дейности скатен покрив:

- Частичен ремонт, доставка и хидрофобизация на дървена покривна конструкция. дъсчена обшивка;
- Ревизия, пренареждане и частична подмяна на керемиди – 3630m²;
- Доставка и монтаж на минерална вата на руло с дебелина 10см– 3630m²;
- Подмяна на улици, водосточни тръби, водосточни казанчета и доставка и монтаж на обшивки от пластифицирана ламарина;

2. Топло и хидроизолационни дейности плосък покрив:

- Доставка и монтаж на минерална вата на плочи с дебелина 10см – 1612m²;
- Доставка и монтаж на два пласта модифицирана (APP) битумна хидроизолация – 1612 m²;
- Доставка и монтаж на обшивка от пластифицирана ламарина по бордове и поли;

3. Топлоизолационна система по фасади:

- Доставка и полагане топлоизолация 8см EPS по фасади, вкл. PVC мрежа и шпакловка – 6900m²;
- Структурна силикатна мазилка по фасади - 8060m²;
- Доставка и полагане топлоизолация 2.5 см EPS външни страници дограма,вкл. PVC мрежа и шпакловка – 5200m²;
- Структурна силикатна мазилка - по външни страници дограма;
- Доставка и полагане топлоизолация 5см XPS – 550m²;

- Д-ка и м-ж на ръбоохранители около прозорци и външни ръбове фасада;
- Доставка и монтаж на водооткапващ профил;

4. Дограма:

- Демонтаж, доставка и монтаж на PVC дограма бяла 5 камерна, стъклопакет 24 мм;
- Демонтаж, доставка и монтаж на Алюминиева дограма;
- Обръщане по страници вътрешно около дограма;
- Доставка и монтаж на външна алуминиева пола – Z профил;


5. Отоплителна инсталация:

- Цялостна подмяна на отоплителна инсталация в това число – хоризонтална и вертикална тръбна разводка, топлоизолация за тръби, отоплителни тела, топломерни групи, разширителен съд, автоматична допълваща система, водоразпределителен – водосъбирателен колектор, циркулационни помпи;

Фирма „Строителство и саниране-инженеринг-консулт“ ЕООД работи професионално и изпълни в срок и с много добро качество строително-монтажните работи за реализиране на енергоспестяващи мерки в сградата на 78 СОУ „Христо Смирненски“, район „Банкя“.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „БАНКЯ“ препоръчва фирма „Строителство и саниране-инженеринг-консулт“ ЕООД, като надежден партньор на общини, частни лица, фирми и държавната администрация за изпълнение на строително-ремонтни дейности и дейности по обновяването на сгради.


РАНГЕЛ МАРКОВ,
КМЕТ НА РАЙОН „Банкя“





ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

град Белене 5930, ул. „България“ № 35, тел. (0658) 3 10 61, факс (0658) 3 10 62
<http://obshtina.belene.net>, e-mail: obshtinabl@abv.bg; obshtinabl@gmail.com




РЕФЕРЕНЦИЯ

ОТНОСНО: Изпълнение на строително-монтажни работи по проект на община Белене „Подобряване на енергийната ефективност в обществени сгради в гр. Белене и намаляване на вредните емисии, генерирани от обществени сгради на територията на общината“, Обособена позиция №3 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в народно читалище „Христо Ботев-1892“ - гр. Белене“

Община Белене дава настоящата референция за дейността на „Строителство и саниране-инженеринг-консулт“ ЕООД, ЕИК 131405777 в качеството ѝ на строителна организация, доказала коректността си като Главен изпълнител на строителен обект:

- ❖ „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в народно читалище „Христо Ботев-1892“ - гр. Белене“, обособена позиция: 3, процедура с № в Регистъра по обществени поръчки на АОП: 00661-2013-0012

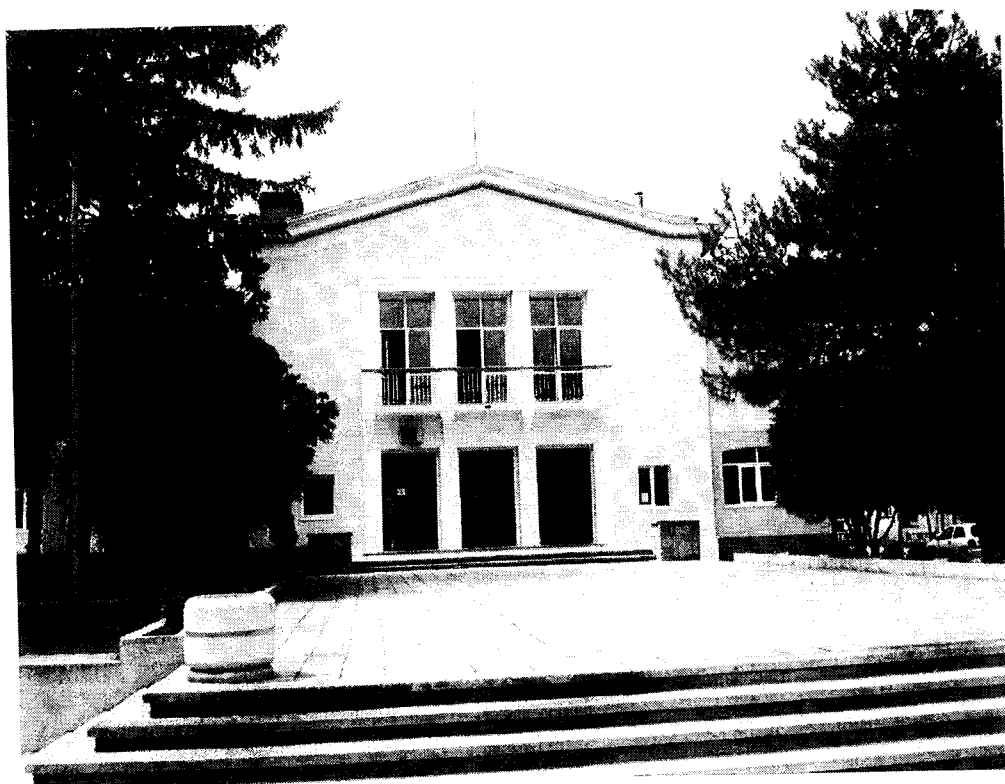

- Общата стойност на изпълнените видове строително-монтажни работи по договор № 12/20.03.2014г. възлиза на 131 900,86 лв/ сто тридесет и една хиляди и деветстотин лв. и 86ст./ без ДДС.

НАЦИОНАЛНА СХЕМА ЗА ЗЕЛЕНИ ИНВЕСТИЦИИ



Изпълнените видове СМР са както следва:

- Подмяна на дограма
- Топлоизолационна система по фасади и покрив
- Покривни работи

В периода от 27.03.2014г. до 21.05.2014г. „Строителство и саниране-инженеринг-консулт“ ЕООД изпълни следните видове строително-монтажни работи:

1. Подмяна на дограма

- Демонтаж на стара дограма;
- Доставка и монтаж на нова PVC дограма;
- Доставка и монтаж подпрозоречни первази;
- Обръщане страници около дограма.

2. Топлоизолационна система по фасади:

- Топлоизолационна система по фасади и по калкани EPS 7см, вкл.грундиране, шпакловане и полагане на силикатна мазилка – 1685 м²;
- Топлоизолационна система по страници на прозорци EPS d=2см, вкл.грундиране, шпакловане и полагане на силикатна мазилка – 532 м.

3. Покривни работи:

- Топлоизолационна система по покрив минерална вата 10см – 1022 м²;
- Ламаринени обшивки;
- Доставка и монтаж нови улуци, водосточни тръби и казанчета.

Фирма „Строителство и саниране-инженеринг-консулт“ ЕООД работи професионално и изпълни в срок и с много добро качество строително-ремонтните работи, свързани с внедряване на мерките за енергийна ефективност в НЧ „Христо Ботев-1892“. гр. Белене.

Община Белене препоръчва фирма „Строителство и саниране-инженеринг-консулт“ ЕООД, като надежден партньор на общини, частни лица, фирми и държавната администрация за изпълнение на строително-ремонтни дейности и дейности по обновяването на сгради.

Настоящата референция се издава на „Строителство и саниране-инженеринг-консулт“ ЕООД, ЕИК 131405777 за да послужи и като доказателство за извършено строителство, при участия в процедури по Закона за обществени поръчки, във връзка с чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП.

За контакти: Цветомир Цветанов – гл. експерт „Обществени поръчки“ в Община Белене
Тел. 0658/3-46-72; obshtinabl@gmail.com
Факс: 0658/3-10-62

21.05.2014 г.
Гр. Белене

Момчил Спасов
Кмет на община Белене
Възложител по смисъла на ЗОП



Възложител: „Ем То Трейд“ ООД, гр.София, ж.к.Бояна,ул.Божур №2, ЕИК 130458691,
представявано от Тодор Ранков – управител

Изм. № 14
Дата: 3.11.2014 г.

Лице за контакти: Тодор Ранков
Тел.: 0888 563 264

ОБЕКТ: Две жилищни сгради - Сграда "А" и сграда "Б" в УПИ V - 1739, кв.32, м.
"Кръстова вада", район "Лозенец", Столична Община

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

„Ем То Трейд“ ООД дава настоящата референция за дейността на „Строителство и
саниране-инженеринг-консулт“ ЕООД в качеството и на строителна организация,
доказала коректността си като Главен изпълнител на обект: Две жилищни сгради -
Сграда "А" и сграда "Б" в УПИ V - 1739, кв.32, м. "Кръстова вада", район
"Лозенец", Столична Община



Общата стойност на изпълнените видове строително-монтажни работи по договор
от дата 06.01.2014г. възлиза на 750 674,08 лв /седемстотин и петдесет хиляди
шестстотин седемдесет и четири лева и 08 ст./ без ДДС.

[Handwritten signature]

Изпълнените видове СМР са както следва:

- Груб строеж (кофражни работи, бетонови работи, армировъчни работи)
- Архитектурни работи (зидарии, мазилка, шпакловка, боядисване с латекс, настилъчни и облицовъчни работи)
- Топлоизолационна система по фасади
- Покривни работи – плосък покрив (топлоизолация, хидроизолация, обшивка по бордове, тенекиджийски работи)
- Доставка и монтаж на PVC дограма

Сградата „А“ е със средноетажно застрояване с височина до 15 м.

Патрерът е на кота + 0,00м и представлява гаражни клетки и входно предверие към жилищата.

Вторият, третият, четвъртият и петият етаж са идентични, разположени съответно на кота +2,65, +5,50м, +8,35м и 11,22. Всеки етаж представлява по два апартамента.

Подпокривният етаж е на кота +14,03м. Тук е разположен един четиристаен апартамент.

Сградата „Б“ е с нискоетажно застрояване с височина до 10 м.

Патрерът е на кота + 0,00м и представлява гаражни клетки и входно предверие към жилищата.

Вторият, третият и четвъртият етаж са идентични, разположени съответно на кота +2,65, +5,50м и +8,35м. Всеки етаж представлява по два апартамента.

Подпокривният етаж е на кота +11,20м. Тук е разположен един тристаен апартамент.

В периода от 06.01.2014г. до 21.10.2014г. „Строителство и саниране-инженеринг-консулт“ ЕООД изпълни следните видове строително-монтажни работи:

1. Груб строеж


- Кофражни работи
- Бетонови работи
- Армировъчни работи

2. Архитектурни работи

- Зидарии
- Мазилка
- Шпакловка
- Боядисване с латекс
- Настилъчни и облицовъчни работи

3. Топлоизолационни работи

- Топлоизолационна система по фасади EPS d=8см, вкл. минерална мазилка – 1224.30 м²
- Топлоизолация по страници



4. Покривни работи



- Топлоизолация – XPS – 225,80 м²
- Хидроизолация -2 пласта битумна мембрана
- Ламаринена обшивка. олуци, водосточни тръби, водосборни казанчета

5. Доставка и монтаж на PVC дограма – 336 м²

Гореизброените видове строително-монтажни работи са изпълнени прецизно, в изключително кратки срокове – при безусловно спазване на действащата в страната нормативна техническа уредба.



Тодор Ранков – управител



Възложител: "Престиж Бизнес 93" ООД, гр.Благоевград, ул."Тодор Александров" №37

Изх. № 18.12.2014г.

Лице за контакти: Желязко Котев

Дата: 04.12.2014г.

Тел.: 0885699060

ОТНОСНО: Извършване на строително-монтажни работи в Административна сграда на Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“-МВР, гр.София

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

"Престиж Бизнес 93" ООД, дава настоящата референция за дейността на „Строителство и саниране-инженеринг-консулт“ ЕООД в качеството и на строителна организация, доказала коректността си като изпълнител на обект:

- Административна сграда на Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“-МВР



Общата стойност на изпълнените видове строително-монтажни работи по договор от 26.03.2014г. възлиза на 97 000,00 лв/ деведесет и седем хиляди лева / без ДДС.

Изпълнените видове СМР са както следва:

- Топлоизолационна система по фасади и покрив
- Покривни работи



В периода от 26.03.2014г. до 25.08.2014г. „Строителство и саниране-инженеринг-консулт“ ЕООД, изпълни следните видове строително-монтажни работи на обща стойност 97 000,00 лева без ДДС:

1. Топлоизолационна система по фасади и покрив:

- Топлоизолационна система по фасади EPS, вкл.грундиране, шпакловане и полагане на минерална мазилка – 1280 м²
- Обръщане с EPS – 1180 м
- Топлоизолационна система по покрив EPS 10см – 284 м²

2. Покривни работи

- Топлоизолационна система по покрив XPS 10см – 750 м²
- Доставка и полагане на хидроизолационна битумна мушама-2 пласта – 775 м²
- Полагане на армирана цим.замазка - 750 м²

Фирма „Строителство и саниране-инженеринг-консулт“ ЕООД работи професионално и изпълни в срок и с много добро качество строително-ремонтните работи на Административна сграда на Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“-МВР, гр.София.

„Престиж Бизнес 93“ ООД, препоръчва фирма „Строителство и саниране-инженеринг-консулт“ ЕООД, като надежден партньор на общини, частни лица, фирми и държавната администрация за изпълнение на строително-ремонтни дейности и дейности по обновяването на сгради.

04.12.2014 г.
гр.Благоевград

Георги Шапков.....
/Управител/



[Handwritten signature]



ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Пловдив, 4000, пл. "Стефан Стамболов" №1

тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703

Изм. №

15 от 868

15.01.15

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Община Пловдив, в качеството си на Възложител на обществени поръчки по чл.41, т.1 от ЗОП издава настоящото удостоверение на „СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ – ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТ“ ЕООД - гр. София, във връзка с приключилото изпълнение на договор № 14 ДГ 1274 от 15.10.2014 год. за обществена поръчка с предмет: „Подобряване енергийната ефективност на сградите на: Детски ясли „Слънчо“, ОМГ „Академик Кирил Попов“ и ОП „Чистота“ в гр. Пловдив по обособени позиции - за обособена позиция № 2 – ОМГ „Академик Кирил Попов“.

Общата стойност на изпълнените видове строително-монтажни работи възлиза на 80 702,59 лв./ осемдесет хиляди седемстотин и два лева и 59ст. / без ДДС.

Дружеството изпълни от 15.10.2014г. до 07.01.2015г. възложените му строително – монтажни работи професионално, в съответствие с нормативните изисквания и условия за безопасност на труда, в договорените срокове и с много добро качество.

Дейностите, изпълнени съгласно договора са:

по част ОВ – доставка и монтаж на водогреен котел, газова горелка, циркуляционна помпа; доставка и монтаж на топлопроводи и газопроводи, изграждане на ново котелно;

топлоизолиране на стени – топлоизолационна система по фасади EPS, вкл. грундиране, шпакловане и полагане на минерална мазилка - 213 м2, обръщане с EPS – 35 м2;

топлоизолиране на покрив – топлоизолация от минерална вата – 582 м2, доставка и монтаж на хидроизолационно поливинилхлоридно фолио – 640 м2.

Професионализмът, стриктното и коректно изпълнение на договорените задължения са предпоставка „СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ – ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТ“ ЕООД, да бъде препоръчана като надежден партньор на общини, частни лица, фирми и държавната администрация за изпълнение на строително-ремонтни дейности и дейности по обновяването на сгради.

Лице за контакт: инж. Мария Бояджиева, телефон 032 656 441

ИНЖ. ДИМИТЪР КАНАРСКИ
Зам. кмет ОСУТСИ



СПИСЪК -ДЕКЛАРАЦИЯ
на лицата, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие
при изпълнението на поръчката

Подписаният: Петкана Петрова Николова
(три имена)

Данни по документ за самоличност л.к. № 194976797, издадена на 07.02.2006 от
МВР София

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Управител (длъжност)
на "Строителство и саниране-инженеринг- консулт" ЕООД, ЕИК 131405777
(наименование на участника)

участник: "Строителство и саниране-инженеринг- консулт" ЕООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции**

Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Запад” №55 ”

ДЕКЛАРИРАМ:

На основание чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП ще използваме следния екип за изпълнение на поръчката:

Име, презиме и фамилия	Застъпник	Годишен проф. стаж	
Цветан Ивайлов Веселинов	Работник топлоизолация	8	
Владислав Александров Семиджиев	Работник топлоизолация	20	
Реджеп Реджепов Юрекчиев	Работник топлоизолация	21	
Джамал Джамал Юрук	Работник топлоизолация	15	
Калин Върбанов Димчев	Работник топлоизолация	7	
Деян Владков Вълчев	Работник	6	

	топлоизолация		
<i>Кирил Симеонов Кирилов</i>	Работник топлоизолация	34	
<i>Светослав Митков Симеонов</i>	Работник топлоизолация	10	
<i>Ивайло Георгиев Гиздов</i>	Работник топлоизолация	18	
<i>Даниел Василев Никифоров</i>	Работник топлоизолация	18	
<i>Станислав Дениров Ортакчиев</i>	Работник хидроизолация	10	
<i>Емил Георгиев Райчов</i>	Работник хидроизолация	15	
<i>Райко Валериев Йорданов</i>	Работник хидроизолация	12	
<i>Екатерина Методиева Котева</i>	Монтажник електроинста- лации	17	
<i>Вергил Вергилов Караминев</i>	Монтажник електроинста- лации	30	
<i>Сашо Валентов Миланов</i>	Работник ВИК	10	
<i>Борислав Бойков Чафадаров</i>	Работник ВИК	14	
<i>Осман Шабанов Юрекчиев</i>	Монтажник дограма	10	
<i>Юсеин Исмаил Чанта</i>	Монтажник дограма	12	

<i>Сали Али Екиз</i>	Монтажник дограма	14	
<i>Али Асан Екиз</i>	Монтажник дограма	37	
<i>Раман Али Екиз</i>	Монтажник дограма	14	
<i>Шабан Османов Барутинов</i>	Бояджия	30	
<i>Рамадан Джамал Шаиб</i>	Бояджия	29	
<i>Джамал Осман Синап</i>	Бояджия	27	
<i>Джамал Джамал Синап</i>	Общ работник	13	
<i>Нурдин Кемал Кая</i>	Общ работник	14	
<i>Айрула Салиев Кара</i>	Общ работник	10	
<i>Али Заимов Шаибов</i>	Общ работник	30	
<i>Сали Реджепов Кара</i>	Общ работник	35	
<i>Реджай Салиев Кара</i>	Общ работник	6	
<i>Фидан Митков Караиванов</i>	Общ работник	9	

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

15.05.2015 г.
(дата на подписване)

Декларатор:

ДЕКЛАРАЦИЯ*
за участието или неучастието на подизпълнители
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаната Петкана Петрова Николова, с лична карта № 194976797, издадена на 07.02.2006 от МВР София с ЕГН 5301296330, в качеството ми на Управител на "Строителство и саниране-инженеринг- консулт" ЕООД - (посочете длъжността)
(посочете фирмата на участника)

участник в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции

Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Запад” №55 ”

ДЕКЛАРИРАМ:

Участникът "Строителство и саниране-инженеринг- консулт" ЕООД (посочете фирмата на участника),
когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използва/ще използва подизпълнители;

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:.....,
(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),
които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

3. Видът на работите и дейностите, които ще извършва подизпълнителя са следните:
.....

4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

15.05.2015г.
(дата на подписване)

Декларатор:

* Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.

ИНВЕСТИБАНК АД - ОЦ СОФИЯ 2
София-1421, Бул. Черни връх 23А

Дата 18.05.2015

подписи на наредителите

Получателя ОБЩИНА БЛАГОВЕРГРАД-НАБИРАТЕЛНА С-КО

Сметка N на Получателя
233010RT00403300714000

Вид плащане

Банков код
233010RT

При банка: ИНВЕСТИБАНК БЛАГОВЕРГРАД

ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ И РООЗВЕДЕНИЕ
ЗА ПЛАЩАНЕ КЪМ ВЪДНЕТА СЪМ 16900.00

Основание за плащане: Г-Д УЧ.-ИНЖ.-ПР.НЭП.НА СЪП.НА ЖИТ.С
Със попълнение: Г-Д ОЦ 1 ЖК ЗАПАД 33 ОБЩ.БЛАГОВЕРГРАД

Вид и N документ Дата документ Период на плащане

Наредител: СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИ

Сметка на наредителя: БУЛСТАТ 131405777
11713002176000 ИЛИЧ
1331710RT00331000217600

Счетоводител:

А. М. М. М.

МОС339 ПРОВЕРКА БУДЖЕТА НА ПЛАЩАНЕ 1713002176000

БАН 0130

"ИНВЕСТИБАНК" АД
2 18.05.2015 2
ФИНАНСОВ ЦЕНТЪР "СОФИЯ-АРСЕНАЛСКИ"

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: Петкана Петрова Николова

(три имена)

Данни по документ за самоличност л.к. № 194976797, издадена на 07.02.2006 от МВР София
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Управител (длъжност)

на "Строителство и саниране-инженеринг- консулт" ЕООД -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на
Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни
сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции

Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к.
„Запад” №55 ”

ДЕКЛАРИРАМ:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

15.05.2015 г.

(дата на подписване)

Декларатор: _____

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: Петкана Петрова Николова

(три имена)

Данни по документ за самоличност л.к.№ 194976797, издадена на 07.02.2006 от МВР София
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Управител

(длъжност)

на "Строителство и саниране-инженеринг- консулт" ЕООД -
(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции

Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Запад” №55 ”

ДЕКЛАРИРАМ:

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.


Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на хипотезата по чл. 5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от процедурата по възлагане на обществената поръчка.

15.05.2015 г.

(дата на подписване)

Декларатор: _____





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №14

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Подписаната Петкана Петрова Николова
(трите имена)

Л.к.№ 194976797, издадена на 07.02.2006 от МВР София
(данните от документа за самоличност)

в качеството си на Управител
(длъжност)

на участник: "Строителство и саниране-инженеринг- консулт" ЕООД, ЕИК131405777
(наименование и данни на участника)

Във връзка с участието на "Строителство и саниране-инженеринг- консулт" ЕООД
(наименование на участника)

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет, **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Запад“ №55 ”**

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** свързано лице или свързано предприятие с кандидати или участници, подали самостоятелни оферти в процедурата.
 2. **Не съм** участвал като външен експерт в разработването на документацията за участие в настоящата процедура.
- Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 15.05.2015 г.

гр.София

ДЕКЛАРАТОР: _____



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №15

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Долуподписаната Петкана Петрова Николова с лична карта № 194976797, издадена на 07.02.2006 от МВР София, с ЕГН 5301296330, в качеството ми на Управител

(посочете длъжността)

на "Строителство и саниране-инженеринг- консулт" ЕООД,

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции**

Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Запад” №55 ”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

при определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията за минимална цена на труда, определени съгласно §1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата	<u>15/05/2015</u>
Име и фамилия	<u>Петкана Николова</u>
Длъжност	<u>Управител</u>
Подпис и печат	



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 16

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП

Долуподписаният/ната Петкана Петрова Николова, в качеството си на Управител /Управител или друг представител/ на "Строителство и саниране-инженеринг- консулт" ЕООД /посочване на наименованието на участника/,

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Техническото оборудване, с което разполагаме е следното :

1. Заваръчен апарат – 2 брой
2. Оградни пана – 200м
3. Тръбно скеле – 2000м²
4. Пробивна техника-5бр
5. Товарен автомобил-2бр

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:15.05.2015г.

ПОДПИСИ:



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 17

СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

"Строителство и саниране-инженеринг- консулт" ЕООД.. /посочете фирмата на участника/, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции

Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Запад” №55 ”

открита с решение № РП-5/ 10.03.2015 г. на Кмета на Община Благоевград

Участникът "Строителство и саниране-инженеринг- консулт" ЕООД (посочете наименованието на участника), който представлявам, ще използва следният екип за изпълнение на поръчката:

№ по ред	СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Квалификация	Общ професионален опит
1.	Промислено и гражданско строителство	Борислав Каменов Борисов	Строителен инженер	30г.
2.	Строителство на сгради и съоръжения	Гергана Мирчева Станимирова-Каменова	Строителен инженер	8г.

**общ проф.опит е опита по специалността*

№ по ред	СПИСЪК НА ПРОЕКТАНТСКИЯ ЕКИП			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Проектантска правоспособност	Общ професионален опит
1	Архитектура	Йордан Василев Радев	Пълна проектантска	43г



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

			правоспособност рег.№02166	
2	Промислено и гражданско строителство	Димитър Павлов Караколев	Пълна проектантска правоспособност рег.№01360	17г.
3	Водоснабдяване и канализация	Бранимир Велинов Велинов	Пълна проектантска правоспособност рег.№13079	15г.
4	Промислена топлотехника	Маргарита Михайлова Димитрова	Пълна проектантска правоспособност рег.№00654 Удостоверение за обследване на енергийна ефективност и сертифициране на сгради №ЕС684/27.07.2010г	35г.
5	Промислена топлотехника	Стефка Младенова Кръстева	Пълна проектантска правоспособност рег.№08447	38г
6	Електроенергетика и електрообзавеждане	Тошо Любомиров Антов	Пълна проектантска правоспособност рег.№41166	7г.
7	Строителство на сгради и съоръжения	Петя Белева Найденова	Строителен инженер	8г.
8	Промислено и гражданско строителство – Пожарна безопасност	Антон Евлогиев Ангелов	Пълна проектантска правоспособност рег.№41261	5г.
9	Промислено и гражданско строителство-организация и изпълнение на строителството(ПБЗ)	Галя Пеева Караджова	Пълна проектантска правоспособност рег.№06108	38г.

1. През целия период на изпълнение на обществената поръчка ще осигуря активното участие на горепосочените експерти.

2. Прилагам 11 броя декларации за ангажираност на експертите.

Дата: 15.05.2015г.

Декларатор :



(саморъчен пошив)

НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВНВСУ „ГЕН. БЛ. ИВАНОВ“

ДИПЛОМА

ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Борислав Борисов
Роден на 12.12.1915 г. в село Ресово

окръг Шумен, през
1937 г. завършил е
курса „ВВС“ в И
спец. сред. от изпити през ку
авния изпит

комисия
от 1973 г. е квалифи-
циран *летен инженер*

На основание указ № 1815 от 16 август
1973 година му се признава висше образование и
има приравнена гражданска квалификация *старши*
инженер по пром. и гражд. строителство


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА ИЗПИТНА

КОМИСИЯ

Ген. майор *Петров* (Петров)

НАЧАЛНИК ВНСУ *Ген. БЛ. ИВАНОВ*

Полк. общ. Кипчан *Попов* (Попов)
гр. София, 1979 г. Регистрационен № 0399

Наименование и адрес на осигурителя		"АКВА- ЛГ" ЕООД		БУДСТАТ		2 0 0 9 9 6 6 2 1									
п.к. 2300 ул. ГР. ПЕРНИК УЛ. "РЕПУБЛИКА" № 26, тел., факс., e-mail: akwa_lg@abv.bg															
Изх. №	003		дата	21.11.2012		гр.	ПЕРНИК								
УДОСТОВЕРЕНИЕ															
Удостоверява се, че /трите имена по лична карта /паспорт/		БОРИСЛАВ КАМЕНОВ БОРИСОВ						ЕГН	5 7 0 5 1 2 3 2 0 8						
Роден/а/ 12.05.1957г.		в гр./с./ СОФИЯ				област СОФИЯ									
е служител/ка/ при същото, както е означено															
Законоустановено работно време: 8 часа						Работил при непълно работно време: часа									
№ по ред	Наименование на длъжностите, които е заемал лицето					Осигурителен стаж, изчислен по реда на чл.38 и чл.39 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж									
						от ден, месец, година	до ден, месец, година	Всичко:							
								го-ди-ни	ме-се-ци	ден	ча-со-ве				
1	2					3	4	5							
1	ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ <i>два години, два месеца, един ден, нула часа</i>					30.08.2010	01.11.2012	2	2	1	0				
						Общо		2	2	1	0				
						<i>два години, два месеца, един ден, нула часа</i>									
	Извънреден гroud след 31.12.2004 г.					от ден, месец, година	от ден, месец, година	часове							
						Общо		0							
						<i>нула часа</i>									
Настоящото се издава на основание изплащателните документи, намиращи се в "АКВА- ЛГ" ЕООД, за да послужи при пенсиониране, съгласно чл. 40 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. За неверни вписвания длъжностните лица, подписали удостоверението, както и ползващите го носят отговорност по Наказателния кодекс.															
Изготвил:				Гл. счетоводител:				Ръководител:							
				Печат:											

Наименование и адрес на осигурителя	ЕТ "ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ-АКВА-ЛГ"	БУЛСТАТ	1	1	3	0	1	7	9	0	1										
п.к. 2300 ул. ГР. ПЕРНИК УЛ. "РЕПУБЛИКА" № 26, тел., факс:, e-mail: akwa_lg@mail.bg																					
Изм. №	006	дата	21.11.2012					гр.	ПЕРНИК												
УДОСТОВЕРЕНИЕ																					
Удостоверява се, че /трите имена по лична карта /паспорт/	БОРИСЛАВ КАМЕНОВ БОРИСОВ										ЕГН	5	7	0	5	1	2	3	2	0	8
Роден/а/	12.05.1957г.		в гр./с./ СОФИЯ					област СОФИЯ													
е служител/ка/ при същото, както е означено																					
Законоустановено работно време: 8 часа										Работил при непълно работно време: часа											
№ по ред	Наименование на длъжностите, които е заемало лицето										Осигурителен стаж, изчислен по реда на чл.38 и чл.39 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж										
											от ден, месец, година	до ден, месец, година	Всичко:								
													го-ди-ни	ме-се-ци	д-ни	ча-со-ве					
1	2										3	4	5								
1	ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ <i>нула години, десет месеца, петнадесет дни, нула часа</i>										15.10.2009	30.08.2010	0	10	15	0					
										Общо		0	10	15	0						
										<i>нула години, десет месеца, петнадесет дни, нула часа</i>											
Извънреден труд след 31.12.2004 г.										от ден, месец, година	от ден, месец, година	часове									
										Общо		0									
										<i>нула часа</i>											
Настоящото се издава на основание изплащателните документи, намиращи се в ЕТ "ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ-АКВА-ЛГ", за да послужи при пенсиониране, съгласно чл. 40 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. За неверни вписвания длъжностните лица, подписали удостоверението, както и ползващите го носят отговорност по Наказателния кодекс																					
Изготвил:										Гл. счетоводител:				Ръководител:							
Печат:																					

45



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Борислав Каменов Борисов

Заемана позиция Строителен инженер

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции**

Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Запад“ №55 ”

1. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

2. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.


3. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.


4. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

15.05.2015 г.

(дата на подписване)

Декларатор: .....





УНИВЕРСИТЕТ

ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО
И ГЕОДЕЗИЯ

София

СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

ДИПЛОМА

ЗА ВЪВЕЩЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БЕРГАНА МИРЧЕНА СТАНИМИРОВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТУПЕН
МАГИСТЕР

ОТВИКТОРИ

СТРОИТЕЛСТВО НА СТРАНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

ПРОФЕСОРА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ
СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЬЕР

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ ЗА ОКУПАТЕЛНО ПО УЧЕБЕН ПЛАН
10 семестъра / 5 учебни години

ДЕКАН:

проф. д-р инж. И. Дикова

РЕКТОР:

доп. д-р инж. Д. Денев

[Handwritten signatures]

101562



УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ


Ректорат: Б-ля "Хр. Симеоновски" № 1

1046 София

Република България

Тел: +359 2 96 152/6

[Handwritten signature]



ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
"МИКС"

Лиценз №200312149

гр.Казанлък

тел./факс: 0431/6 32 93; GSM: 0897 948 214

СЕРТИФИКАТ

Рег. № ...833/03.10.2014...

на
Гертана Мирчева Станмирова-Каменова

ЕГН ...8407286277...

Завършил /а курс по:

**„Контрол върху качеството на изпълнение
на строителството и за контрол на
съответствието на вложените в строежите
строителни продукти със съществените
изисквания за безопасност“**

Директор на ЦПО
към ЕТ "Иванка Мужикова - МИКС"


/Стефка Мужикова/

Дата ...03.10.2014...
гр. Казанлък

Център за професионално обучение
към ЕТ "Иванка Мужикова - Микс"
Лиценз №200312149 на НАПОО



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Гергана Мирчева Станимирова-Каменова

Заемана позиция Контрол по качеството

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции**

Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Запад” №55 ”

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

15.05.2015 г.

(дата на подписване)

Декларатор:



КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за пълна проектантска правоспособност

архитект

Йордан Василев Радев

регистрационен номер 02166

валидност: 01/01/2015 – 31/12/2015

Председател на КР
арх. Весела Георгиева

Председател на УС
арх. Владимир Дамянов

Архитектите с пълна проектантска правоспособност, записани в регистъра на Камарата на архитектите в България, с съответстваща придобитата проектантска квалификация могат да предоставят инженерски услуги и да участват в устройственото, планирано и известиционно проектиране без ограничения по вид и размер на дейността, както и извършване на строже и да упражняват контрол по изпълнение на проектите им (чл. 7, ал. 1 от Закона за КААБ).
Архитектите с пълна проектантска правоспособност могат да изработват устройствени планове, проекти по цялостен външен, интериор и дизайн, благоустройство, пожарна безопасност, план за безопасност и здраве и всички други необходими документни и термодинамични проектни части, в съответствие с придобитата им професионална квалификация.



ОПЕРАТИВНО-ПРОЕКТИРОВАТЕЛНО
ИНЖЕНЕРНО ДРУЖЕСТВО
Армеец
www.armeec.bg

УСТАВНО-ОСНОВНИ ДАННИ
ОПЕРАТИВНО-ПРОЕКТИРОВАТЕЛНО
ИНЖЕНЕРНО ДРУЖЕСТВО
ОУН ДООО
Улица "Св. Кирил и Методий" № 11
1000 СФ, БГ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 15 902 13170 010252

Застраховка ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО

На основание Въпросник-подробен и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при сключена застрахователна премия "ОД Армеец" полица за застраховка професионалната отговорност на:

Застрахован: Д-р. Георги Василев Радев, ЕГН 4602075801
ул. Св. Кирил и Методий, Христос Спасител № 64, Бх 64, 01.01.00 1
(име, имена, фирми, адрес, телефон, факс, ЕГН-ЕИИ)
тел: 0885 437929

Представяван от: _____ (име, имена, фирми, длъжност)

Професионална дейност: ☒ Проектиант Консултант А Консултант Б Строител
Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти Лице, упражняващо строителен надзор
Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор Лице, упражняващо технически контрол

Застрахователно покритие: ☒ Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект: _____
(само за Клауза Б)
Именния лист и адрес:

Лимити на отговорност (в лева): Дейност 1: Проектиант Дейност 2: _____ Дейност 3: _____
Лимит за едно събитие, в т.ч.: 30 000
лимит за имуществени вреди
лимит за немуществени вреди
лимит за едно увредено лице
Общ лимит на отговорност: 100 000

Самостоятелство на застрахования: не
Срок на застраховката: 12 месеца от 00.00 часа на 15.05.2015 до 24.00 часа на 14.05.2016
Ретроактивна дата: _____ 309

Застрахователна полица (или) С-лист на полица от 00.00 часа на 01.05.2015 г. до 24.00 часа на 14.05.2016 г. от негов (или) разпоречено лице(а) в брой (или) по банков път по сметката на застрахователя:

Застрахователна премия: 100.00 лева: 2% ЗДЗП: 2.00 лева: ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА: 102.00 лева
сключом: Смет. и ф.к. 1163

Начин на плащане: ☒ Еднократно на разпоречени вноски в брой по банков път
Вноски / Падж: I-ва 20.00 г. II-ва 20.00 г. III-ва 20.00 г. IV-ва 20.00 г.
Премия в лв: _____
2% ЗДЗП в лв: _____
Обща сума в лв: _____

В случаите на разпоречено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицата. При неплащане на разпоречена вношка от застрахователната премия застрахователят договор се прекратява в 24.00 часа на последващия ден от датата на вношка на неплащаната разпоречена вношка.

Дата и място на издаване на полицата: 14.05.2015 309, за СФ

Настоящата Полица, Въпросник-подробен и Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавки и други придружаващи документи са неразрешима част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник: Василев, Георги (име, имена, фирми, код)

Получил Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", заповях да спазва и изпълнява, не го връща:

ЗАСТРАХОВАН: Д-р. Георги Василев Радев ЗАСТРАХОВАТЕЛ: Армеец
(име, имена, фирми)



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Йордан Василев Радев

Заемана позиция Архитект-ръководител на екип

ДЕКЛАРИРАМ


1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции

Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Запад“ №55 ”

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

15.05.2015 г.
(дата на подписване)

Декларатор: 

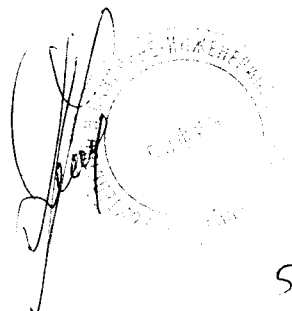



УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 01360

Важи за 2015 година

ИНЖ. ДИМИТЪР ПАВЛОВ КАРАКОЛЕВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН
МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 12/11.01.2005 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Председател на РК

инж. Р. Кордов



Председател на КР

инж. Н. Карагеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кунярев

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР **№ 04100100001562**

„ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ **В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО“**

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

„ЗД ЕВРОИНС“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ №43, ЕИК 121265113, вписано в Регистъра за търговски дружества при СГС по фирмено дело № 9078/1998 г., с Разрешение за застрахователна дейност № 8/15.06.1998 г. на ИСЗ, представлявано от Мариан Годоров Иванов, агенция София 25, аг. карта № 0015141, тел. 02/489 00 90

ЗАСТРАХОВАН:

ЕГН 7 6 0 5 0 6 6 8 2 8

Димитър Павлов Караколев

Адрес: гр. София кв. Банишора, бл. 29, вх. А, ап. 16

Лиценз № 01360

в качеството на

X ПРОЕКТАНТ - извършващ изпитателния проект

☐ КОНСУЛТАНТ: ☐ А извършващ изпитателния проект

☐ Б извършващ изпитателния проект за съответствие на спецификационния проект със съществено изпълняващ работите

☐ СТРОИТЕЛ: ☐ А извършващ изпитателния проект

☐ Б извършващ изпитателния проект за съответствие на спецификационния проект със съществено изпълняващ работите

☐ ЛИЦЕ, извършващо строителен надзор за строителство

☐ ЛИЦЕ, извършващо технически контрол по чл. 109, ал. 1, т. 1 от Закона за строителство

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

- Предмет на настоящия договор е професионалната отговорност на ЗАСТРАХОВАНИЯ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му
- Застраховката покрива професионалната отговорност на ЗАСТРАХОВАНИЯ:
 - по писмени претенции на увредените лица за имуществени и неимуществени вреди, предявени в срока на действие на застрахователния договор, включително за съдебните разходи;
 - за имуществени и неимуществени вреди вследствие на а) смърт или телесна повреда на други участници в строителството и/или на трети лица, б) материални вреди върху имуществото на други участници в строителството или на трети лица, при или по повод изпълнение на задълженията му във връзка със строителна категория ☐ първа ☐ втора X ☒ трета ☐ четвърта ☐ пета

II. ПОКРИТ РИСК:

- Опасността от възникване на отговорност на ЗАСТРАХОВАНИЯ за причинени имуществени и неимуществени вреди, вследствие на неговите неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му

III. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА:

4. В агрегат 100,000.00 / СТО ХИЛЯДИ ЛЕВА	5. За едно събитие 50,000.00 / ПЕТДЕСЕТ ХИЛЯДИ ЛЕВА
--	--

IV. ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПЕРИОД:

6. Застрахователния договор се сключва за срок от 00.00 ч на 15.05.2015 г. до 24.00 ч на 14.05.2016 г.	7. Фиксирана ретроактивна дата X да, считано от 14.05.2010 г. / ☐ не
---	--

V. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:

8. Начислена премия: 100.00 / СТО / ЛЕВА	9. Отстъпки % на основание	10. Обща застрахователна премия: 100.00 / СТО / лева
11. Данък върху застрахователната премия 2%		2.00 лв.
12. Общо дължима сума:		102.00 лв.

13. Начин на плащане: X ЕДНОКРАТНО ☐ РАЗСРОЧЕНО
☐ в брой X по банков път: BIC: FINVBG5F, IBAN: BG66FINV91501016123505, при "Първа Инвестиционна Банка" АД

	1 вноска	2 вноска	3 вноска	4 вноска
Дата на падеж:	14.05.2015 г.	 20... г	 20... г	 20... г
Застрахователна премия	100.00 лв.	лв.	лв.	лв.
Данък 2%	2.00 лв.	лв.	лв.	лв.
Общо дължима сума	102.00 лв.	лв.	лв.	лв.

14. При разсрочено плащане, когато ЗАСТРАХОВАНИЯТ закъснее с плащането на която и да е вноска, настоящата полица, съгласно чл. 202 от Кодекса за застраховане, ще се счита за прекратена автоматично след изтичането на 15-дневен срок от датата на падежа на разсрочената вноска.

VI. ДРУГИ ДОГОВОРНОСТИ:

- САМОУЧАСТИЕ на ЗАСТРАХОВАНИЯ 10 % от размера на всяка щета, но не по-малко от 1000 /хиляда/ лева;
- За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, обн. ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г., както и останалите разпоредби на българското законодателство;
- Неразделна част от настоящия застрахователен договор са:
 - Предложение-въпросник за сключване на застрахователен договор от 14.05.2015 г.

Долноподписаният, в качеството си на Застраховател/представител на Застрахования, декларирам: 1. Съгласен съм личните данни по тази полица да се използват съгласно действащото законодателство, включително за директен маркетинг; 2. Получил съм писмена информация за потребителите на застрахователни услуги.

Настоящия застрахователен договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните

Гр. София, 14.05.2015 г.

За ЗАСТРАХОВАНИЯ:

За ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ:

(подпис и печат)

(подпис и печат)



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Димитър Павлов Караколев

Заема на позиция Конструктор

ДЕКЛАРИРАМ


1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции

Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Запад“ №55 ”

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

15.05.2015 г.
(дата на подписване)

Декларатор:

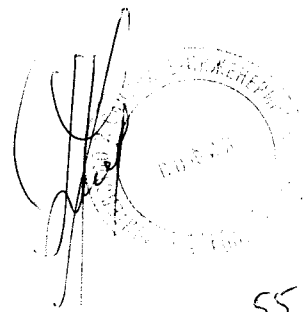

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 13079

Важн за 2015 година

ИНЖ. БРАНИМИР ВЕЛИНОВ ВЕЛИНОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН
МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

включен в регистъра на КНИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КНИП 85/27.01.2012 г. по части:

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
КОНСТРУКТИВНА НА ВК СИСТЕМИ

Председател на РК

инж. Г. Кордов



Председател на КР

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КНИП

инж. Ст. Кинарев

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР
№ 04100100001563
**„ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ
В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО“**
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

„ЗД ЕВРОИНС“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ №43, ЕИК 121265113, вписано в Регистъра за търговски дружества при СГС по фирмено дело № 9078/1998 г., с Разрешение за застрахователна дейност № 8/15.06.1998 г. на НСЗ, представлявано от Мариян Годоров Иванов, агенция София 25, аг. карта № 0015141, тел. 02/489 00 90

ЗАСТРАХОВАН:

 ЕГН:

8	2	0	6	2	9	6	3	6	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Бранимир Велинов Велинов
 Адрес: гр. София, ул. Христо Ботев № 149, ап. 10
 Лиценз № 13079
 в качеството на:

X ПРОЕКТАНТ - за извършване на проектантски проект;

☐ КОНСУЛТАНТ ☐ А за извършване на строителен проект;

☐ СТРОИТЕЛ ☐ А за извършване на изпълнение на строителството;

☐ ЛИЦЕ, упражняващо строителен надзор на строеж от пети категория;

☐ ЛИЦЕ, упражняващо проектантски контрол по мост „Бенковски мост“ на инвестиционен проект, за който не е извършена оценка за съответствие от консултант;

☐ Б за извършване на оценка за съответствие на инвестиционен проект със съществени изисквания към строежите;

☐ Б за извършване на изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи;

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

- Предмет на настоящия договор е професионалната отговорност на ЗАСТРАХОВАНИЯ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му
- Застраховката покрива професионалната отговорност на ЗАСТРАХОВАНИЯ
 - по писмени претенции на увредените лица за имуществени и неимуществени вреди, предявени в срока на действие на застрахователния договор, включително за съдебните разходи;
 - за имуществени и неимуществени вреди вследствие на а) смърт или телесна повреда на други участници в строителството и/или на трети лица; б) материални вреди върху имуществото на други участници в строителството или на трети лица;
 при или по повод изпълнение на задълженията му във връзка със строежи категория: ☐ първа ☐ втора X трета ☐ четвърта ☐ пета

II. ПОКРИТ РИСК:

- Опасността от възникване на отговорност на ЗАСТРАХОВАНИЯ за причинени имуществени и неимуществени вреди, вследствие на неговите неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му.

III. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА:

4.	В артерат 100,000.00 / СТО ХИЛЯДИ / ЛЕВА	5.	За едно събитие 50,000.00 / ПЕТДЕСЕТ ХИЛЯДИ / ЛЕВА
----	---	----	---

IV. ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПЕРИОД:

6.	Застрахователния договор се сключва за срок от 00.00 ч. на 15.05.2015 г. до 24.00 ч. на 14.05.2016г.	7.	Фиксирана ретроактивна дата X да, считано от 14.05.2010 г. / ☐ не
----	---	----	---

V. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:

8.	Начислена премия: 100.00 / СТО / ЛЕВА	9.	Отстъпки: % на основание	10.	Обща застрахователна премия: 100.00 / СТО / лева
11.	Данък върху застрахователната премия 2%				2.00 лв.
12.	Общо дължима сума:				102.00 лв.
13.	Начин на плащане: X ЕДНОКРАТНО ☐ РАЗСРОЧЕНО ☐ в брой X по банков път: BIC: FINVBGSG, IBAN: BG66FINV91501016123505, при "Първа Инвестиционна Банка" АД				
Дата на падеж:	1 вноски 14.05.2015 г.	2 вноски 20 г.	3 вноски 20 г.	4 вноски 20 г.	
Застрахователна премия	100.00 лв.	лв.	лв.	лв.	лв.
Данък 2%	2.00 лв.	лв.	лв.	лв.	лв.
Общо дължима сума	102.00 лв.	лв.	лв.	лв.	лв.

14. При разсрочено плащане, когато ЗАСТРАХОВАНИЯТ закъснее с плащането на която и да е вноски, настоящата полица, съгласно чл. 202 от Кодекса за застраховане, ще се счита за прекратена автоматично след изтичането на 15-дневен срок от датата на падежа на разсрочената вноски.

VI. ДРУГИ ДОГОВОРНОСТИ:

- САМОУЧАСТИЕ на ЗАСТРАХОВАНИЯ 10 % от размера на всяка щета, но не по-малко от 1000 /хиляди/ лева.
- За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, обн. ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г., както и останалите разпоредби на българското законодателство.
- Неразделна част от настоящия застрахователен договор са:
 - Предложение-въпросник за сключване на застрахователен договор от 14.05.2015 г.



Долноподписаният, в качеството си на Застрахован-представител на Застрахования, декларирам: 1. Съгласен съм личните данни по тази полица да се използват съгласно действащото законодателство, включително за директен маркетинг; 2. Получил съм писмена информация за потребителите на застрахователни услуги.

Настоящия застрахователен договор се изготвя и подписва в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните

Гр. София, 14.05.2015 г.

За ЗАСТРАХОВАНИЯ:

За ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ:



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Бранимир Велинов Велинов

Заемана позиция Проектант по част ВИК

ДЕКЛАРИРАМ


1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции

Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Запад“ №55 ”

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

15.05.2015 г.
(дата на подписване)

Декларатор: 





УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 00654

Важи за 2015 година

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Регистрационен № 00654

инж. МАРГАРИТА
МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА

инж. МАРГАРИТА МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН
МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

МАШИНЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 09/21.08.2004 г. по части:

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ, ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛО И
ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

Председател на РК

инж. Г. Кордов




Председател на КР

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Китарев



ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
София

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

№ ЕС 684 / 27 юли 2010 г.

МАРГАРИТА МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА

ЕГН 5812196270, родена на 19 декември 1958 година
в гр. София, област София, Република България,
завърши курс на обучение с общ хорариум 90 часа по

ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ

и положи успешно изпит на 27 юли 2010 г.

Настоящото удостоверение се издава на основание чл. 23, ал. 1, т. 3(б)
от ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

РЕКТОР

(Проф. д-р инж. Камен ВЕСЕЛИНОВ)
(печат на ГД "Технически университет - София")

Тел.: (359 2) 965 21 11
Факс: (359 2) 868 32 15
www.tu-sofia.bg

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
1000 София
бул. „Климент Охридски“ № 8



ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИСА № 009733

Застраховка ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО

Застрахован: г-н. Маргарита Михайлова
ср. Св. Нев. № 31
Представяван от: г-н. [Signature]

Професионална дейност: ☒ Проектир. ☐ Консултант А ☐ Консултант Б ☐ Строител
Консултант А: ☐ Консултант, отговарящ за извършването на инвестиционен обект
Консултант Б: ☐ Консултант, отговарящ за строителния процес
Застрахователно покритие: ☒ Категория А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ ☐ Категория Б - само за един обект по чл. 171 от ЗУТ

Ст. ☒ Телен обект: Домо-стабилизатор
г-н. [Signature]

Лимити на отговорност (в лева):
Дейност 1: проектир. Дейност 2: Дейност 3:
Лимит за едно събитие, в т.ч.:
- лимит за имуществени вреди
- лимит за немуществени вреди
- лимит за едно увредено лице
Общ лимит на отговорност: 100 000

Самостоятелство на застрахования:
Срок на застраховката: 26.01.2015 до 24.01.2016
Ретроактивна дата: 26.01.10

Застрахователна премия: 100 2% ЗДЗП 2 ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА 102
Начин на плащане: ☒ Еднократно ☐ В срок
Вноска / Плащане: 100
Премия в лв.: 100
2% ЗДЗП в лв.: 2
Обща сума в лв.: 102

Дата и място на издаване на полисата: 26.01.2015 г. София

Застрахователен подпис: [Signature]
Застрахован: [Signature]



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Маргарита Михайлова Димитрова

Заема на позиция Проектант по част Енергийна ефективност


ДЕКЛАРИРАМ


1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции

Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Запад” №55 ”

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

15.05.2015 г.
(дата на подписване)

Декларатор: 





УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 08447

Важи за 2015 година

ИНЖ. СТЕФКА МЛАДЕНОВА КРЪСТЕВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН
МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

МАШИНЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 13/11.02.2005 г. по части:

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ, ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛО И
ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

Председател на РК

инж. Г. Кордов



Председател на КР

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР
№ 04100100001561
„ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ
В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО“
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

„ЗД ЕВРОИНС“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ №43, ЕИК: 121265113, вписано в Регистъра за търговски дружества при СГС по фирмено дело № 9078/1998 г., с Разрешение за застрахователна дейност № 8/15.06.1998 г. на НСЗ, представлявано от Мариян Тодоров Иванов, агенция София 25, ал. карта № 0015141, тел.: 02/ 489 00 90

ЗАСТРАХОВАН:
СТЕФКА МЛАДЕНОВА КРЪСТЕВА

ЕГН: 4 8 0 9 0 1 1 7 5 9

Адрес: гр. София, ж.к. Надежда, бл. 102, ах. Д, ет. 3, ап. 99

Лиценз: № 08447

в качеството на

X ПРОЕКТАНТ - за извършване на проектантски услуги

☐ **КОНСУЛТАНТ** ☐ **A** за извършване на строителски работи ☐ **B** за извършване на работи за съответствието на инвестиционния проект със съществуващите строителни обекти

☐ **СТРОИТЕЛ** ☐ **A** за извършване на строителни работи ☐ **B** за извършване на работи за съответствието на инвестиционния проект със съществуващите строителни обекти

☐ **ЛИЦЕ** - извършващо строителен надзор на строеж от неговите собственици

☐ **ЛИЦЕ** - извършващо технически контрол на строеж - Конструктивна, на инженеринговия проект, за който не е извършено одит за отговорност от консултант

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

- Предмет на настоящия договор е професионалната отговорност на ЗАСТРАХОВАНИЯ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му.
- Застраховката покрива професионалната отговорност на ЗАСТРАХОВАНИЯ:
 - по писмени претенции на увредените лица за имуществени и неимуществени вреди, предявени в срока на действие на застрахователния договор, включително за съдебните разходи;
 - за имуществени и неимуществени вреди вследствие на а) смърт или телесна повреда на други участници в строителството и/или на трети лица; б) материални вреди върху имуществото на други участници в строителството или на трети лица;

 при или по повод изпълнение на задълженията му във връзка със строежи категория: ☐ първа ☐ втора ☒ трета ☐ четвърта ☐ пета

II. ПОКРИТ РИСК:

- Опасността от възникване на отговорност на ЗАСТРАХОВАНИЯ за причинени имуществени и неимуществени вреди, вследствие на неговите неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му.

III. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА:

4. В асертат 100.000 00 / СТО ХИЛЯДИ / ЛЕВА	5. За едно събитие 50.000 00 / ПЕТДЕСЕТ ХИЛЯДИ / ЛЕВА
--	--

IV. ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПЕРИОД:

6. Застрахователния договор се сключва за срок от 00.00 ч. на 15.05.2015 г. до 24.00 ч. на 14.05.2016г.	7. Фиксирана ретроактивна дата ☒ да, считано от 14.05.2010 г. / ☐ не
--	--

V. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:

8. Начислена премия: 100.00 / СТО / ЛЕВА	9. Отстъпки % на основание	10. Обща застрахователна премия 100.00 / СТО / лева
---	-------------------------------	--

 11. Данък върху застрахователната премия 2% 2.00 лв.

 12. Общо дължима сума: 102.00 лв.

 13. Начин на плащане: ☒ ЕДНОКРАТНО ☐ РАЗСРОЧЕНО
☐ в брой ☒ по банков път: BIC: FINVBGSF / IBAN: BG66FINV91501016123505, при "Първа Инвестиционна Банка" АД

Дата на падеж:	1 вноски	2 вноски	3 вноски	4 вноски
	14.05.2015 г.	 20	 20	 20
Застрахователна премия	100.00 лв.	лв.	лв.	лв.
Данък 2%	2.00 лв.	лв.	лв.	лв.
Общо дължима сума:	102.00 лв.	лв.	лв.	лв.

14. При разсрочено плащане, когато ЗАСТРАХОВАНИЯТ закъснее с плащането на която и да е вноски, настоящата полица, съгласно чл. 202 от Кодекса за застраховане, ще се счита за прекратена автоматично след изтичането на 15-дневен срок от датата на падежа на разсрочената вноски

VI. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ:


- САМОУЧАСТИЕ на ЗАСТРАХОВАНИЯ 10 % от размера на всяка щета, но не по-малко от 1000 хиляди лева.
- За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, обн. ДВ. бр. 17 от 02.03.2004 г., както и останалите разпоредби на българското законодателство.
- Неразделна част от настоящия застрахователен договор са
 - Предложение-въпросник за сключване на застрахователен договор от 14.05.2015 г.

Долуподписаният, в качеството си на Застрахован, представяйки на Застрахования декларирам: 1. Съгласен съм личните данни по тази полица да се използват съгласно действащото законодателство, включително за директен маркетинг; 2. Получил съм писмена информация за потребителските на застрахователни услуги.


Настоящия застрахователен договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните

Гр. София, 14.05.2015 г.

За ЗАСТРАХОВАНИЯ:


 (подпис и печат)

За ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ:


 (подпис и печат)



О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Стефка Младенова Кръстева

Заемана позиция Проектант по част ОВК

ДЕКЛАРИРАМ


1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции

Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Запад” №55 ”

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

15.05.2015 г.
(дата на подписване)

Декларатор:



УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 41166

Важи за 2015 година

ИНЖ. ТОШО ЛЮБОМИРОВ АНТОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР ПО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 88/04.05.2012 г. по части:

ЕЛЕКТРИЧЕСКА

Председател на РК

инж. Г. Кордов

Председател на КР

инж. Н. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. С. Кирков



И - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
София, ул. "Г. Бенковски" № 3
железница № 3 и № 77 на НСЗ
121718407
на авенция София
к: гр.София, ул. "Г.Бенковски" 3



Национален номер 0700 16 11
www.dzi.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 212215213000200 / 14.05.2015
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА

"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

И - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна агенция София, АДРЕС гр.София, ул. "Г.Бенковски" 3 НА ОСНОВАНИЕ
ТЕНА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА
ИЦА:

ТРАХОВАН: Име: ТОШО ЛЮБОМИРОВ АНТОВ
ЕГН: 8310181724
Адрес: Домашен: гр.София, ж-к. "Люлин", бл.815, вх. Б, ап.33
Представявано от:

ДМЕТ НА ТРАХОВКАТА: Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници
строителството и/или на други трети лица вследствие на неправомерни действия и
бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионална
му дейност.

ТРАХОВАТЕЛНО РИТИЕ: Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална
отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална
отговорност на проектанта"

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ТРАХОВАНИЯ: Изработване на инвестиционни проекти за обекти от трета категория и всяка по-ниска
категория, съгласно действащото законодателство.

ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ: Лимит за един иск: 50,000 лв.
Лимит за всички искове: 100,000 лв.

УЧАСТИЕ НА ТРАХОВАНИЯ: Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя
сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по-малко от 500 лв.

СРОК НА ТРАХОВКАТА: 1 година

НАЧАЛО: 00:00 часа на 15.05.2015 г.

КРАЙ: 24:00 часа на 14.05.2016 г.

ПРОАКТИВНА ДАТА: 15.05.2012

ТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ: 100.00 лв.

Словом: сто лв.

СК I-ва вноска

А: 14.05.2015

МЕР НА ВНОСКАТА: 100.00 лв.

ЪК 2% ВЪРХУ ЗП: 2.00 лв.

КА СУМА: 102.00 лв.

КА - ДАНЫК 2% ВЪРХУ ЗП:

ДЪЛЖИМ ДАНЫК ВЪРХУ ЗП: 2.00 лв. Словом: две лв.

КА ДЪЛЖИМА СУМА: 102.00 лв. Словом: сто две лв.

КА ДЪЛЖИМА СУМА: КА ДЪЛЖИМА СУМА
КА ДЪЛЖИМА СУМА + ДАНЫК 2% ВЪРХУ ЗП

ЦИАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ: Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност
свързана с категория строителство, за която са предвидени по-високи минимални лимити
отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно т.15.2 от ОУ на задължителна
застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането
строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор
срещу заплащане на допълнителна премия.

14.05.2015 11:13:24 JDI/7851
64

[illegible]

настъпване на застрахователно събитие по настъпващата полица следва да уведомите Застрахователя писмено на адрес: ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД, Централно управление, гр.София 1000, ул."Г.Бенковски" №3, тел.: (02) 902 72 26 и (02) 981 57 21, отговорност: claims@dzf.bg

ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

ЗА
ЗАСТРАХОВАНИЯ
























[Handwritten signature]



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Тошо Любомиров Антов

Заемана позиция Проектант по част Електро

ДЕКЛАРИРАМ


1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции

Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Запад” №55 ”



2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

15.05.2015 г.
(дата на подписване)


Декларатор:



69



[Handwritten signature]



УНИВЕРСИТЕТ
ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО
И ГЕОДЕЗИЯ

София

СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

ДИПЛОМА
ЗА ВЪВЕДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ

НА

ПЕТЯ БЕЛЕВА БЕЛЕВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

СПЕЦИАЛНОСТ

СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

ПРОФЕССИОНАЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИ ПЛАН

10 семестъра / 5 учебни години

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

Ректорат: бул. "Хр. Смирненски" № 1

1046 София

Република България

Тел.: +359 2 9635245

ДЕКАН:

проф. д-р инж. Г. Давковски

РЕКТОР:

доц. д-р инж. Д. Делев

ПЕТЯ БЕЛЕВА БЕЛЕВА

ЕГН 8404211438, роден(а) на 21.04.1984 г.

гр. Велико Търново

област Велико Търново

Република България

гражданин на Република България

завършил(а) през 2008 година

СРЕДЕН УСПЕХ ОТ КУРСА НА ОБУЧЕНИЕ

мл. добър 4.64

ОБЩ БРОЙ КРЕДИТИ ОТ КУРСА НА ОБУЧЕНИЕ

271

СРЕДЕН УСПЕХ ОТ ЗАДАЧА НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА

мл. добър 4.75

БРОЙ КРЕДИТИ ОТ ДИПЛОМИРАНЕ

30

ОБЩ БРОЙ КРЕДИТИ ОТ КУРСА НА ОБУЧЕНИЕ

301

ПРОТОКОЛ НА ДЪРЖАВНАТА ИЗВИЩНА КОМИСИЯ

№ 069 / 03.07.2008 г.

ДЕКАН.

проф. д-р кн. инж. Ц. Даконски

Серия УАСГ-2008

Регистрационен номер 36521 / 2008 г.

ДИПЛОМА

ЗА ВЪВЕДЕНИЕ


ОБРАЗОВАНИЕ



Handwritten signature



www.zbut.net



ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
"МИКС"

Лиценз №200312149

гр. Казанлък

тел./факс: 0431/6 32 93; GSM: 0897 948 214

СЕРТИФИКАТ

Рег. № 963/16.03.2015

на

Петя Белева Найденова

ЕГН 8404211438

Завършил / а курс
"КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСНОСТ
И ЗДРАВЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО"

Настоящото да послужи пред Възложителите във връзка с чл. 5 ал. 2 от НАРЕДБА № 2 от 22 Март 2004г. За минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи /ДВ. Бр.37 от 2004 г./ Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Директор на ЦПО
към ЕТ "Иванка Мужикова - МИКС"


/Стефка Мужикова/

Дата **16.03.2015**
гр. Казанлък

www.zbut.net

Център за професионално обучение
към ЕТ "Иванка Мужикова - Микс"
Лиценз №200312149 на НАПОО



О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Петя Белева Найденова

Заемана позиция Специалист по здравословни и безопасни условия на труд

ДЕКЛАРИРАМ


1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции

Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Запад“ №55 ”

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

15.05.2015 г.
(дата на подписване)

Декларатор:


43



УДОСТОВЕРЕНИЕ

за пълна проектантска правоспособност
по интердисциплинарна част
пожарна безопасност

Регистрационен номер № 41261

Важи за 2015 година

ИНЖ. АНТОН ЕВЛОГИЕВ АНГЕЛОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР ПО ПРОМИШЛЕНО И ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП от 98/26.04.2013 г. по части:

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ изпълнена
СЪГЛАСНО ЗУТ И НАРЕДБА № 4 ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КЪМ ЧЛ. 4, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 1, 1971 ЗА СПИНОБП

ВАЖИ САМО ЗА МАРКИРАНИТЕ РАЗДЕЛИ:

"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - КОНСТРУКТИВЕН"
"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ЕЛЕКТРИЧЕСКИ"
"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО"
"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ОТОПИТЕЛНА, ВЕНТИЛАЦИОННА, КЛИМАТИЧНА И ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ГОПЛО- И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ"
"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО"
"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ТЕХНОЛОГИЧЕН"
"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ И ЕКОЛОГИЯ"
"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ГЕОДЕЗИЯ И ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ"
"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ТЕХНИЧЕСКА ЗАПИСКА И ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ"

Председател на РК

инж. Г. Кордов



Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

Председател на КР

инж. И. Каралеев

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР **№ 04100100001564**

„ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО“

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

„ЗД ЕВРОИНС“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ №43, ЕИК 121265113, вписано в Регистъра за търговски дружества при СГС по фирмено дело № 9078/1998 г., с Разрешение за застрахователна дейност № 8/15.06.1998 г. на НСЗ, представявано от Мариян Тодоров Иванов, агенция София 25, аг. карта № 0015141, тел. 02/489 00 90

ЗАСТРАХОВАН:

ЕГН: 6 6 0 5 2 3 7 0 4 5

Антон Евлогиев Ангелов
Адрес: гр. София, кв. Суходол р-н Овча купел, ул. Траян Танев № 16
Лиценз № 41261
в качеството на:
X ПРОЕКТАНТ - извършване на инженерно проектиране

- ☐ КОНСУЛТАНТ: ☐ А за извършване на оценка за съответствието на инвестиционен проект със съществено повишаване на безопасността.
☐ СТРОИТЕЛ: ☐ А за извършване на строителство.
☐ ЛИЦЕ, упражняващо строителен надзор по проект от друга категория.
☐ ЛИЦЕ, упражняващо технически контрол по част „Конструкция“ на инвестиционен проект, за който не е извършена оценка за съответствие от консултант.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

- Предмет на настоящия договор е професионалната отговорност на ЗАСТРАХОВАНИЯ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му.
- Застраховката покрива професионалната отговорност на ЗАСТРАХОВАНИЯ:
 - по писмени претенции на увредените лица за имуществени и неимуществени вреди, предявени в срока на действие на застрахователния договор, включително за съдебните разноски;
 - за имуществени и неимуществени вреди вследствие на: а) смърт или телесна повреда на други участници в строителството и/или на трети лица, б) материални вреди върху имуществото на други участници в строителството или на трети лица, при или по повод изпълнение на задълженията му във връзка със строежи категория ☐ първа ☐ втора X ☒ трета ☐ четвърта ☐ пета

II. ПОКРИТ РИСК:

- Опасността от възникване на отговорност на ЗАСТРАХОВАНИЯ за причинени имуществени и неимуществени вреди, вследствие на неговите неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му.

III. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА:

4	В агрегат 100,000.00 / СТО ХИЛЯДИ ЛЕВА	5	За едно събитие 50,000.00 / ПЕТДЕСЕТ ХИЛЯДИ ЛЕВА
---	---	---	---

IV. ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПЕРИОД:

6	Застрахователния договор се сключва за срок от 00.00 ч. на 15.05.2015 г. до 24.00 ч. на 14.05.2016г.	7	Фиксирана ретроактивна дата X да, считано от 14.05.2010 г. / ☐ не
---	---	---	---

V. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:

8	Начислена премия: 100.00 / СТО / ЛЕВА	9	Отстъпки % на основание	10	Обща застрахователна премия: 100.00 / СТО / лева
11	Данък върху застрахователната премия 2%				2.00 лв.
12	Общо дължима сума:				102.00 лв.
13	Начин на плащане: X ЕДНОКРАТНО ☐ РАЗСРОЧЕНО				
	☐ в брой				X по банков път: BIC: FINVBGSE; IBAN: BG66FINV91501016123505, при "Първа Инвестиционна Банка" АД

	1 вноска 14.05.2015 г.	2 вноска 20 .. г.	3 вноска 20 .. г.	4 вноска 20 .. г.
Дата на падеж:				
Застрахователна премия	100.00 лв.	лв.	лв.	лв.
Данък 2%	2.00 лв.	лв.	лв.	лв.
Общо дължима сума	102.00 лв.	лв.	лв.	лв.

14 При разсрочено плащане, когато ЗАСТРАХОВАНИЯТ закъснее с плащането на която и да е вноска, настоящата полица, съгласно чл. 202 от Кодекса за застраховане, ще се счита за прекратена автоматично след изтичането на 15-дневен срок от датата на падежа на разсрочената вноска.

VI. ДРУГИ ДОГОВОРНОСТИ:


- САМОУЧАСТИЕ на ЗАСТРАХОВАНИЯ 10 % от размера на всяка щета, но не по-малко от 1000 (хиляда) лева;
- За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, обн., ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г., както и останалите разпоредби на българското законодателство;
- Неразделна част от настоящия застрахователен договор са:
 - Предложение-въпросник за сключване на застрахователен договор от 14.05.2015 г.

Долуподписаният, в качеството си на Застрахован/представител на Застраховател, декларирам: 1. Съгласен съм личните данни по тази полица да се използват съгласно действащото законодателство, включително за директен маркетинг; 2. Получавам съгласна писмена информация за потребителите на застрахователни услуги.


Настоящия застрахователен договор се изготвя и подписва в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните

Гр. София, 14.05.2015 г.

За ЗАСТРАХОВАНИЯ:


(подпис и печат)

За ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ:


(подпис и печат)



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Антон Елогиев Ангелов

Заемана позиция Проектант по част Пожарна безопасност

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции

Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Запад” №55 ”

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

15.05.2015 г.
(дата на подписване)

Декларатор:



УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 06108

Важи за 2015 година

ИНЖ. ГАЛЯ ПЕЕВА КАРАДЖОВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН
МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 36/18.05.2007 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Председател на РК

инж. Т. Кордов



Председател на КР

инж. И. Каратеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кидарев



камара на инженерите в инвестиционното проектиране

СЕРТИФИКАТ

№1313/12.01.2015 г.

инж. Галя Пеева Караджова

проектант с регистрационен номер 06108

завърши успешно курс на обучение:

Нормативен контекст, основни положения и практически указания по приложението на НАРЕДБА за Управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

Генерален секретар на КИИП

Главен секретар на КИИП

Курсовете са организирани от ЦО на КИИП.



инж. Сил-Кинтерес



Застрахователно
акционерно дружество
Армеец
www.armeec.bg

ОБЩО ДЪЖИМА СУМА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ПОЛИСА
ПОЛИСА

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИСА № 74 902 13170 009419

Застраховка ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО

На основание Въпросник предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: ИНЖ. ТАНЯ ПЕТВА КАРДЖИСКА - гр. София
гр. Белас Анчаков № 19, вх. А, ет. 1, кв. 1
(трите имена, фирма, адрес, телефон, факс, ЕГН/ЕИК) ЕГН 5942036276
Представяван от: _____
(трите имена, длъжност) тел. 0889 66 15 13

Професионална дейност: ☒ Проектант ☐ Консултант А ☐ Консултант Б ☐ Строител ☐ Лице, упражняващо строителен надзор
Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти ☐ Лице, упражняващо технически контрол
Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор
Застрахователно покритие: ☒ Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ ☐ Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

проутелен обект: _____
(само за Клауза Б)
наименование и адрес: _____

Лимити на отговорност (в лева): Дейност 1: Проектиране Дейност 2: _____ Дейност 3: _____
Лимит за едно събитие, в т.ч.: 52 000
лимит за имуществени вреди
лимит за неимуществени вреди
лимит за едно увредено лице
Общ лимит на отговорност 100 000

Самоучастие на застрахования: 40
Срок на застраховката: 12 месеца от 00.00 часа на 03.12.2014г. до 24.00 часа на 02.12.2015г.
Ретроактивна дата: 03.12.09 год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя

Застрахователна премия: 100 лева; 2% ЗДЗП: 2 лева; ОБЩО ДЪЖИМА СУМА: 102 лева.
свтом: сто и два лева

Начин на плащане: ☒ еднократно ☐ на разсрочени вноски ☒ в брой ☐ по банков път
Вноски / Паджж I-ва / _____ 20 _____ г. II-ра / _____ 20 _____ г. III-та / _____ 20 _____ г. IV-та / _____ 20 _____ г.
Премия в лв: _____
2% ЗДЗП в лв: _____
Обща сума в лв: _____

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полисата. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователят договор се прекратява в 24.00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа на неплатената разсрочена вноска

Дата и място на издаване на полисата: 26.11.2014 год. гр. София

Настоящата Полиса, Въпросник-предложение, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавки и други придружаващи документи са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник: БРАДЪ ЛИНС ЕООД
(трите имена, адрес, код)

Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", запознах се с тях и заявявам, че ги приемам.

ЗАСТРАХОВАН: _____ (подпис и печат)
ЗАСТРАХОВАТЕЛ: _____ (подпис и печат)



О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Галя Пеева Караджова

Заемана позиция ПБЗ


ДЕКЛАРИРАМ


1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открит процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции**

Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Запад“ №55 ”

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

15.05.2015 г.
(дата на подписване)

Декларатор:





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 18

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ

"Строителство и саниране-инженеринг- консулт" ЕООД /посочете фирмата на участника/, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции

Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Запад” №55 ”

открита с решение № РП-5/ 10.03.2015 г. на Кмета на Община Благоевград

	име	мярка	к-во
1	скеле фасадно	м2	4 908,12
2	ГРУНД БЕТОНКОНТАКТ	л.	872,32
3	EPS теразид	м3	209,49
4	дюбели теразид	бр.	31 074,80
5	лепило за EPS Теразид	кг	23 063,00
6	стъклофибърна мрежа Теразид 0,145кг/м2	м2	4 556,49
7	Шпакловка за ТИ Теразид	кг	21 363,00
8	ръбохранители	м	2 777,78
9	водооткапващ профил	м	1 077,78
10	грунд теразид	кг	908,32
11	мазилка минерална-бял	кг	12 574,80
12	МАЗИЛКА ДЕКОРАТИВНА	кг	960,00
13	плочи мултипор	м2	429,00
14	лепило за мултипор	кг	1 716,00
15	ПАРОИЗОЛАЦИОННО ФОЛИО	м2	453,20
16	замазка циментова	м3	4,80
17	ГРУНД БИТУМЕН	л.	238,86
18	ХИДРОИЗОЛАЦИОННА МЕМБРАНА 3,5КГ БЕЗ ПОСИПКА	м2	915,63



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

19	ХИДРОИЗОЛАЦИОННА МЕМБРАНА 4КГ С ПОСИПКА	м2	1 038,13
20	ламарина поцинкована 0,5мм	м2	301,41
21	PVC ДОГРАМА	м2	507,00
22	AL ДОГРАМА	м2	90,00
23	GKB 12,5	м2	510,00
24	ЛЕПИЛНА СМЕС ЗА ГИПСОКАРТОН	кг	1 224,00
25	РЪБОХРАНИТЕЛ	м	1 020,00
26	гипсова шпакловка	кг	1 650,00
27	латекс	л.	791,00
28	подпр.перваз външен 17см	м	680,00
29	подпр.перваз вътрешен 20см	м	340,00
30	каменна вата 12см	м2	453,20
31	грунд полимерен	л.	11,00
32	полим.модифиц.циментова мазилка	кг	82,50
33	МАЗИЛКА ВАРО-ЦИМЕНТОВА	кг	3 800,00
34	БЛАЖНА БОЯ	кг	277,50
35	пожарна касета	бр.	14,00
36	струйник	бр.	14,00
37	пожарен шланг	бр.	14,00
38	пожарен кран	бр.	14,00
39	ППР тръби 1 1/2"	м	350,00
40	фотинги ППР тръба 1 1/2"	бр.	350,00
41	Изолация тръбна Ф54	м	350,00
42	ОСВЕТИТЕЛ С ФОТОКЛЕТКА	бр.	70,00
43	мълниеприеман прът 4м	бр.	2,00
44	заземителни колове	бр.	4,00
45	съединител прав	бр.	4,00
46	алуминиево въже	м	108,00
47	шина 4x40	м	20,00
48	СВТ 3x1,5	м	140,00
49	тръба гофрирана Ф23	м	470,00
50	гофрирана тръба Ф29	м	810,00
51	СВТ 3x10мм2	м	470,00
52	СВТ 5x16мм2	м	810,00
53	ел.табла	бр.	14,00
54	ГРТ	бр.	1,00
55	итонг 125x250x600	бр.	750,00
56	лепилен разтвор	кг	1 800,00



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

		кг	3 930,00
57	вароциментова мазилка	м3	0,78
58	дървен материал	л.	9,80
59	лак за дърво	бр.	98,00
60	болтове	бр.	1,00
61	система за центр.управление		

Към декларацията прилагам следните сертификати за съответствие:

1. Декларация за съответствие от Тракон България ЕООД
2. Декларация за съответствие от Бетек Боя
3. Декларация за експлоатационни показатели от Теразид ЕООД №20130709-77-1-Д
4. Декларация за експлоатационни показатели от Теразид ЕООД №20130709-66-Д
5. Декларация за експлоатационни показатели от Теразид ЕООД №20130709-07-Д
6. Декларация за експлоатационни показатели от Теразид ЕООД №20130709-64-1-Д
7. Декларация за експлоатационни показатели от Теразид ЕООД №20130709-78-Д
8. Декларация за експлоатационни показатели от Теразид ЕООД №20130709-79-Д
9. Декларация за съответствие от Марисан и Колев ООД
10. Декларация за съответствие от Мегахим АД
11. Декларация за съответствие от Елкабел АД
12. Декларация за съответствие от Билдинг компани ЕООД и Протокол от първоначално изпитване № ИТТ-08.44К/08.04.2010г.
13. Декларация за съответствие от Кнауф България ЕООД
14. Декларация за хидроизолационна мембрана от Ади-комерс ЕАД-2бр. и технически характеристики
15. Декларация за съответствие за поцинкована ламарина от Тисен груп-Юпитер стомана
16. Декларация за съответствие за изделия от поцинкована ламарина от Тето ЕООД

УЧАСТНИК:.....
/П.Николова-Управител/



ЕО - Декларация за съответствие

"Тракон България" ЕООД

София 1784, бул. "Цариградско шосе" 131, офис 407

декларира съгласно § 9 от Директивата на ЕС за Строителните
Продукти (89/106/ЕЕС), че продуктът

GHP 210 SV


Основна хастарна варо-циментова мазилка

е произведена от Thrakon S.A., Сингру Авеню 130, 17671 Атина
във фабриката на Thrakon в Орестиада,

е в съответствие с хармонизиран продуктов стандарт EN 998-1/2003
и отговаря на изискванията за поставяне на CE - маркировка съгласно
таблица ZA.1 от този стандарт.

Декларацията се издава и на базата на издадени от производителя
Сертификат за производствен контрол съгласно хармонизиран стандарт
EN 998-1/2003. Първоначалните тестове са извършени в лабораторията
на Thrakon A.S., Неохори 68200, Орестиада (Протокол 00123)

София, 01.11.2011 г.



Станмир Узунов
Генерален Мениджър

Тракон България ЕООД
1784 София, бул. Цариградско Шосе 131, АТМ Център, ет.4, офис 407
Тел: 02/ 965 85 88; Факс: 02/ 965 85 98

Превод от английски език

ВЕТЕК

19 март 2012 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Фасаген

ПРОДУКТ	ИДЕНТИФИКАЦИЯ		
	Betek		
Производител	Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş.		
Място на производство	Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova Alanı 3200 улица № 3206 Гебзе/Коджаели		
Определение на продукта	Beteksilan Силиконов фасаген		
Изпитваща лаборатория	TSE Laboratory Гебзе/КОДЖАЕЛИ		
Информация за означенията	Гланц	TS 4318 EN ISO 2813	Клас G3
	Дебелина на сухия филм	TS EN 1062-1	Клас E2
	Размер на частиците	TS 2620 EN ISO 1524	Клас S1
	Пропускливост на водни пари	TS EN ISO 7783-2	Клас V1
	Пропускливост на течна вода	TS EN 1062-3	Клас W1
	Свойства за покриване на пукнатини	EN 1062-7	Клас A0
	Пропускливост на въглероден диоксид	TS EN 1062-6	Клас C0
	Устойчивост на развитие на плесен	TS 13200	Клас K2

/подпис-не се чете/

Джюнейт Енсари

Мениджър „Маркетинг“

Адрес: Gebze Organize Sanayi Bölgesi
Tembelova Alanı 3200 улица № 3206 Гебзе/Коджаели
Телефон: 0262 678 30 00, Факс: 0262 678 33 63

Долуподписаната Илияна Костадинова Костадинова удостоверявам верността на превода, извършен от мен от английски на български език на приложения документ – Декларация за съответствие. Преводът се състои от 1 /една/ страница.

Преводач:

Илияна Костадинова Костадинова



Handwritten signature



Производство и пламент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 20130709-64-1-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

PVC дюбели за закрепване на топлоизолационни плоскости

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4, на Регламент (ЕС) № 305/2011:

**PVC дюбели за закрепване на топлоизолационни плоскости
/партиден номер, обозначен върху опаковката/**

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с приложимия хармонизиран стандарт, както е предвидено от производителя:

PVC дюбели за закрепване на топлоизолационни плоскости

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

**„ТЕРАЗИД” ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004” №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com**

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 4

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели, относно строителния продукт, обхванат от Техническа спецификация на продукта TC 181/30.03/2012. Обследване на размери БДС 14999-80,

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизиран стандарт
1	2	3
Товароносимост на опън	0,622 kN/mm ²	ТС 181/30.03.2012; БДС 14999-80

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата Декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и по името на производителя от:



10.10.2013 г.
гр.София



Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 20130709-77-1-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ФАСАДЕН СТИРОПОР „ТЕРАЗИД“ EPS – F 11-13
EPS БДС EN 13163-T2-L2-W2-P4-S2-BS115-CS(10)60-DS(70,-)1-TR100-WL(T)2-MU

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4, на Регламент (ЕС) № 305/2011:

ФАСАДЕН СТИРОПОР „ТЕРАЗИД“ EPS – F 11-13
/партиден номер, обозначен върху опаковката/

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с приложимия хармонизиран стандарт, както е предвидено от производителя:

Топлоизолационни плоскости „ТЕРАЗИД EPS – F 11-13“ при направа на нови фасади и топлоизолиране на стари сгради

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

„ТЕРАЗИД“ ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004“ №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели, относно строителния продукт, обхванат от хармонизиран стандарт
БДС EN 13163:2011,

Нотифициран орган за сертификация на производствен контрол в предприятието № NB 1950 извърши първоначалната проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, постоянно наблюдение, оценяване на производствения контрол в предприятието и издаде сертификат №153-1/18.03.2011 г. за съответствие на производствения контрол в предприятието.

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизиран стандарт
1	2	3
Обемна плътност	11,6 kg/m ³	БДС EN 13163:2011
Коеф. на топлопроводност при t=10°C	0,031 W/m.K	БДС EN 13163:2011
Клас на горимост	E (самозагасващ)	EN 13501-1:2007


9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

Росен Станков, управител

03.09.2013 г.
гр.София





Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 20130709-66-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Стъклофибърна мрежа GG-150

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4, на Регламент (ЕС) № 305/2011:

**Стъклофибърна мрежа
/партиден номер, обозначен върху опаковката/**

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с приложимия хармонизиран стандарт, както е предвидено от производителя:

Стъклофибърна мрежа за армиране и укрепване на шпакловка

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

**„ТЕРАЗИД“ ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004“ №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com**

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели, относно строителния продукт, обхванат от хармонизиран стандарт

ETAG 004,

Нотифициран орган за сертификация на производствен контрол в предприятието № NB 1109 извърши първоначалната проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, постоянно наблюдение, оценяване на

производствения контрол в предприятието и издаде сертификат за съответствие на производствения контрол в предприятието.

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизиран стандарт
1	2	3
Тегло	145,38 g/m ²	ETAG 004
Якост на опън: - за мрежата - за покритието	1773,1 N/5 cm 2355,8 N/5 cm	ETAG 004

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.


Настоящата Декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:


Росен Станков - управител



04.10.2013 г.
гр.София



Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

www.terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ № 20130709-07-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Силикатна фасадна мазилка "СИЛИКАТ"

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4, на Регламент (ЕС) № 305/2011:

Силикатна фасадна мазилка "СИЛИКАТ"
/партиден номер, обозначен върху опаковката/

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с приложимия хармонизиран стандарт, както е предвидено от производителя:

Силикатна мазилка за декоративно оформление на фасади
/външна мазилка на основата на органично свързващо вещество СИЛИКАТ/

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

„ТЕРАЗИД“ ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004“ №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 2+

Сертификат за европейско техническо одобрение ETA 13/0214

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели, относно строителния продукт, обхванат от хармонизиран стандарт

БДС EN 15824,

Нотифициран орган за сертификация на производствен контрол в предприятието № NB 1950 извърши първоначалната проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, постоянно наблюдение, оценяване на производствения контрол в предприятието и издаде сертификат №153-1/18.03.2011 г. за съответствие на производствения контрол в предприятието и съгласно ETAG 004 Technical and Test Institute For Construction Prague с. 1020 извърши първоначалната проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, постоянно наблюдение, оценяване на производствения контрол в предприятието и издаде сертификат № с.1020-CPD-060037435 за съответствие на производствения контрол в предприятието.

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизиран стандарт
1	2	3
Реакция на огън:	Евроклас C	БДС EN 13820; БДС EN 15824:2009, г.4.7.
Паропропускливост:	V_2 (28 g/m ² .d)	EN 15824
Абсорбация на вода:	клас W ₂ (0,25 kg/m ² .h ^{0,5})	EN 15824
Адхезия:	над 0,3 Мра	EN 15824

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата Декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписан за и в името на производителя от:



05.08.2013 г.
гр.София



Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

www.terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 20130709-78-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

„ТОП МИКС – Лепило за EPS”

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4, на Регламент (ЕС) № 305/2011:

„ТОП МИКС – Лепило за EPS”

/партиден номер, обозначен върху опаковката/

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с приложимия хармонизиран стандарт, както е предвидено от производителя:

Лепило на циментова основа за топлоизолационни плоскости EPS

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

„ТЕРАЗИД” ЕООД

Гр.София, гара Искър, ул. „5004” №5

Tel. +35929799971

Fax: +35929799970

e-mail: office@terazid.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 2+

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели, относно строителния продукт, обхванат от хармонизиран стандарт

БДС EN 13494,

Нотифициран орган за сертификация на производствен контрол в предприятието № NB 1950 извърши първоначалната проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, постоянно наблюдение, оценяване на

производствения контрол в предприятието и издаде сертификат №153-1/18.03.2011 г. за съответствие на производствения контрол в предприятието.

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизиран стандарт
1	2	3
Якост на сцепление с бетонова повърхност	560 kPa	БДС EN 1015-12; ETAG-004 (EOTA)
Якост на сцепление на основното покритие с EPS плоча	200 kPa	БДС EN 13494; ETAG-004 (EOTA)
Коефициент на капилярна абсорбция на вода - с	0,01 kg/m ² .min ^{0,5}	БДС EN 1015-18; БДС EN 998-1

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата Декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

Росен Станков, управител

05.08.2013

гр.София





Производство и пясмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

www.terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 20130709-79-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Лепило-шпакловка за топлоизолационни плоскости „ТОП МИКС ТЕРМО“

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4, на Регламент (ЕС) № 305/2011:

„ТОП МИКС ТЕРМО“

/партиден номер, обозначен върху опаковката/

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с приложимия хармонизиран стандарт, както е предвидено от производителя:

Суша смес на циментова основа за залепване и шпакловане на топлоизолационни плоскости от EPS

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

„ТЕРАЗИД“ ЕООД

Гр.София, гара Искър, ул. „5004“ №5

Tel. +35929799971

Fax: +35929799970

e-mail: office@terazid.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 2+

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели, относно строителния продукт, обхванат от хармонизиран стандарт

БДС EN 13494,

Нотифициран орган за сертификация на производствен контрол в предприятието № NB 1950 извърши първоначалната проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, постоянно наблюдение, оценяване на производствения контрол в предприятието и издаде сертификат №153-1/18.03.2011 г. за съответствие на производствения контрол в предприятието.

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизиран стандарт
1	2	3
Якост на сцепление с бетонова повърхност	500 kPa	БДС EN 1015-12; ETAG-004 (EOTA)
Якост на сцепление на основното покритие с EPS плоча	120 kPa	БДС EN 13494; БДС EN 13499 ETAG-004 (EOTA)
Коефициент на водонепропускливост	0,38 kg/m ² .h ^{0,5}	БДС EN 1062-3

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата Декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:


Потпишано за и с името на производителя от:



Росен Софийски управител

05.08.2013 г.

гр.София




Долуподписаният, Управител на :

МАРИСАН и КОЛЕВ ООД

Русе - 7009, Източна Промислена Зона, ул. Калнъ дере № 15

Декларирам на собствена отговорност, като производител, че продуктът

**ТЕРАФЛЕКС® гипсова шпакловка
клас В4**за шпакловане на стени и тавани на закрито, стига гладки повърхности
с изключителна белота, дебелина на слоя до 10 ммза който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от
производителя система за производствен контрол и е в съответствие с международен стандарт**БДС EN 13279-1**Съответствието е оценено съгласно Директива 89/106/ЕЕС за строителни продукти на Европейския парламент и
Наредбата за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.Декларацията се издава въз основа протокол от изпитване № 450/27.05.2011 на Изпитвателна лаборатория за
строителни материали към Научноизследователски институт по строителни материали - НИИСМ ЕООД, гр. София.Нотифицирано лице за оценяване на съответствието на строителни продукти - Научноизследователски институт
по строителни материали - НИИСМ ЕООД - гр. София 1528, ул. Илия Бешков № 1, с Идентификационен номер NB
1950 на Европейската комисия и Разрешение № CPD 05 - NB 1950/17.09.2007г. на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството за оценяване съответствието на строителните продукти.**Система за оценяване на съответствието: 3**Маркировката **CE** е поставена за първи път на продукта през 2011 г.Тази декларация се издава за следните продукти:
ТЕРАФЛЕКС® гипсова шпакловка към Протокол №Техническата документация и указанията за употреба на продукта се намират у производителя.
Специфичните изисквания, свързани с употребата на продукта, както и указанията за полагане и
изпълнение, се намират върху опаковката на продукта.**Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 913 НК.**гр. Русе
22.12.2011Управител:.....
/Ст. Колев/



123 Lipnik blv , Rousse , Bulgaria ; tel : 082 817 721, fax : 082 817 725

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: инж.Васил Василев – Производствен директор на "МЕГАХИМ"
АД, гр.Русе 7013, бул. "Липник" № 123

Във връзка с Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване
съответствието на строителните продукти (Д.В., бр.106 / 27.12.2006 г)

Декларирам, че продуктът

Dekorator *Elegance*
Бял Латекс

е в съответствие с:

- ТС 112-2013 и анализно свидетелство за изделието, издавано за всяка произведена партида.
- Фирмена система за производствен контрол съгласно изискванията на сертификат ISO 9001
- Техническо описание на продукта , в съответствие с ТС 112-2013 , която може да се предостави на клиента при поискване.

гр. Русе

23.09.2013 г.

Производствен директор.....

/ инж. В. Василев/

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ DECLARATION OF CONFORMITY

на строителен продукт в съответствие с Директива 89/106/ЕЕС

Долуподписаният **Билдинг Компани ЕООД**, с. Дебрен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, декларирам на собствена отговорност, че продуктите

Прозорци и врати система Profilink Premium от ПВЦ профили без свойства, свързани с огнезащита и уплътнение срещу пушек.

произведени в **Производствената база на Билдинг Компани ЕООД**, за които се отнася тази декларация, са произведени в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол (сертифицирана по ISO 9001:2008, сертификат №. TIC 15 100 117506 – валиден до 09.06.2014 г., издаден от TUV Tübingen e.V и са в съответствие със следния стандарт

БДС EN 14351-1:2006

и в съответствие с изискванията на част втора от Наредба за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП), която въвежда Директива за строителните продукти (CPD) 89/106ЕЕС на съвета на Европейската общност. Декларацията се издава въз основа на протоколи от първоначално изпитване на типа на продукта:

1. Протокол за първоначално изпитване на типа съгласно EN 14351-1 от НИСИ-ЕООД с номер ITT – 08.44 K / 08.04.2010 г. за Прозорци от ПВЦ профили система „Profilink “ серия „PREMIUM “, издаден от **НИСИ ЕООД** - гр. София – нотифициран орган за оценка на съответствието № NB 2032 от Регистъра на Европейската комисия и с Разрешение № CPD 10 NB 2032 на МРРБ.
2. Протокол от изпитване на профили № 824-1-532 / 04.09.2008 г., съгласно EN 12608.
3. Протокол за определяне степен на горимост № ИЦ-89-120 / 21.11.2005 г. на Научно приложен институт по пожарна и аварийна безопасност при НС ПАБ на МВР, съгласно стандарт БДС EN 60695 – 11 – 10.
4. Протокол „Здравна оценка за приложимост PVC профили за прозорци и врати“ с №2309 / 12.10.2005 г., издаден от Национален център по опазване на общественото здраве към Министерството на Здравеопазването.

Резултатите от гореспоменатите сертификати са придобити чрез каскаден принцип от Профилинк ООД, гр. Пловдив, ул. Нестор Абаджиев №55. Декларираме, че произведения продукт е аналогичен на тествания и притежава същите технически характеристики. При неспазване инструкциите за производство на системния доставчик или при несъответствие с поставените изисквания към крайния продукт и значителни разлики между тествания такъв и произведения краен продукт, **Билдинг Компани ЕООД** се задължава да подложи продукта на нови изпитвания и да не използва резултатите от изпитванията проведени от Профилинк ООД.

Специфични изисквания, свързани с употребата, съхранението на продукта са поставени на опаковката или придружават продукта.

Година на поставяне на маркировката „СЕ“: 2008


Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

09.06. 2013 г.

с. Дебрен

Управител на **Билдинг Компани ЕООД**

Бисер Узунов





НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - НИСИ - ЕООД
НОТИФИЦИРАНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

Разрешение № CPD 10-NB 2032 на МРРБ

Идентификационен № NB 2032 от регистъра на Европейската комисия

Република България, София 1618, бул. "Никола Петков" № 86, тел.: (02) 856 10 82, факс: (02) 955 96 38, e-mail: nisi_sofia@abv.bg

ПРОТОКОЛ
ОТ ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗПИТВАНЕ
НА ТИПА НА ПРОДУКТ

№ ГТТ-08.44 К / 08.04.2010 г. *

Изпитването е извършено в съответствие с изискванията на част втора от Наредба за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОСП), която възвежда Директива за строителните продукти (CPD) 89/106/ЕО на Съвета на Европейската общност.

Наименование на продукта: Прозорец от PVC профили система "Profilink", серия „Premium“

Производител: "Профилинк" ООД,
гр. Пловдив, ул. "Нестор Абаджиев" № 45-55

Възложител: "Профилинк" ООД,
гр. Пловдив, ул. "Нестор Абаджиев" № 45-55

Документ за възлагане: Договор № 70 / 2008 г.

Система за оценяване на съответствието: Система "3" съгласно приложение ZA на БДС EN 14351-1

Съществени изисквания: 3 - хигиена, опазване на здравето и на околната среда;
4 - безопасна експлоатация;
5 - защита от шум;
6 - икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност).

Проба за изпитване: Един брой прозорец с табаритни размери 1750/2550 mm. Подробни данни за изпитвания прозорец са дадени в Приложение 1.

Дата (перод) на извършване на изпитването: от 07.10.2008 г. до 03.11.2008 г.

Резултат: Представеният образец от прозорец от PVC профили система "Profilink", серия „Premium“ отговаря на клас 5A по водонепропускливост, клас C1 по устойчивост на вятър, клас 3 по носимоспособност на защитните устройства на патоварване, клас 3 по относителна въздухопроницаемост на фугите, притежава претеглен индекс на изолация от въздушен шум $R_w (C; C_w) = 33 (-1; -5) \text{ dB}$ и коефициент на топлопреминаване $U = 1,27 \text{ W/(m}^2\text{K)}$.

Р-д на ИЛ при НИСИ:
(н.с. инж. Цв. Гюрова)

Управител на НИСИ:
(ст. н.с. д-р инж. Р. Гуглев)

Протоколът съдържа вклучено 18 листа. Издечен от протоколна книга на съответния срок с писмено съобщение на "НИСИ" ЕООД.
* Протоколът е коригиран и съвместен с Протокол № ГТТ-08.44 / 25.11.2008 г., като корекциите са означени в червено.

ПРОТОКОЛ от първоначално
изпитване на типа на продукт
№ ПТ 08.44 К / 08.04.2010 г.

3. Хигиена, опазване на здравето и на околната среда

Данни от изпитването:

№ по ред	Показател	Мерна единица	Метод за изпитване	Резултат от изпитва- нето	Изискване съгласно техническа спецификация
1	2	3	4	5	6
1.	Водонепропускливост при статично налягане* P = 200 Pa	-	БДС EN 1027	Не пропуска вода	БДС EN 12208 За клас 5A: При P = 200 Pa да не пропуска вода
* Подробните резултати от изпитването са дадени в Приложение 2.					

4. Безопасна експлоатация

Данни от изпитването:

№ по ред	Показател	Мерна единица	Метод за изпитване	Резултат от изпитва- нето	Изискване съгласно техническа спецификация
1	2	3	4	5	6
1.	Устойчивост на вятър*				
1.1	Деформации (f) на крилото спрямо рамката при натоварване от вятър с налягане P = ± 600 Pa: - I-ва вертикална ос (т.2); - II-ра вертикална ос (т.5); - III-ра вертикална ос (т.8); - IV-ра вертикална ос (т.11).	mm	БДС EN 12211	+0,86 / -0,61 +2,58 / -1,24 +3,12 / -2,94 +1,62 / -0,92	БДС EN 12210 За клас C1: P = ± 600 Pa и Γ < 1/300 L < ±5,67 < ±5,67 < ±5,67 < ±5,67
1.2	Поведение при повтарящо се 50 пъти положително и отрицателно налягане от 300 Pa	-	БДС EN 12211	Функционалните качества на прозорца и връзките с обкова са запазени	БДС EN 12210 Запазване на функционалните качества на прозорца и връзките с обкова
1.3	Безопасност при буря при еднократно налягане 1200 Pa	-	БДС EN 12211	Функционалните качества на прозорца и връзките с обкова са запазени	БДС EN 12210 Запазване на функционалните качества на прозорца и връзките с обкова

ПРОТОКОЛ от първоначално
изпитване на типа на продукт
№ ГТТ 08.44 К / 08.04.2010 г.

№ по ред	Показател	Мерна единица	Метод за изпитване	Резултат от изпитването	Изискване съгласно техническа спецификация
1	2	3	4	5	6
2.	Носимост/способност на защитните устройства на натоварване				
2.1	Огъване при натоварване с хоризонтална сила от 350 N в продължение на 1 min, приложена върху крило с ланти, въртящо се на вертикална ос и застопорено в горния край	mm	БДС EN 14609	139 Функционалните качества и връзките с обкова са запазени	БДС EN 13115 За клас 4: Запазване на функционалните качества на прозрачна и връзките с обкова
2.2	Огъване при натоварване с хоризонтална сила от 300 N в продължение на 1 min, приложена върху крило с ланти, въртящо се на хоризонтална ос и застопорено в единия край	mm	БДС EN 14609	62 Функционалните качества и връзките с обкова са запазени	БДС EN 13115 За клас 3: Запазване на функционалните качества на прозрачна и връзките с обкова
* Подробните резултати от изпитването са дадени в Приложение 3.					

5. Защита от шум

Данни за изпитването:

№ по ред	Показател	Мерна единица	Метод за изпитване	Резултат от изпитването	Изискване съгласно техническа спецификация
1	2	3	4	5	6
1.	Изолация от въздушен шум* - Претеглен индекс на изолация от въздушен шум, $R_w(C; C_{tr})$ **	dB	БДС EN ISO 140-3	33 (-1; -5)	-
* Подробните резултати от изпитването са дадени в Приложение 4.					
** Претегленият индекс на изолация от въздушен шум, $R_w(C; C_{tr})$ dB, се определя съгласно БДС EN ISO 717-1					

6. Икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност)

Данни за изпитването:

№ по ред	Показател	Мерна единица	Метод за изпитване	Резултат от изпитването	Изискване съгласно техническа спецификация
1	2	3	4	5	6
1.	Топлинно съпротивление	$m^2 \cdot K / W$	БДС EN ISO 12567-1	0,79	-
2.	Коефициент на топлопреминаване на: - профила на крилото - профила на рамката - етклопакет - прозорец	$W / (m^2 \cdot K)$	БДС EN ISO 12567-1	1,18 1,42 1,25 1,27	- - - -
3.	Относителна въздухопроницаемост на фугите* налягане $P = 600 \text{ Pa}$	$m^3/h.m$	БДС EN 1026	2,94	БДС EN 12207 За клас 3: Изискванията са дадени в Приложение 5 на протокола

* Подробните данни от изпитването са дадени в Приложение 5.

Използвана техническа документация:

БДС EN 14351-1	"Прозорци и врати. Стандарт за продукт, технически характеристики. Част 1: Прозорци и външни врати без характеристики за устойчивост на огън и/или пропускане на дим";
БДС EN 14609:2005	"Прозорци. Определяне на устойчивостта на статичното усукване";
БДС EN 12211:2003	"Прозорци и врати. Устойчивост на вятър. Метод за изпитване";
БДС EN 1027:2003	"Прозорци и врати. Водонепропускливост. Метод за изпитване";
БДС EN 1026:2003	"Прозорци и врати. Въздухопроницаемост. Метод за изпитване";
БДС EN ISO 140-3:2003	"Акустика. Измерване на звукоизолацията в сгради и на строителни елементи. Част 3: Лабораторни измервания на изолацията от въздушен шум на строителни елементи";
БДС EN ISO 717-1:2003	"Акустика. Оценка на звукоизолацията в сгради и на строителни елементи. Част 1: Изолация от въздушен шум";
БДС EN ISO 12567-1	"Топлинни характеристики на прозорци и врати. Определяне на коефициента на топлопреминаване по метода с гореща кутия. Част 1: Комплектовани прозорци и врати"
БДС EN 12210:2003	"Прозорци и врати. Устойчивост на вятър. Класификация";
БДС EN 13115:2004	"Прозорци. Класификация на механичните свойства. Вертикално натоварване, усукване и сила на задвижване";
БДС EN 12208: 2003	"Прозорци и врати. Водонепропускливост. Класификация";
БДС EN 12207:2003	"Прозорци и врати. Въздухопроницаемост. Класификация";

Извършили изпитването:

- н.с.инж.К.Глушкова
- ст.п.с.инж.Б.Сапунов
- инж.Г.Веселинова
- физ.Н.Николов

Р-д на ИЛ при НИСИ:

(н.с.инж.Цв.Горова)
НИСИ БООД

Приложение 1


Данни за изпитвания прозорец

Наименование на продукта: Прозорец от PVC пет и шесткамерни профили система "Profilink", серия "Premium"


Описание на изпитвания образец: Прозорец с една неотваряема и една двуплоскостно отваряема части от PVC профили система "Profilink", серия "Premium" е:

- габаритни размери – 1750/2550 mm;
- остъкляване – стъклопакет с обща дебелина 24 mm (4/16/4) от безцветно флоатно стъкло, ниско емисионно стъкло и междина, запълнена с аргон; процент на остъкляване 71,3 %;
- използвани PVC профили:
 - рамка (каса) – PL 501301 P;
 - крило – PL 601302 P;
 - кемпфер – PL 501307 P;
 - стъклодържател – PL 00104 CL.
- усиливащи метални профили:
 - рамка (каса) – PL 00203;
 - крило – PL 00203;
 - кемпфер – PL 00201.
- уплътнения – PL 00301 и PL 00302.
- отводняване – камерата между рамката на прозореца и рамката на крилото се отводняват чрез външни отвори Ø6 mm (по 3 бр. в точка) и вътрешни отвори шлиц 30/6, разположени съгласно чертежа;
- вентилация – камерата между рамката на прозореца и рамката на крилото се вентилира чрез външни отвори в рамката на прозореца и крилото Ø6 mm и вътрешни отвори в рамката Ø6 mm или шлиц 30/6, разположени съгласно чертежа;
- обков – "Siegenia";


Забележка: Подробни чертежи за изпитвания образец са показани на стр. от 6 до 14.



поглед отвътре

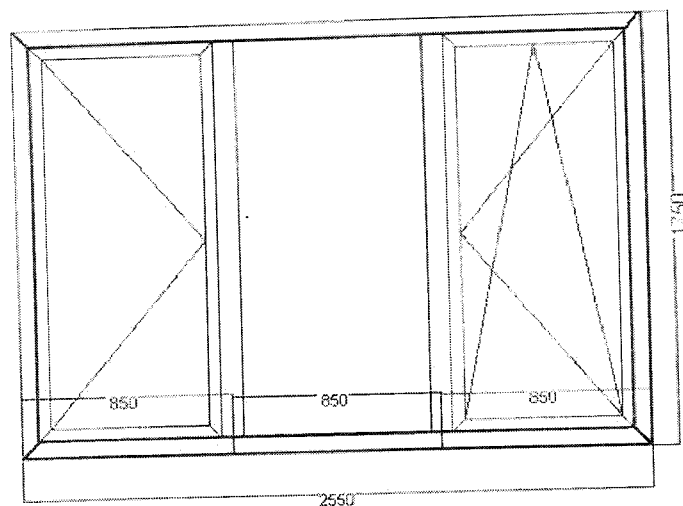

поглед отвън

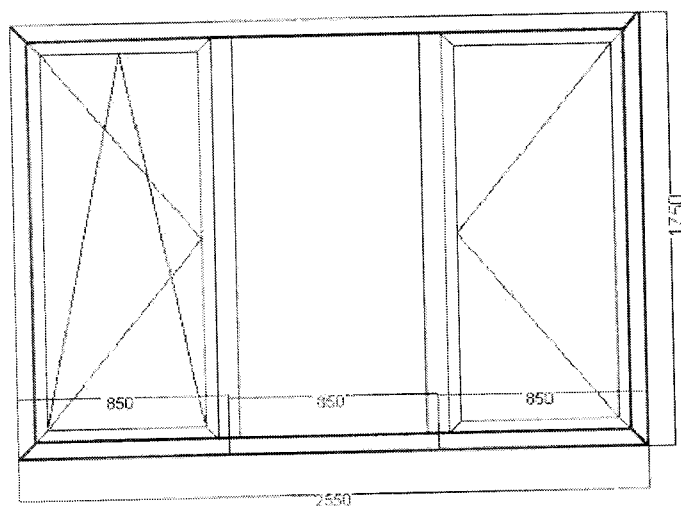

[Handwritten signature]



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

КНАУФ БЪЛГАРИЯ ЕООД
ул. Ангелов връх 27

1618 София

декларира на собствена отговорност, че продуктът:

Гипскартонени плоскости
Тип А

произведени в

Завод за гипсови строителни плоскости Марица
6294 с. Медникарово
Община Гълъбово
България


е в съответствие с БДС EN 520 и изпълнява изискванията за поставяне на CE – маркировка съгласно приложение ZA.3а от БДС EN 520.

В таблици ZA.2 и ZA.3а са приложени методите за оценяване и декларация на съответствието.

Продуктът е преминал първоначално изпитване на типа на продукта, и подлежи на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол съгласно БДС EN 520.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс на РБългария.


София, 22.01.2010 г.


Иван Ангелов
Управител

Кнауф България ЕООД

KNAUF

BULGARIA EOOD
Angelov vrach 27
BG-1618 Sofia


Даниела Иванова
Ръководител
Технически отдел



ЕЛКАБЕЛ

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
България, Бургас 8000, ул. "Одрин" 15

ЕС Декларация за Съответствие

Производител, име и адрес: Елкабел- АД
„Одрин“ 15
8000 Бургас
БЪЛГАРИЯ

Подукт: Силови кабели с PVC изолация и обвивка за напрежение U_0/U : 0,6/1kV

Тип: СBT, СBT-с и СBT-жс

Горепосочените продукти са в съответствие с Европейската Директива:

2006/95/ЕС

“Директива на съвета от 12 декември 2006 по хармонизацията на законите на Страните членки във връзка с електрическото оборудване, проектирано за използване в определени граници на напрежението “

Пълното изпълнение на посочените по-долу стандарти доказва съответствието на проектирания и произведен продукт с разпоредбите на горепосочената ЕС Директива:

БДС 16291:1985

БДС HD 603 S1:2003/A3:2007 ч.3А

Продукта е изпитан от Изпитвателна лаборатория при “ЕЛКАБЕЛ” АД гр.Бургас с адрес: ул. Одрин № 15, акредитирана от ИА “БСА”. Сертификат БСА рег. №156-ЛН. Издаден е протокол от изпитване № 6 / 20.08.2009. Година на поставяне на маркировката 07.

Бургас
10.02.2014

Изп. Директори:

1. Димитър Паскалев

2. Васил Божинов



Изп. Директор
Мартин Дозар
Директор
Мартин Дозар
Шоурум София

Тел.: 056/807 817
Тел.: 056/813 625
Тел.: 056/813 626
Тел.: 056 875 282
Тел.: 02/4218766

Факс: 056/813 663
Факс: 056/813 663
Факс: 056/813 648
Факс: 056/813 663
Факс: 07/4218763

е-mail: office@elkabel.bg
е-mail: sales@elkabel.bg
е-mail: marketing@elkabel.bg
е-mail: info@elkabel.bg
е-mail: info@elkabel.bg

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification



САЛАМБО

САЛАМБО

България, 7000 Русе, ул. „Олимпийски Панов“ 43
Русе - тел./факс: 062 83 83 83, GSM: 069 6 557 114
Русе - тел./факс: 062 62 72 22, GSM: 069 6 557 114
Бито Бито - тел: 052/500 789, 052/501 792, GSM: 069 6 557 114
Бито Бито - тел: 052/631 069, GSM: 069 6 557 114
Бито Бито - тел: 052/631 069, GSM: 069 6 557 114
Бито Бито - тел: 052/631 069, GSM: 069 6 557 114



308

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Данно подписаният производител "АДИ-КОМЕРС" ЕООД, представяван от АДРИАНА ЕВТИМОВА МАНОВСКА, владееща на фирмата 7000 гр Русе, ул. „Олимпийски Панов“ 43, ДЕКЛАРИРАМ на собствена отговорност, че битумните хидроизолационни продукти на покрива, системи и конструкции, използвани на сгради, канали и всякакъв вид инженерни съоръжения: „Битумни-58“, „Изофлекс-58“, „Политекс-АКБ“, „Битумни керемиди (керамиди)“, „Стеклоплекс-Salambo“ са предоставена търговска марка „САЛАМБО“ са произведени в "АДИ-КОМЕРС" ЕООД, гр. Русе, сертифицирани съгласно изискванията на ISO 9001:2008 (Сертификат ПУ 07/2369), съгласно се основа тази декларация, са изработени в условията на техническа и поддръжка от производителя, система за производствен контрол и са в съответствие с БДС EN 13707, БДС EN 544. Съответствието е обявено съгласно Наредбата за техническите изисквания към строителите и обявяване съответствието на строителните продукти (система 4). Произведените продукти са горими.


Декларацията се издава въз основа на Протоколи от изпитвания, издадени от Изпитвателен център по строителство при „НИСИ" ЕООД, акредитиран по БДС EN ISO/IEC 17025:2006

Декларацията:

1. Декларацията е издадена в съответствие с общите условия за транспортиране, съхранение, монтаж и поддръжка на битумните хидроизолационни мушамы

2. Декларацията, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 17 и 18

Управляващ
Адриана Евтимова Мановска



България, 7000 Русе, ул. „Олимпи Панов“19, п. к. 1
тел.:082 82 40 77, GSM: 088 7 277 020
тел./факс.:082 83 83 83, GSM: 089 6 657 171
adriana@salambo-bg.com
www.salambo-bg.com



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Битумни хидроизолационни рулонни материали

“ИЗОФЛЕКС - 58”

Битумна хидроизолационна мембрана на основа от стъклен воал с тегло 80 гр./м² и усилена нишка през 2 см., пропити и покрита от двете страни с битум модифициран с APP и минерални пълнители, каширана от двете страни с термостопяемо полиетиленово фолио с дебелина 0.7 микрона. Продуктът е предназначен за първи пласт при хидроизолирането на покриви и съоръжения.

“ИЗОФЛЕКС - 58” - 3.5 кг/м² без минерална посилка

Наименование на показателя	Метод на изпитване	Мерна единица	Резултат от изпитването
Визуални дефекти	БДС EN 1830-1	-	Без гънки, разкъсвания, пробиви, с прави ръбове
Размери: - ширина	БДС EN 1848-1	cm	100.5 ± 0.5
Маса на единица площ	БДС EN 1849-1	kg/m ²	3.1 ± 0.1
Якост на опън при скъсване - надлъжно - напречно	БДС EN 12311-1	N/5	485 ± 14 350 ± 8
Относително удължение при скъсване - надлъжно - напречно	БДС EN 12311-1	%	8 ± 1.5 6 ± 0.5
Огъваемост при ниски температури	БДС EN 1109	°C	при - 5° няма изклатини
Термостойчивост	БДС EN 1110	°C	при 120° няма стичабе
Водопронпускливост при налягано 0.7 MPa в продължение на 24 ч.	БДС EN 1028 Метод В	-	водонепронпусклива
Издръжливост на разкъсване на сгъжданията - надлъжно - напречно	БДС EN 12316-1	N/50 mm	44 ± 1 33 ± 1
Издръжливост на срязване на сгъжданията - надлъжно - напречно	БДС EN 12317-1	N/50 mm	(скъсване извън сгъжданията) 360 ± 1 255 ± 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Битумни хидроизолационни рулонни материали

Битумна хидроизолационна мембрана на основа от нетъкан полиестерен текстил, пропит и покрит от двете страни с битум модифициран с APP и минерални пълнители, каландрана от едната страна с термостойко полиетиленово фолио с дебелина 0.7 микрона, а от другата със защитна минерална пясъчна (защитаваща хидроизолационната мембрана от атмосферните влияния). Продуктът е предназначен за втори и трети пласт при сандвичирането на различни индустрични съоръжения. Основата от нетъкан полиестерен текстил придава висока удъйчивост на механични деформации, повишена способност за разтегляне и стабилност на размерите на мембраните.

Numero SDC EN 13707

444



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

№ ...**813**.....

ОТ

ТИСЕНКРУП – ЮПИТЕР СТОМАНА ООД, гр София
1839, Складово-производствена зона – кв. Враждебна

Декларираме, че доставените на фирма:

ТЕТО FOOD

метални изделия и материали съответствуват на описаните в съпровождащите ги сертификати, както следва:

№	Вид материал	размер	Марка стомана	Сертификат №/дата	Издал сертификата
1.	Рез. Вулкан	0,50x1250mm	DX51D	9.07.18г.	Arcelex Metal
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					

Приложение – ксерокскопия на посочените сертификати

Дата: **8.18.18г.**

Подпис:

ТИСЕНКРУП – ЮПИТЕР СТОМАНА ООД
СОФИЯ



София, кв. Военна рампа, бул. Партизан 12, след Галчев Холдинг, завод КРАМЕКС
тел / факс: 02/ 832 41 03, GSM: 0876 034 409, 0877 310 997, 0878 445 000
E-mail: teto1@abv.bg; office@teto-master.net www.teto.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният,

Владимир Александрович Волканов- управител на „TETO“ ЕООД

Декларирам на собствена отговорност, че продуктите: обшивки за покрив са произведени от „TETO“ ЕООД, България, София от поцинкована ламарина със сертификат N60030094/09.07.2012 в условията на непрекъснат производствен контрол, сертификат 3.1 EN 10204


Продуктите са негорими и съответстват на БДС EN 505:Система 4.

При прилагането на продуктите да се спазват разработените от производителя „Указания за проектиране и монтаж“, които се предоставят на клиента.

Производителят е издал декларация за съответствие на продуктите, с която удостоверява, че е взел всички мерки за осигуряване на съответствието на продуктите с техническите изисквания към тях.
“СО”

гр.София
2015г.


(подпис, печат)



Quality Certified

Certificate of Registration

СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ – ИНЖЕНЕРИНГ – КОНСУЛТ ЕООД

ул. Феликс Каниц 26, София, 1606, България

Горепосоченият лицензополучател е оценен и регистриран от TQCSI International Pty Ltd, като способен да контролира качеството на стоките или услугите, които предоставя, в съответствие с изискванията на Лицензното споразумение, на или от адреса посочен по-горе, според система за управление, съответстваща на:

ISO 9001:2008


Регистрацията покрива строителство и саниране; строително - монтажни и строително - ремонтни дейности на жилищни, и промишлени сгради и съоръжения и прилежащата им инфраструктура; строителство на преносни проводни и техническата инфраструктура и съоръженията към тях в областта на водоснабдяването, канализацията, електро и топлиоснабдяването

Изключения: 7.3

Дата на издаване: 10 септември 2012
Валиден до: 03 септември 2015

Лиценз No: BG106-QC-EC-SC
Първоначална регистрация: 10 септември 2012

Craig Bates
President
TQCSI International (Group) Pty Ltd



Bozhidar Pindev
General Manager
TQCSI Bulgaria Ltd

This certificate verifies the original certificate issued and is valid as long as it is displayed as an electronic copy at www.tqcsi.com and surveillance audits are satisfactorily completed



TQCSI INTERNATIONAL PTY LTD
www.tqcsi.com



IAS-ANZ



Schedule of Registration

ISO 9001:2008

30

СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ – ИНЖЕНЕРИНГ – КОНСУЛТ ЕООД

на или от следните адреси:

ул. Феликс Каниц 26, София, 1606, България

Регистрацията покрива предоставянето на гражданско и промишлено строителство, включително строително – монтажни и ремонтни дейности.

продукти/услуги: строителство и саниране; строително – монтажни и ремонтни дейности на жилищни и промишлени сгради и съоръжения и прилежащата им инфраструктура; строителство на преносни проводни на техническата инфраструктура и съоръженията към тях в областта на водоснабдяването, канализацията, електро и топлинна оснабдяването.

Исключения: няма

Този Списък за регистрация следва да се разглежда заедно със съответния Сертификат за регистрация.

Дата на издаване: 10 септември 2012



Валиден до: 08 септември 2015

Лиценз №: BG106-QC-EC-SC



Craig Bates
President

TQCS International (Group) Pty Ltd



Bozhidar Pinder
General Manager
TQCSI Bulgaria Ltd

This certificate verifies the original certificate issued and is valid as long as it is displayed as an electronic copy at www.tqcsi.com and surveillance audits are satisfactorily completed.




TQCS INTERNATIONAL PTY LTD
www.tqcsi.com



IAS-ANZ





Environmentally Certified

Certificate of Registration

СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ – ИНЖЕНЕРИНГ – КОНСУЛТ ЕООД

ул. Феликс Каниц 26, София, 1506, България

Горепосоченият Лицеизпълнител е оценен и регистриран от TQCSI International Pty Ltd. като способен да контролира аспектите на околната среда, свързани с неговите операции, в съответствие с изискванията на Лицензното споразумение, на или от адреса посочен по-горе, според системата за управление на околната среда, съответстваща на:


ISO 14001:2004

Регистрацията покрива строителство и саниране; строително-монтажни и строително-ремонтни дейности на жилищни, и промишлени сгради и съоръжения и прилежащата им инфраструктура; строителство на преносни проводни на техническата инфраструктура и съоръженията към тях в областта на водоснабдяването, канализацията, електро и топлинното снабдяването.

Дата на издаване: 10 септември 2012
Валиден до: 08 септември 2015

Лиценз No: BG106-QC-EC-SC
Първоначална регистрация: 10 септември 2012

Craig Bates
President
TQCSI International (Group) Pty Ltd




Bozhidar Pindiev
General Manager
TQCSI Bulgaria Ltd

This certificate verifies the original certificate issued and is valid as long as it is downloaded as an electronic copy at www.tqcsi.com and surveillance audits are satisfactorily completed.



TQCSI INTERNATIONAL PTY LTD
www.tqcsi.com



Schedule of Registration

ISO 14001:2004

до

СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ – ИНЖЕНЕРИНГ – КОНСУЛТ ЕООД

на или от следните адреси:

ул. Феликс Каниц 26, София, 1606, България

Регистрацията покрива предоставянето на гражданско и промишлено строителство, включително строително – монтажни и ремонтни дейности.

Продукти/услуги: строителство и саниране; строително – монтажни и ремонтни дейности на жилищни и промишлени сгради и съоръжения и прилежащата им инфраструктура; строителство на преносни проводни на техническата инфраструктура и съоръженията към тях в областта на водоснабдяването, канализацията, електро и топлиоснабдяването.

Исключения: няма


Този Списък за регистрация следва да се разглежда заедно със съответния Сертификат за регистрация.

Дата на издаване: 10 септември 2012

Валиден до: 08 септември 2015

Лиценз No: BG106-QC-AC-SC

Craig Bates
President
TQCS International (Group) Pty Ltd



Bozhidar Pindiev
General Manager
TQCSI Bulgaria Ltd

This certificate verifies the original certificate issued and is valid as long as it is displayed as an electronic copy at www.tqcsi.com and surveillance audits are satisfactorily completed.



TQCS INTERNATIONAL PTY LTD
www.tqcsi.com



www.tqcsi.com/anz/register

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР № 14100100000123

"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

"ЗД ЕВРОИНС" АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43, ЕИК: 121265113, вписано в Регистъра за търговски дружества при СГС по фирмено дело № 9078/1998 г., с Разрешение за застрахователна дейност № 8/15.06.1998 г. на НСЗ, представлявано от Маринян Иванов, агенция София 25, ат. карта № 15141, тел.:

ЗАСТРАХОВАН:

"Строителство и саниране - инженеринг - консулт" ЕООД
Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Западен парк, ул. "Суходоляска" 2, бл. 31, ет. 1, ап. 3
представяван/о от Петкана Петрова Николова,
в качеството на:

1 3 1 4 0 5 7 7 7
5 3 0 1 2 9 6 3 3 0

- ☐ ПРОЕКТАНТ - за изготвяне на инвестиционен проект,
☐ КОНСУЛТАНТ: А ☐ за изготвяне на строителен надзор, Б ☐ за извършване на оценка за съответствието на инвестиционен проект със съществуващите изисквания към строителство,
☒ СТРОИТЕЛ А ☒ за целостно изпълнение на строителството, Б ☐ за целостно изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи,
☐ ЛИЦЕ, упражняващо строителен надзор на строеж от пета категория,
☐ ЛИЦЕ, упражняващо технически контрол по част "Конструкция" на инвестиционния проект, за който не е извършена оценка за съответствие от консултанти.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

- Предмет на настоящия договор е професионалната отговорност на ЗАСТРАХОВАНИЯ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му.
 - Застраховката покрива професионалната отговорност на ЗАСТРАХОВАНИЯ:
 - (1) по писмени претенции на увредените лица за имуществени и неимуществени вреди, предявени в срока на действие на застрахователния договор, включително за съдебните разходи;
 - (2) за имуществени и неимуществени вреди вследствие на а/ смърт или телесна повреда на други участници в строителството и/или на трети лица; б/ материални вреди върху имуществото на други участници в строителството или на трети лица;
 - (3) при или по повод изпълнение на задълженията му във връзка със строежи категория:
- ☐ първа ☐ втора ☒ трета ☐ четвърта ☐ пета

II. ПОКРИТ РИСК:

- Опасността от възникване на отговорност на ЗАСТРАХОВАНИЯ за причинени имуществени и неимуществени вреди, вследствие на неговите неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му.

III. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА:

4. В агрегат 200,000.00 / ДВЕСТА ХИЛЯДИ / ЛЕВА	5. За едно събитие 100,000.00 / СТО ХИЛЯДИ / ЛЕВА
---	--

IV. ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПЕРИОД:

6. Застрахователния договор се сключва за срок от 00.00 ч. на 01.10.2014 г. до 24.00 ч. на 30.09.2015г.	7. Фиксирана ретроактивна дата ☒ да, считано от 06.04.2009г. / ☐ не
--	---

V. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:

8. Начислена премия: 200.00 ЛЕВА	9. Отстъпък: 0 % на основание:	10. Обща застрахователна премия: 200.00 ЛЕВА	4.00 лв.
11. Данък върху застрахователната премия 2%			204.00 лв.
12. Общо дължимата сума:			

13. Начин на плащане: ☒ еднократно ☐ разсрочено
☐ в брой ☒ по банков път: BIC: FINVBGSE; IBAN: BG66FINV91501016123505, при "Първа Инвестиционна Банка" АД

	1 вноска	2 вноска	3 вноска	4 вноска
Дата на плащане:	29.09.2014г.	г.	г.	г.
Застрахователна премия	200.00 лв.	лв.	лв.	лв.
Данък 2%	4.00 лв.	лв.	лв.	лв.
Общо дължимата сума:	204.00 лв.			

14. При разсрочено плащане, когато ЗАСТРАХОВАНИЯТ закъснее с плащането на която и да е вноска, настоящата полица, съгласно чл. 202 от Кодекса за застраховане, ще се счита за прекратена автоматично след изтичането на 15-дневен срок от датата на плащане на разсрочената вноска.

VI. ДРУГИ ДОГОВОРНОСТИ:

- САМОУЧАСТИЕ на ЗАСТРАХОВАНИЯ. 10 % от размера на всяка щета, но не по-малко от 1000 (хиляда) лева;
- За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, обн., ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г., както и останалите разпоредби на българското законодателство;
- Част от настоящия застрахователен договор са:

Предложение-въпросник за сключване на застрахователен договор от
Долуподписаният, в качеството си на Застрахован/представител на Застрахования, декларирам: 1. Съгласен съм личните данни по тази полица да се използват съгласно действащото законодателство, включително за директен маркетинг; 2. Получил съм писмена информация за потребителите на застрахователни услуги.

Настоящия застрахователен договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните
Гр. София, 29.09.2014г.
За ЗАСТРАХОВАНИЯ:
За ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ:
(подпис и печат)



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №19

ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка

Долуподписаната Петкана Петрова Николова, с лична карта № 194976797, издадена на 07.02.2006 от МВР София, с ЕГН 5301296330, в качеството ми на Управител,
(посочете длъжността)

на "Строителство и саниране-инженеринг- консулт" ЕООД,
(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции

Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Запад” №55”

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Напълно съм запознат с всички условия, обстоятелства, и изходни данни, необходими за изпълнение на обекта на горепосочената обществена поръчка, които биха повлияли при изготвянето на техническото и ценовото ми предложение.
2. Извършил съм посещение и оглед на съществуващия терен за изпълнение на строително-монтажните работи, предмет на горепосочената обществена поръчка и съм запознат с всички условия и особености на строителната площадка.
3. Незапознаването с мястото и условията за изпълнение на поръчката е за наш риск при оценяването от комисията на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка.

15.05.2015 г.
(дата на подписване)

Декларатор:.....

Бюлетен Гомево - АБВ с - консулт ЕООД
Кирин Чанев - [Signature] ЕООД [Signature]

Образец №11

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции

Обособена позиция №1 „Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Запад“ №55 ”

„Строителство и саниране-инженеринг-консулт“ ЕООД

Наименование на участника

Петкана Петрова Николова

(Трите имена на лицето, представляващо участника юридическо лице)

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:

Седалище и адрес на управление:	
• Страна, код, град, община	България, 1373 София
• Квартал, ул., №,	жк.Западен парк, ул.Суходолска 2, бл.31, ет.1, ап.3
• Телефон, факс,	02/950 09 80
• E-mail:	ssik_eood@abv.bg


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като подробно се запознахме с условията на документацията за участие в обществената поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции

Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Запад“ №55 ”

Гаранционен срок за СМР 15,059 години

1	2	3	4	5	6	7
№ по ред	Вид СМР по отделните части	% от обема СМР 1%/	Минимален гаранц. срок по Наредба 2	Предложен от участника гаранц.	Общ гаранц. срок	Среден гаранц. срок



			/години/	срок /години/		
		0,382	10	20	30	0,115
1.	Конструкции	5,445	5	10	15	0,817
2.	Хидроизолации	67,677	5	10	15	10,152
3.	Топлоизолации	16,317	5	10	15	2,448
4.	Довършителни работи	10,179	5	10	15	1,527
5.	Ел. инсталации					

Където:

- в колона 3 се записва тежестта на всяка от отделните части спрямо общата стойност на обекта в %
- в колона 6 се сумират колона 5 и колона 4
- в колона 7 се умножават колона 6 и колона 3
- общият среден гаранционен срок се получава като сума от средните гаранционни срокове по отделните части.

Указание: Участниците трябва да предложат гаранционни срокове за изпълнените строителни работи, които не могат да бъдат по-малки от предвидените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоразнения и строителни обекти.

Забележка: Участниците могат да предложат гаранционни срокове по – дълги от предвидените в горепосочената наредба, които да бъдат не повече от 2 /два/ пъти минималният гаранционен срок, предвиден в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г.

*В случай, че се констатира предложен под установения минимум или над максимум предложен срок по тези показатели, офертата на участника се предлага за отстраняване.

Срок за изпълнение на строителството: 30 /календарни дни/

Указание: Срокът за изпълнение на строителството не следва да бъде по – малък от 30 календарни дни и не по – дълъг от 45 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число!

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за строителство извън горепосочените такива.

Срок за проектиране: 15 /календарни дни/

Забележка: Срокът за изготвяне на работен проект да бъде от 15 /петнадесет/ до не повече от 20 /двадесет/ календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число!

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за проектиране /изготвяне на идеен проект/ извън горепосочените срокове.




Прилагам:

Подробен линеен график и диаграма на работната ръка, изготвени съобразно изискванията от документацията за участие.

Забележка: Във всяка от таблиците, в които участникът сам прави изброяването, той може да добавя толкова редове, колкото са му необходими.

ВАЖНО!!! Всяка страница от техническата оферта трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

ДАТА: 15.05.2015 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ: _____

ЗАБЕЛЕЖКА:: Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик - ПЛИК №2 за всяка обособена позиция по отделно!

Участник, който представи програма, която не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Ръка

Ръка

Предложение за изпълнение на поръчката

I. Въведение

Обект на настоящата обществена поръчка е „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции

Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Запад“ №55 ”

Сградата е с монолитна носеща конструкция, с монолитни стоманобетонни основи, стени и плочи. Състои се от един вход.

При изпълнение на поръчката, „Строителство и саниране-инженеринг-консулт“ ЕООД ще съблюдава спазването на изискванията на:

- Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;

- Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;

- Европейското законодателство и други.

- БДС - Български държавен стандарт, или еквивалентен;

- Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Наредба от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;

- Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии;

- ПБЗУТ План за безопасни и здравословни условия на труд;

- БХТППО Безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана;

- Наредба за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции / ДВ бр.97 от 25.11.1994 г., посл. изм. и доп. бр., 53 от 11.06.1999 г./;

- Закона за енергийната ефективност;

- Наредба № 7 на МРРБ от 15.12.2004 г. за топло-съхранение и икономия на енергия в сгради, в сила от 01.03.2005г.;

- Наредба № РД-16-296 от 1 април 2008 г. За енергийните характеристики на обектите. В сила от 11.04.2008 г. Издадена от Министерството на икономиката и енергетиката и Министерството на регионалното развитие и благоустройството Обн. ДВ. бр.38 от 11 Април 2008г.

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

- Закон за опазване на околната среда.

- Закон за защита от шума в околната среда.

- Проект "Енергийно обновяване на българските домове" по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

II. Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката

Изпълнението на настоящата поръчка започва да тече след датата на съставяне на Протокол обр. 2 (2а) по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво. Етапите за изпълнение са:

1. Временно строителство и подготвителни работи -мобилизация – изготвяне оценка на риска, доставка на контейнери за отпадъци, докарване на необходимата строителна механизация и работно оборудване, групиране на работниците в работни звена и разпределяне на дейностите, начално захранване на обекта със строителни материали, доставка на предпазна ограда и информационни табели, подготовка на необходимата документация.

Основният ремонт на сградата изпълнението на групи обобщени видове строително-монтажни и инсталационни работи. Съгласно съставената количествена сметки с видове работи за изпълнение, най-общо ще се изпълнят следните дейности:

- **Екстериорни дейности**

- Очукване на подкожувшена мазилка;
- Подмяна на обшивки;
- Подмяна на стара дограма с нова PVC дограма, вкл.подпрозоречни первази;
- Топлоизолационна система по фасадни стени;
- Направа на хидроизолация по покрив;
- Топлоизолиране с минерална вата на покрив;
- Топлоизолиране на под
- Мълниезащитна инсталация
- Инсталационни работи по част ОВ

- **Интериорни дейности**

- Обръщане на дограма вътрешно
- Инсталационни работи по част Електро;
- Възстановителни работи по конструкцията(конструктивно)
- Освежаване стълбищни клетки

III.Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение

1. Последователност на дейностите и мотиви

Дейностите по фасадите, покрива, пода, ел.инсталациите и входовете ще се изпълняват успоредно от отделни групи работници впредвид кратките срокове за изпълнение.

На обекта ще се закарат контейнери за строителни отпадъци, ще се закара необходимата дребна механизация, ще се монтира предпазната ограда, за да се избегне преминаване на външни хора покрай участъка, в който ще се извършват конкретните интервенции. Ще се монтират обозначителни и информационни табели. Ще се закара стротелното скеле на обекта. Ще се извърши първоначално захранване със строителни материали на обекта и ще се вземат размерите на дограмата подлежаща на смяна, за да се направи заявка към производителя. Ще се приготви необходимата документация за обекта – проекти, заповедна книга, книга за ежедневен инструктаж, книга за периодичен инструктаж, протокол за откриване на строителна площадка и др.

Приоритетно следва демонтаж на старата дограма, иззиждане на тераси, където е необходимо и монтаж на новата дограма, вкл. и алуминиевите врати, за да може да стартира монтажа на строителното скеле и топлоизолационната система по фасадите. Същите ще се правят една след друга, като започваме с монтаж на скеле, демонтират се външните тела на климатиците и следва монтаж на топлоизолация EPS 5см, обръщане на страници на прозорци с EPS 2см. Монтират се външните подпрозоречни первази непосредствено преди направата на мазилката. Веднага след това започва направата на мазилката от горе надолу по фасадата, като се приключи с цокълната минерална мазилка, за да не се цапа при направа на горната част.

Успоредно с фасадите започват изолацията по пода и покрива. Монтира се минералната вата и пароизолационното фолио в подпокривното пространство.

Демонтира се старата хидроизолация и ламаринената обшивка и на местата които е нужно се възстановява разрушената замазка. Грундира се с битумен грунд и се полагат новите два пласта хидроизолация. Долния пласт е без посипка, а горния с посипка. Монтира се новата ламаринена обшивка и се правят холкерите от хидроизолация.

След подмяната на дограмата екип от работници работи по възстановяване на вътрешните страници на прозорците. Прави се обръщане с гипсокартон, шпаклова се и се боядисва с латекс.

Успоредно с екстериорните дейности се извършват и интериорните дейности. На сутеренната плоча и стената на сутерена се почиства бетона и армировката, обезпрашава се, водонапива се и се полага полимерен разтвор за възстановяване. Демонтират се осветителните тела, проводниците, пожарните касети и се монтират нови проводници. Прави се нова мазилка във входовете, шпакловка, боядисване с латекс и блажна боя по цокъл, парапети и врати. Когато всичко е готово се монтират новите енергоспестяващи тела с фотоклетка и новите пожарни касети. Боядисва се металната част на стълбищния парапет и се възстановява дървената ръкохватка на същия, т.к. на много места тя изцяло липсва. Монтират се нови етажни ел.табла и ГРТ. Обекта окончателно се почиства от строителни отпадъци, които се натоварват и извозват на депо за отпадъци.

2. Подробно предложение за реализиране на всички дейности в техническата спецификация (съгласно нормативните изисквания)

Предлагаме следната технология за реализирането на дейностите от техническата спецификация:

1. Обрушване на подкожувена мазилка

В процеса на увреждане на мазилката се появяват мокри петна по фасадата, след което тя започва да се рони, отлюспват се слой след слой, на места целият пласт мазилка се отлепва и при почукване кънти на кухо, а след време парчето пада и се открива зида.

Първата задача е чрез изкъртване да се отстранят до бет.стена всички нездрави и повредени участъци от мазилката. Това най-често се налага в близост до цокъла и повредената мазилка се изкъртва на височина около 1м. над границата на овлажняване. Може да се използва къртач, може и обикновено длето и чук. Макар и наглед здрава, скритите места с отлепена от основата мазилка се откриват лесно чрез почукване с чук. Несвързаните песъчинки, частици от мазилката и прах се почистват със състен въздух.

Повредените участъци мазилка се отстраняват до достигане на здрава основа и здрава мазилка.

2. Подмяна на стара дървена дограма с нова PVC дограма и ал.врати

Демонтажът и монтажът на прозорци ще се извършва от вътрешната страна на помещенията.

Демонтаж на дървената дограмата ще се извърши по възможно най-внимателния начин, за да се избегне изкъртване на големи парчета от мазилката и тухлените зидове по страниците на прозорците. Откачат се крилата на прозорците, след което се демонтират касите. След демонтирането на старата каса, отворът в стената следва да се обработи, като се почисти от строителни отпадъци основно, и се оформи според параметрите на новият прозорец. Правилно изсидан отвор е този при който зидарските мерки надвишават с по 2см столарските. Всички елементи, трябва да се монтират отвесно, хоризонтално и допрени.

Монтажът на новата дограма се осъществява чрез захващане на касата към зида посредством крепежни елементи - метални дюбели на разстояние 50-60см. За цялостното уплътнение на фугите между касата и зида се полага пенополиуретанова пяна със специално предназначение.

След като пяната се втвърди, излишъците се изрязват, след което лufта между рамките и външната част на стената се запълва със силикон за по-добро уплътнение.

Важно е да се напомни, че не е желателно отварянето на крилата в срок от 12ч. след приключването на монтажа.

След монтажа на новия прозорец довършителните работи за дооформяне на прозореца и финализиране на целият процес по подмяната са последваща операция, която се извършва от други специалисти.

След приключване на монтажните работи трябва да се провери функционирането на всички отваряеми части.

3. Външни подпрозоречни первази

Външните подпрозоречни первази се монтират под наклон от 5°, който е достатъчен за отвеждане на водата, а предният им водооткапващ кант излиза най-малко 30-50 мм пред фасадата. Това редуцира водното натоварване на фасадата и намалява замърсяването на фасадата при отичането на водата.

Подпрозоречната дъска се завива, заедно със закрепено за гърба ѝ уплътнение, към дограмата и се поставят капачките на главите на монтажните видии. За да се гарантира сигурна връзка с топлоизолационната система, на долната част на подпрозоречната дъска се залепва уплътнителна лента. Тази лента се полага така, че да е изравнена с ръба на топлоизолационните плочи и се обръща на горе по бордовете.

След приключване на монтажа на подпрозоречната дъска, се полага финишната мазилка до канта на страничните бордове.

4. Вътрешни подпрозоречни первази

Подпрозоречната дъска (перваз) е хоризонтална дъска, която се поставя в основата на прозореца. Монтира се под прозореца като захващането става посредством винтове. Страниците на перваза се затварят с капачки.

5. Обръщане на страници вътрешно

Най-общо казано процесът обръщане на врати и прозорци представлява обработка на онези ъгли, които се намират в пространството между дограмата и стените или пък тавана.

Самото обръщане ще извършим с помощта на гипсокартонни плоскости, шпакловка и ръбохранител. Този процес има за цел да изправи страните на касата, но наред с това той се извършва и заради скриването и запълването на следите, които остават след смяната на старата дограма с нова. Ще се облече с гипсокартонна кутия нарушения ъгъл, слага се ръбохранител и се измазва с тънък слой гипсова шпакловка.

6. Топлоизолационна система по фасади

Подвеждане на теплоизолацията се извършва с конец и нивелир. На четирите края на всяка фасада се монтират парчета стиропор, които се нивелират и по тях се опъват конци. Целта е стената да се вкара в права равнина, като се засече денивелацията по цялата площ. При необходимост от корекции парчетата стиропор се донапасват в зависимост от хлътването или издатините на фасадата. След това се монтират подвеждащите алуминиеви профили на нивото на цокъла. Ако фасадите са с по-голяма денивелация или както масово се практикува без хастарена мазилка, тогава лепенето на гребен е невъзможно и се използва линейно-точков метод за нанасяне на лепилото. При тези случаи използването на подвеждащ ъгъл е невъзможно. Тогава се прибегва до подвеждане с алуминиеви или дървени мастари.

Разбъркването на лепилото задължително да става по рецептата и предписанията на производителя. Лепилото се разбърква и остава да престои 5-10 мин. условие, което е от голямо значение за добрата адхезия на лепилото към основата и особено към EPS плоскости. Нанасяне на лепилото по линейно - точковия метод е да се намаже периферията на листа с непрекъсната линия от него и да се сложат няколко топки допълнително по площта му. Локацията на топките се съобразява с дюбелирането впоследствие. Дебелината на слоя се съобразява с необходимостта от корекции на листа след залепването му на фасадата.

Лепенето на плоскостите се извършва, като вертикалните им фуги се разминават на всеки ред най-малко с 30% от дължината на листа - тип "зидария". За подравняването им се използват алуминиеви мастари. Вертикалната линия и равнината на цялата фасада се следи постоянно с конец и нивелир. Платната се прилепят плътно едно до друго без да се допуска навлизане на лепило по фугите им. Ако при реденето се получи раздалечаване на фугите, то те се уплътняват с парчета от същия материал. Навлизане на лепило между фугите образува термомост, по който влагата от атмосферата преминава към стената на сградата и е предпоставка за образуване на конденз в помещенията. Също така нежелано последствие е замръзването на влагата в термо-моста през зимата - започва разрушаване на слоя мазилка, а от там се компрометира и ефективността на ТИ системата.

При ъгли на прозорци и врати, платното задължително се зарязва Г-образно. Това са слаби детайли в системата, които трябва да бъдат подсилвани. Не се допуска естествената хоризонтална фуга на реда или вертикалната фуга на ръба да преминава през ъгъла на технологичния отвор. Прозорците се обръщат с листове стиропор EPS с дебелина 2см. При преодоляване на голяма денивелация на стените се използват плоскости с различни дебелини за обикране на луфтовете. Така например, ако се налага допълнителен пълнеж се слагат две платна едно върху друго. Тук трябва да се обърне внимание, че платното обикащо луфта задължително се дюбелира с 4-5 дюбела. За платното, което се лепи върху него се подготвят по-дълги дюбели, съобразени с новата дълбочина до фасадата. Ако обаче се случи равнината

на ТИ плоскостите да забие в стената, то това трябва да е не повече от 10мм и тогава само се зарязва платното отзад с макетно ножче.

Дюбелирането се извършва поне 24 часа след залепването на платното на фасадата. Лепилото трябва да е стегнало, за да не хлътне платното навътре, когато се набива с чука.

Дюбелирането се извършва само там, където има лепило. Ако не се спазва тази технология по фасадата ще се получат множество неравности. Също така е задължително дюбелът да се набива до пълното си навлизане в стиропора, и преди шпакловката с мрежа да се подмаже с

лепило дупката, която се е получила. След приключване на дюбелирането и преди започване на шпакловката всички глави на дюбелите задължително се шпакловат.

Шпакловка с мрежа се започва отгоре надолу, като се избира за начало външен или вътрешен ъгъл на сградата. Лепилото се нанася на ивица от 1м по цялата височина на сградата. След това мрежата се полага върху него притискайки я с маламашката. Започва се от стрехата на покрива или най-високата част на фасадата в посока надолу към цокъла. Когато мрежата се залепи, лепилото започва внимателно да се загладва и материала в повече се връща обратно в баките. Следващото парче мрежа трябва да застъпи 10см от старото. Процедурата се повтаря. При всички вътрешни ъгли мрежата трябва да се застъпи поне 20см. с мрежата на съседната стена. При прозорците се реже, след като вече е залепена. Ъглите на технологичните отвори се армират допълнително с парче мрежа, положено на 45° спрямо отвора, преди полагането на основната мрежа. След нанасяне на мрежата се полагат PVC лайсни по всички ъгли на фасадата, както и всички необходими водобрани по тераси и прозорци. Следва втора, а понякога и трета ръка шпакловка за изравняване повърхността на фасадите. Преди да се започне работа по полагане на мрежата всички прозорци и врати се завиват с найлон, залепен с хартиено тиксо.

7. Теплоизолация по страници на прозорци

Теплоизолацията по страници ще се изпълни с 2 см. EPS. Накрояват се ивиците според широчината на страниците, като се вземе предвид и дебелината на новата вече монтирана фасадна теплоизолация. Залепят се, като плоскостите се мажат с лепило на гребен. Дюбелират се и отгоре се шпакловат. Полага се мрежа, която се притиска с маламашката и отново се шпаклова.

8. Полагане на минерална мазилка

Грундирането се извършва ден преди нанасяне на мазилката. Така мазилката покрива безпроблемно площите, без да има опасност от прозиране на основата под мазилката. Когато се нанася грунда, не трябва да се допуска стичане на капки по фасадата. Разнася се старателно с мечето по основата, а при козирката и обръщането на прозорците се използва четка.

Нанасянето на мазилката се извършва с инструменти от неръждаема ламарина. Мазилката се нанася и обработва само с метална маламашка. Преди да започне нанасянето, мазилката трябва добре да се разбърка в баките. При отлежаването и по складовете, зърната в нея вследствие на тежестта си, се утаяват на дъното на бака. Те трябва да бъдат равномерно разпределени и смесени с останалия материал. При необходимост в мазилката се добавя минимално количество вода (100-200гр), но само след консултация с производителя или негов представител. При всички нанасянето е идентично - нанесена един път мазилката

на фасадата, може да започне обработване след около 10-15 минути при температура 20°C и относителна влажност на въздуха 50-60%. Оформянето се постига чрез хоризонтални, вертикални или кръгообразни движения по повърхността на мазилката. Започната една стена, не трябва да бъде прекъсвана, докато не се завърши цялата. Технологичната последователност на работа изисква плотовете на прозорците и цоклите на сградата да бъдат завършени преди нанасянето на мазилката. Ако това не се случи, визията на фасадата може да бъде компрометирана.

9. Монтаж на осветителни тела с фотоклетка

При монтажа на новите осветителни тела ще използваме съществуващата инсталация и кабелните изводи от демонтираните тела. Фиксира се основата на тялото към тавана с дюбели. Свързват се с проводниците. Пурите се монтират в предназначения за тях легла, чрез завъртане на 90°.

10. Монтаж на кабели за осветителна инсталация

Кабелите, които ще се монтират ще са със скрит монтаж. Изкопават се улеи, в които се полагат гофрираните тръби. Послед през тях се изтеглят проводниците, а улеите се запълват с вароциментов разтвор.

IV. Организация и подход на изпълнение на поръчката. Взаимовръзка Линеен график-организация и подход на изпълнение

1. Разпределение на работната ръка и механизацията, диаграма на работната ръка

За компетентното ръководство на обекта ще бъде ангажиран екип от технически правоспособни лица в състав:

- **Технически ръководител :** инж. *Борислав Каменов Борисов*

Техническият ръководител е длъжностното лице на изпълнителя, което е пряко отговорно за обекта. Контролира всяка едно СМР, спазването на графика, контролира последователността на изпълняваните строително-монтажни работи и извършва необходимите промени в организацията на работа с цел оптимизиране процеса на работа, изисква добро качество на изпълнение, координира работата на работните групи от различните специалности, планира нуждите от строителни материали и механизация и организира доставките им до обекта.

Техническият ръководител изготвя необходимата отчетна документация относно изпълнените количества СМР, вложените материали и труд, координира дейността на обекта и взаимоотношенията с Възложителя, Строителния надзор, Държавна и общинска администрации.

- **Експерт по контрол на качеството:** инж. *Гергана Мирчева Станимирова-Каменова*

Прави оглед на място, като всякакви забележки по качеството се отстраняват от изпълнителя. Планира, организира и координира производствената дейност. Контролира и организира техническата и технологичната подготовка на обекта. Контролира качеството на влаганите материали, следи за спазване на изискването на проектната документация и наредбите. Следи за качественото изпълнение на строително-монтажните работи.

- **Експерт по безопасност и здраве (КБЗ):** инж. Петя Белева Найденова

Координира контрола по правилното извършване на СМР, предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на лицата, свързани с осъществяване на строителството, актуализира плана за безопасност и здраве при отчитане на настъпили изменения с напредването на СМР. Координира действията на всички участници в строителството за осигуряване на ЗБУТ на строителната площадка. Дава нареждания и забележки по отношение на използването на лични предпазни средства, на изпълнението на дейностите за осигуряване на безопасна работа на работниците и водене на дневниците за инструктажи. Има за задача да гарантира реализацията на мероприятията за подобряване на управлението и спазването на законовите изисквания по отношение на производствения контрол, здравословните и безопасни условия на труд и опазването на околната среда. Разработва и актуализира Правилника за вътрешния ред по отношение задълженията на длъжностните лица, работниците и служителите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и обвързването им със степените на дисциплинарно наказание съгласно Кодекса на труда.

Методологията на строителният процес се основава преди всичко на нашият опит в изпълнението на обекти с различна трудност, оформеният през годините колектив от опитни строителни работници и инженерно-технически персонал. Технологията на всяка една строително-монтажна дейност е с ясна последователност, стриктно придържаща се към времевия график, който е разработен така, че да осигури максимална приемственост, ефективност и последователност през целия строителен процес.

При изготвянето на графика за изпълнение на обекта се установи следната необходимост от работна сила, така че СМР да бъдат изпълнени с необходимото качество в срок:

- Средно-списъчния състав е 85 работника;
- Максималния брой е 113 работника.

„Строителство и саниране-инженеринг-консулт“ ЕООД разполага с необходимата работна сила и съответния брой работници ще бъдат на разположение за изпълнението на обекта.

Работната ръка ще бъде разпределена максимално ефективно, с оглед да няма голяма динамика на броя работници на строителната площадка в периода на изпълнение на обекта и извършване на стриктен контрол от техническия ръководител на работния процес.

Взаимовръзката линеен график-организация и подход на изпълнение е съвкупната последователност от всички строително-монтажни работи, окрупнени на подгрупи, следвайки строгата последователност, отразена в времевия график, отразяването на всички мероприятия, които гарантират че строителния процес няма да бъде прекъсван от непредвидени обстоятелства.

Равномерността на диаграмата се проверява с коефициентите:

$$K1 = P_{\text{ср.сп.}} / P_{\text{max}} > 0,5 \quad K2 = T_{\text{ср}} / T_0 > 0,5$$

$$P_{\text{ср.сп.}} = \Sigma T_p / T_0$$

$P_{\text{ср.сп.}}$ - средносписъчен брой на работниците

P_{max} - максималния брой на работниците

$T_{\text{ср}}$ - времето, през което броят на работниците на строителната площадка е равен или по-голям от изчисления среден брой, календ. дни

То-общото времетраене на строителството по календарния график, кал.дни

$$\Sigma Tr = 2564,00$$

Диаграмата на работната сила трябва задължително да удовлетворява следните критерии за равномерност на работната ръка:

$K1 = R_{cp} / R_{max} \geq 0,50$, където R_{cp} е средносписъчния състав на работниците, а R_{max} е максималния брой на работниците

$K2 = T_{max} / T_o \geq 0,50$, където T_o е срокът за изпълнение на обекта, а T_{max} е времето, през което броят на работниците заети на обекта е равен или по-голям от средния брой работници

$$R_{cp.sp.} = \Sigma Tr / T_o = 2564/30 = 85,47 - \text{Приемаме } R_{cp} = 85 \text{ работника}$$

$$R_{cp} = 85$$

$$R_{max} = 113$$

$$K1 = R_{cp} / R_{max} = 85/113 = 0,75 \geq 0,50$$

$$T_o = 20$$

$$T_{max} = 30$$

$$K2 = T_o / T_{max} = 20/30 = 0,67 \geq 0,50$$

2. Срок за изпълнение на поръчката

Календарният план представлява организационно-технологичен модел на осъществяването на строителното производство. С линейния календарен план са установени сроковете за изпълнение на СМР за обекта като цяло, на база правилно разработени технология, последователност и взаимна връзка за изпълнение на СМР. Календарното планиране има за цел да допринесе за съкращаване на сроковете на строителство на обекта, снижаване на стойността му и служи за оперативно планиране и управление на строителството.

Разработва се в следната последователност:

- **Производствен анализ :**

Разкриване и запознаване с архитектурно-конструктивните особености на обекта.

- **Определяне на списъка и обема на работите :**

Списъкът на работите и обемът им се съставя въз основа на количествената сметка на СМР.

- **Определяне на разхода на труд**

Разходът на труд за строителни процеси се измерва в чдни(човекодни) и се определя по следната зависимост:

Q- количеството на работата в натурални единици

Нвр-норма време, чч/нат.ед.

Нч.ч.=Q. Нвр - норма изработка

$Tr = Нч.ч / 8$ - необходими работни смени за изработка на количеството работа-при работна смяна от 8 часа

Бр.раб- работниците, които ще използваме за изработка на количеството работа

• Определяне на времетраенето на работите

В синтезиран вид, работната програма е представена чрез приложения линеен график. От него е видно, че работите ще бъдат завършени за 30 календарни дни или 1 месец при средносписъчен състав работници от 85 души. В графика са посочени дните за начало и край на всяка работа от изготвената количествена сметка. От него е видно, че е приложена успоредна организация на изпълнение на работите. Работата ще стартира веднага след откриването на строителната площадка.

При ръчно изпълняваните работи времетраенето е :

$Дни = Tr / Бр.раб$ -необходим бр.дни за изработка на количеството работа (работни дни)

* Срокът за изпълнение на настоящата поръчка започва да тече след датата на съставяне на Протокол обр. 2 (2а) по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво.

3. Доставка на материали

Доставките на материали ще се извършват регулярно по време на целия период на изпълнение на обекта на обществената поръчка, за да не се получава скупчване на излишно количество материали. Фирма „Строителство и саниране-инженеринг-консулт“ ЕООД разполага и със собствени товарни автомобили, които ще са на разположение през цялото време на изпълнение на обекта, при необходимост от допълнителни доставки.

Специалистът по контрол на качеството, заедно с техническия ръководител ще следят за коректност при доставките по отношение количеството и качеството на материалите.

4. Видове материали, предвидени за изпълнение на поръчката

	име	мярка	к-во
1	скеле фасадно	м2	4 908,12
2	ГРУНД БЕТОНКОНТАКТ	л.	872,32
3	EPS теразид	м3	209,49
4	дюбели теразид	бр.	31 074,80
5	лепило за EPS Теразид	кг	23 063,00
6	стъклофибърна мрежа Теразид 0,145кг/м2	м2	4 556,49
7	Шпакловка за ТИ Теразид	кг	21 363,00
8	ръбохранители	м	2 777,78
9	водооткапващ профил	м	1 077,78
10	грунд теразид	кг	908,32

„Строителство и саниране“ ЕООД

11	мазилка минерална-бял	кг	12 574,80
12	МАЗИЛКА ДЕКОРАТИВНА	кг	960,00
13	плочи мултипор	м2	429,00
14	лепило за мултипор	кг	1 716,00
15	ПАРОИЗОЛАЦИОННО ФОЛИО	м2	453,20
16	замазка циментова	м3	4,80
17	ГРУНД БИТУМЕН	л.	238,86
18	ХИДРОИЗОЛАЦИОННА МЕМБРАНА 3,5КГ БЕЗ ПОСИПКА	м2	915,63
19	ХИДРОИЗОЛАЦИОННА МЕМБРАНА 4КГ С ПОСИПКА	м2	1 038,13
20	ламарина поцинкована 0,5мм	м2	301,41
21	PVC ДОГРАМА	м2	507,00
22	AL ДОГРАМА	м2	90,00
23	GKB 12,5	м2	510,00
24	ЛЕПИЛНА СМЕС ЗА ГИПСОКАРТОН	кг	1 224,00
25	РЪБОХРАНИТЕЛ	м	1 020,00
26	гипсова шпакловка	кг	1 650,00
27	латекс	л.	791,00
28	подпр.перваз външен 17см	м	680,00
29	подпр.перваз вътрешен 20см	м	340,00
30	каменна вата 12см	м2	453,20
31	грунд полимерен	л.	11,00
32	полимер.модифиц.циментова мазилка	кг	82,50
33	МАЗИЛКА ВАРО-ЦИМЕНТОВА	кг	3 800,00
34	БЛАЖНА БОЯ	кг	277,50
35	пожарна касета	бр.	14,00
36	струйник	бр.	14,00
37	пожарен шланг	бр.	14,00
38	пожарен кран	бр.	14,00
39	ППР тръби 1 1/2"	м	350,00
40	фотинги ППР тръба 1 1/2"	бр.	350,00
41	Изолация тръбна Ф54	м	350,00
42	ОСВЕТИТЕЛ С ФОТОКЛЕТКА	бр.	70,00
43	мълниеприеман прът 4м	бр.	2,00
44	заземителни колове	бр.	4,00
45	съединител прав	бр.	4,00
46	алуминиево въже	м	108,00
47	шина 4x40	м	20,00
48	СВТ 3x1,5	м	140,00
49	тръба гофрирана Ф23	м	470,00
50	гофрирана тръба Ф29	м	810,00
51	СВТ 3x10мм2	м	470,00
52	СВТ 5x16мм2	м	810,00
53	ел.табла	бр.	14,00
54	ГРТ	бр.	1,00
55	итонг 125x250x600	бр.	750,00
56	лепилен разтвор	кг	1 800,00

„Строителство и саниране-инженеринг-консулт“ ЕООД			
57	вароциментова мазилка	кг	3 930,00
58	дървен материал	м3	0,78
59	лак за дърво	л.	9,80
60	болтове	бр.	98,00
61	система за центр.управление	бр.	1,00

5. Технически ресурс

„Строителство и саниране-инженеринг-консулт“ ЕООД разполага със следният технически ресурс:

- Заваръчен апарат 2бр.
- Оградни пана 200 м.л.
- Тръбно скеле 2000 кв.м.
- Пробивна техника 5бр.
- Лекотоварни автомобил 2бр.

V. Мерки за намаляване затрудненията за обслужване дейността на живущите

Фирма „Строителство и саниране-инженеринг-консулт“ ЕООД има в предвид факта, че сградата ще бъде обитаема по време на извършване на строително-монтажните дейности. Поради тази причина ще бъде изготвен общодостъпен подробен график за предстоящите ежедневни дейности във всеки от входовете. Ще се осигури безпрепятствен достъп до апартаментите и мазетата на живущите. На местата, на които се извършват интервенции ще има оградни пана и предупредителни табели. Работата в интервала 14-16ч. ще бъде преустановявана. Дейностите в апартаментите на живущите ще се извършват само в удобно за тях време на деня, след предварителна уговорка.

VI. Възможни рискове и тяхното управление

➤ Непредвидени лоши атмосферни условия

Въпреки, че в днешно време технологията за прогнозиране на атмосферните условия е доста напреднала, смятаме, че има нисък риск от непредвидено лошо време, което да възпрепятства работата ни. В приложения към Техническото предложение, Линеен календарен график, при изпълнението на екстериорните видове СМР сме заложили срокове съобразени с риск от такова забавяне.

Климатичните условия могат да повлияят върху изпълнението на договора и качеството на изпълнените видове работи при интензивни и продължителни валежи от дъжд в продължение на повече от 7 денонощия.

Всички видове СМР на открито са главно зависими от климатичните условия - СМР по фасадите и СМР по покрива. При изпълнение на договора ще спазваме нормативно определените температури в ПИПСМР за извършване на видовете СМР :

- Изпълнението на хидроизолационните работи (грудиране на основата и полагане на хидроизолацията) трябва да се извършва върху суха основа, в сухо време и при външна температура над +5°C
- Изпълнението на вътрешни подови настилки и облицовки се допуска при температура на въздуха в помещенията + 5° C.

Мерките, които ще предприемем за предотвратяване и преодоляване на риска от забавяне и некачествено изпълнение на СМР, поради метеорологични условия са следните:

- Покривни работи - тъй като покривните работи не са обвързани с другите видове ремонтни работи те ще бъдат изпълнени при сухо време и температура над +5°C.
- Довършителни работи в сградата ще се изпълняват при температура в помещенията минимум +10°C. Тези температури ще се поддържат най-малко два дни преди започване на работите.

Т.к. очаквания период на изпълнение е пролетно-летния сезон смятаме, че има много ниска степен на въздействие върху изпълнението при възникване на този риск.

➤ **Забава доставката на материал**

За изготвяне на коректна оферта сме направили подробно проучване на пазара на материали в гр.Благоевград и околностите му. Избрали сме оптималният вариант качество-цена-надеждност на доставчици. Т.к. според нас има среден риск от забава, поради неналичност на някои материали, или лоши климатични условия, или проблеми при самия транспорт на материалите, мерките за недопускане и преодоляване на риска, които сме предвидили са следните:

- при сключване на договори с фирми-доставчици на материали за конкретния обект, ще се заложат достатъчно високи неустойки за евентуална забава, за да се минимализира риска от такава;
- алтернативни варианти за работа с няколко доставчика, които да могат да реагират своевременно при евентуална ситуация;
- при забава на решаващи за строителството материали, като дограмата например, се ангажираме с незабавно установяване на проблема и разрешаването му във възможно най-кратък срок, както и преорганизиране на работния процес и работните звена, така че да се навакса забавата.

➤ **Възникване на непредвидени СМР**

Впредвид количеството и обема работа, която е предвидена, смятаме че допълнително възникналите СМР не биха били проблемни за нас и определяме риска за възникване на евентуална забава на строителството като среден.

Като превантивна мярка за недопускане и преодоляване на риска:

- ресурсите, които ще използваме за изпълнение на поръчката са така предвидени и организирани, че да можем да поемем поне още 20% непредвидени СМР;
- специалистите по отделните видове работа, както и екипите сформирани за различните видове СМР са ангажирани изцяло и само с тази поръчка. Така те ще са в постоянна готовност за започване на непредвидена работа.

➤ **Несъответствие на материала с предварително заложените технически характеристики**

Основните строителни материали ще се доставят на обекта пакетирани и палетизирани според техния вид и размери. Вероятността от доставка на материали с различни /по-лоши/ технически характеристики от предвидените сме оценили като ниска. За предотвратяване на вероятни грешки сме предвидили следните мерки:

- Всички вложени материали и продукти ще бъдат проверявани дали съответстват на изискванията на техническата спецификация от отговорника по качеството във фирмата – инж.Гергана Станимирова или от упълномощено от него лице.
- За всички използвани материали ще се предоставят на Възложителя Декларации за съответствие.
- При необходимост ще се ползва специализирана лаборатория за извършване на контролни проверки на показателите на продуктите.
- Няма да се допуска влагането на материали с изтекъл срок на годност. На всички доставени материали, ще бъде извършвана проверка на сроковете на годност и ако бъдат доставени материали с изтекъл такъв, те ще бъдат своевременно връщани на доставчика.
- Материали и продукти с нарушена цялост ще бъдат върнати и подменени с нови.

➤ **Недоволство на граждани и ползватели на съседни обекти, относно шум и замърсяване**

Главните отпадъци от строителството са стара дограма и мазилка. На обекта ще са на разположение 5 контейнера за строителни отпадъци, които ще се извозват на депо за отпадъци. Оценяваме вероятността от замърсяване, като ниска, т.к. обектът демонтажни и разрушителни дейности са малко. Всяко обособено работно звено е задължено след края на работния ден да почисти работното място и да се изхвърлят отпадъците на определените за това места.

Изпълнението на предвидените в КСС, строително-монтажните дейности не е съпроводено с голям брой шумни операции и оценяваме степента на въздействие върху изпълнението при възникването на този риск като ниска. Източници на шум най-често са пробивните инструменти; пневматичното работно оборудване; двигателите с вътрешно горене на различните видове машини и т.н. Работещите, както и ползвателите на съседни обекти са изложени не само на шума, създаван от оборудването, но и на шумовото въздействие на заобикалящата ги среда, както и на шума от други дейности на строителната площадка.

Мерките за ограничаване на шума по време на строителството се определят в зависимост от избраното местоположение на строежа, разстоянията до съседните сгради, продължителността и фазите на строителството, продължителността на работите през деня и през седмицата, както и от използваните строителни машини и транспортни средства. Ако при оценката на риска се установи превишаване на горната стойност на експозиция за предприемане на действия, се ангажираме с разработването и приложението на програма от технически и/или организационни мерки, за да се сведе до минимум експозицията на шум и произтичащите рискове. При наличие на наднормени нива на шум в зависимост от технологичните възможности ще се прилагат технически решения за неговото ограничаване чрез екрани, кожуси, покрития, ограждения, дистанционно управление на машини и съоръжения и др.

➤ **Не добра организация и планиране на последователността на, строителните процеси и съответно планиране на доставките на материали и наличието на организирани работни звена. Недостатъчна квалифицираност на работните звена**

„Строителство и саниране-инженеринг-консулт“ ЕООД е фирма насочена към строителния отрасъл – строителство, строителни ремонти. За периода на своето съществуване фирмата се развива във възходяща градация. Специализирана е в строителството на жилищни и обществени сгради. Монолитно строителство и метални конструкции. Довършителни работи. Изграждане, поддръжка и ремонт на В и К, отопление и вентилация /ОВ/ и климатични инсталации, монтаж на бойлери, мивки, батерии, вани и душ-кабини, перални, миялни, радиатори. Изграждане на всички видове силно и слабо токови инсталации - табла, контакти, осветление, озвучаване, видеонаблюдение, СОТ, Building Management System (BMS), пожароизвестяване, контрол на достъп, телевизия, компютърни мрежи, сървърни помещения. Изграждане на хидротехнически съоръжения и др.

Ние държим на добрата и стегната организация на работа, стриктното спазване на технологичната последователност на строителните процеси и точното прилагане на изискванията на нормативната база в отрасъла, за да могат резултатите ни да са съобразени с високите експлоатационни и художествено-естетически критерии на крайния потребител. Политиката ни е ориентирана към непрекъснато удовлетворяване изискванията и очакванията на инвеститорите за подобряване и уеъвършенстване на качеството на изпълняваните строително-монтажни работи.

Разполагаме с бригади за изпълнение на разнообразни строителни задачи, като в зависимост от трудоемкостта на възложения обект сме в състояние да привлечем допълнително необходимите трудови и ръководни ресурси. За изпълнение на довършителни работи по обектите разполагаме с висококвалифицирани специалисти за изпълнение на основните довършителни работи.

Смятаме, че рискът от забава поради липсата на организация, както и лошо качество поради неквалифицираност на работниците е нисък.

	Възможни рискове	Възможни последиви	Степен на въздействие	Мерки за недопускане	Мерки за преодоляване
1	Непредвидени лоши атмосферни условия	Ненавременно изпълнение на обекта	ниска	Прогнозиране на атмосферните условия	Изпълнение на дейност, която не се влияе от тях
2	Забава доставката на материал	Ненавременно изпълнение на обекта	средна	Подробно проучване на пазара на материали; неустойки за евентуална забава	Алтернативни варианти за работа с няколко доставчика; преорганизиране на работния процес
3	Възникване на непредвидени СМР	Ненавременно изпълнение на обекта	средна	Ангажираност на екипите само с тази поръчка; проучване видовете СМР още при започване на обекта	Възможност за поемане на още 20% непредвидени СМР
4	Несъответствие на материала с предварително заложените технически характеристики	Ненавременно изпълнение на обекта	ниска	Работа с дългогодишни партньори- доставчици на материали, с които имаме изградено взаимно доверие	Проверка дали съответстват на изискванията на техническата спецификация; Декларации за съответствие; проверка на сроковете на годност

5	Недоволство на граждани и ползватели на съседни обекти, относно шум и замърсяване	Ненавременно изпълнение на обекта	ниска	Типа на голям брой шумни операции; Съобразяване с вдигането на шум в периона между 14,00-16,00ч., сутрин преди 8.00ч. и вечер след 20ч.	Разработване и прилагане на програма от технически и/или организационни мерки, за да се сведе до минимум експозицията на шум; ограничаване на шума чрез екрани, кожуси, покрития, ограждения и др.
6	Не добра организация и планиране на последователността на строит. процеси и съответно планиране на доставките на материали и наличието на организирани работни звена. Недостатъчна квалифицираност на работните звена	Ненавременно изпълнение на обекта; Некачествено изпълнение на обекта;	ниска	Дългогодишен опит на фирмата в строителния отрасъл; стегната организация на работа, стриктното спазване на технологичната последователност на строителните процеси и точното прилагане на изискванията на нормативната база в отрасъла	Възможност да привлечем допълнително необходимите трудови и ръководни ресурси

VII. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

➤ Общи положения :

Забранява се допускането до работа на строителната площадка на лицата, които:

1. не са съответно инструктирани и обучени по БХТПО;
2. не са запознати с плана за ликвидиране на аварии и с инструкциите за дейност при авария на строителната площадка;
3. не са снабдени или не ползват съответно изискващите се специализирано работно облекло, обувки и лични предпазни средства;
4. имат противопоказни заболявания спрямо условията на работа, която им се възлага;
5. са правоспособни или имат съответната квалификация, но са преместени на друго работно място и не са преминали инструктаж за условията на новото работно място;
6. са в нетрезво състояние;

Забранява се допускането на лица, навършили 60 години до работа на височина, за която се изисква ползването на предпазни колани.

Подходите, преходите и входовете към обекта, намиращи се в опасните му зони или в опасните зони на ползваните строителни машини, скелета, платформи и други, да се осигуряват на не по-малко от един метър извън габарита им с предпазни подове, козирки и други, годни да понесат страничен товар най-малко от 2.5kN/m^2 , ако конкретните условия на обекта не предявяват други по-високи изисквания.

Отворите в подовите да се обезопасяват с парапети или временни покривни подове, които понесат предвидения товар и да са осигурени срещу непредумишлено разместване.

Зоните и местата на строителната площадка, криещи потенциална опасност, да се обозначат със знаци по БДС 11010 - 73 или табели със съответните надписи.

Издигането и свалянето на и от височина на всякакъв вид товари - материали, изделия, инструменти и други, да става по правило по механизирани начин.

Забранява се тютюнопушенето на обекта, ще бъде разрешено само на определени места и определено време.

Забранява се ръчното изпълнение на работите по горният абзац чрез хвърляне, ръчно подаване от ръка в ръка или с помощта на въжета, телове, арматурна стомана и други подобни.

При работа с материали, отделящи пожаро и взривоопасни пари и газове, се забранява пушенето, ползването на открит пламък или на огън, на нагревателни уреди, на транспортни средства, без изпускоуловители, на инструменти при работа с които, защитата не отговаря на класа на помещението или на околната среда.

Изпълнението на всички СМР на открито да се преустановява при нареждане на техническия ръководител на обекта, а в негово отсъствие - от бригадира на съответната бригада. При силен дъжд, гръмотевична буря, обилен снеговалеж, при условия на заледени или непосипани с пясък работни места, при гъста мъгла, през тъмната част на денонощието, или при прекъсване на изкуственото осветление, както и при скорост на вятъра 12м/с, ако не са предвидени други изисквания за съответния вид работи от този правилник.

➤ Средства за индивидуална защита

Ръководителят се задължава да осигурява специално работно облекло и лични предпазни средства в съответствие с Наредба №11 за специално работно облекло и лични предпазни средства.

Лицата, намиращи се на посещение и на работа на строителната площадка, да ползват предпазни каски. Предпазни колани да ползват всички работници и специалисти, които при работа на височина са изложени на опасност от падане.

Техническият ръководител се задължава да организира и провежда с работниците и служителите, които ползват лични предпазни средства, инструктаж и обучение за правилната им употреба и начините на личната проверка на тяхната изправност; да осигурява редовното изпитание на годността на средствата за индивидуална защита.

➤ Строителна площадка

Строителната площадка е оградена от временна ограда покрита с мрежа.

Забранява се направата на временни пътища и движението на строителни машини за разстояние по-малко от 2м между габарита на моторни строителни машини - скелета, платформи, люлки и други или конструктивни части на обекта и външния контур на пътното платно.

Спускането на строителни отпадъци от сгради и скелета на строителната площадка от височина над 1м ще става по закрити улеи или чрез подемник в сандъци или контейнери, като отпадъците предварително се навлажняват.

➤ Строителни машини

Допусканите до работа на строителната площадка строителни машини да имат паспорт и съответните инструкции.

Лицата, които работят със строителни машини, задвижващи посредством електрически двигатели, да отговарят на изискванията и да притежават удостоверение за втора квалификационна група по безопасността.

Забранява се работата със строителни машини или с отделни техни агрегати, системи или устройства не по предназначението им.

Забранява се работата със неокомплектовани, неизправни или небезопасни машини, съоръжения, инсталации, уредби, агрегати и други както и с такива, които не отговарят на изискванията.

При работа с машини и съоръжения, които създават опасна зона да се подават предупредителни сигнали - видът, редът и начинът на подаване, на които да се уреждат с инструкторите.

Забранява се извършването на техническо обслужване и на ремонтни работи на строителните машини, когато същите не са изключени от действие от захранването им и не са в пълен покой, а самите те или работните им органи - сигурно укрепени срещу преместване или пускане в действие от странични лица.

След приключване на работа лицата, работещи с машините се задължават да не оставят в състояние, което изключва възможността за пускане или привеждане в движение, преобръщане, самоволно придвижване на цялата машина или на отделни нейни органи.

При преминаване на строителни машини под електропроводи, работните им органи да се намират в предписаното в паспорта им положение за транспорт. Преминаването им извън пътищата да се извършва на местата с най-малък провес на електропровода.

Забранява се съхраняването в самите строителни машини на лесно запалителни, горивни, пожаро и взривоопасни вещества в съдове, количества и начин, противоречащи на разпоредбите на противопожарната охрана.

➤ Агрегати. Машини и инструменти

Забранява се ползването на агрегати, машини и инструменти за извършване на СМР, които не са електро обезопасени и изпитани, съгласно съответните изисквания, посочени в Правилника по безопасността на труда и експлоатация на електрическите уредби и съоръжения.

➤ Скелета, платформи и стълби

Забранява се ползването за извършване на СМР на височина на инвентарни скелета, платформи и люлки, за които няма паспорти от предприятията им производителки, с указания за монтажа, експлоатацията, допустимите натоварвания, демонтажа им и други. Забранява се ползването на скелета, платформи и люлки, когато:

- не отговарят на изискванията на паспорта или на проекта; не са анкерирани /укрепени/ към сградата или съоръжението;
- имат деформирани, пукнати, корозирали, загнили или липсващи елементи;
- луфтът между пода и стената на сградата /съоръжението/ е по-голям от 0,05м при изпълнение на зидарски работи е 0,2м при изпълнение на довършителни работи и полагане на топлоизолации.

Преди започване на демонтаж и монтаж на скелета, платформите и люлките, техническият ръководител се задължава да провежда инструктаж по безопасността на труда с работниците, които ги изпълняват.

На добре видимите места върху скелетата, платформите и люлките да се окачват табели, посочващи допустимия товар.

Забранява се използването на стълбите на скелетата и платформите за пренасяне и складиране на всякакъв вид товари.

Състоянието на платформите и скелетата и люлките да се проверява от бригадира преди започването на всяка смяна. При констатиране на неизправност работата да не започва, а ако неизправността се установи по време на работа, последната да се преустановява до отстраняването ѝ.

Работните площадки на скелетата, платформите и люлките да се обезопасят с парапет и бордова дъска.

Монтажът и демонтажът на скелетата, платформите и люлките да се извършва от опитни работници, ползващи предпазни колани, обувки с неплъзгащи се подметки, под непрекъснато ръководство на техническия ръководител.

➤ Покривни работи

Покривните работи да се изпълняват след като са взети мерки от техническия ръководител на обекта, осигуряващи безопасността на работниците срещу падане от височина, изгаряне от горещи разтвори или производствено технологично оборудване, падане на отделни предмети или от въздействие на вредни вещества.

До пускането на работници до изпълнение на покривни работи да се разрешава от техническия ръководител на обекта след:

- извършване на съвместна проверка с бригадира за здравината на носещите елементи, както и определяне местата за закачване на предпазните колани на работниците;
- ограждане на опасната зона около сградата или съоръжението и обезопасяване на отворите по покрива;
- поставяне на предпазни козирки над всички видове входи и проходи в опасната зона;
- поставяне на оградата, пред входовете и проходите на знаци по БХТПО или табели със съответните надписи;
- инструктиране на работниците по БХТПО със специално обръщане на внимание за местата, определени за окачване на предпазните колани, начина за ползване на стълбите и начините за складиране на материалите. За приемане и временно складиране на материалите за покрива да се устройват приемни площадки.

Складираните на площадката материали, инструменти и други да се подреждат и да се осигуряват срещу подхлъзване, търкаляне, падане, изтичане, разпиляване или преобръщане с вятър.

След свършване на работната смяна или при прекъсване работата останалите материали, празният амбалаж, отпадъците, инструментите и други да се свалят от покрива.

Забранява се заготвянето върху покрива на подлежащи на монтиране елементи, като ламаринени обшивки, водосточни тръби и казанчета, олуци и други.

Във вертикалния обсег на извършваните покривни работи се забранява изпълнението и на други видове външни работи на по-нисък хоризонт от сградата или съоръжението.

Работниците, извършващи работи в близост до контура на плоски покриви или покриви с наклон над 20°, както и необезопасени отвори да се ползват предпазни колани и обувки с неплъзгащи се подметки.

Забранява се извършването на покривни работи по наклонени покриви които са овлажнени, както и при дъжд, снеговалеж, поледица, гръмотевични бури, вятър със скорост над 10м/сек., намалена видимост в границите на работното място, както и на изкуствено осветление.

➤ Изолационни работи

Изолационните работи да се извършват като се спазват и съответните изисквания на:

1. Инструкцията на пожарна безопасност в строителството /Приложение 11 към Противопожарните строително-технически норми/, чл.34 до 45 вкл. - при изпълнение на киселинноустойчиви изолации.
2. Наредба №21 за безопасна експлоатация на газови съоръжения и инсталации /ДВ, бр. 57 от 17.07.1990 г., /, чл.126, 440, 441, 442 и 450 при извършване на изолационни работи с използване на газ пропан - бутан.
3. Правилника за производство, търговия, съхранение, пренасяне и употреба на силно действащи отровни вещества /ДВ бр. 34 от 1973 г. /, в зависимост от употребяваните вещества.

Изолационните работи да се изпълняват след като са взети от техническия ръководител и бригадира необходимите мерки за безопасност на работниците от възможно въздействие на отровни, летливи вещества и прах от използваните материали, както и срещу термични или химически обгаряния и падане от височина. Затворените помещения на строителната площадка, в които се изпълняват работи за приготвяне на изолационни материали и изделия с използване на битуми и други вредни вещества, да се осигури вентилация и средства за пожаробезопасност. След преустановяване или завършване на грундиране или нанасяне на битумни разтвори в затворени или полузатворени пространства и съдове да се забранява достъпът до тях и да се означават със съответните надписи. Възобновяването на работата в същите да се разрешава от технически ръководител след намаляване концентрацията на вредните вещества във въздуха най-малко до гранично допустимо ниво, в съответствие със санитарно - хигиенните норми.

Забранява се изолиране на повърхности, по които има подаващи се краища на проводници. В помещенията или площадки, където се работи с лесно запалителни изолационни материали, предварително да се осигуряват средства за потушаване на пожар, като азбестови одеяла, сандъци, пясък, пожарогасители и други, както и да се обозначават със знаци по БДС11010-73 или със съответните надписи. В тези помещения електроинсталациите, осветителните тела и други да са в изпълнение, съответстващо на класа на помещението.

➤ Дограмаджийски работи

Монтажът на прозорци да се извършва от вътрешната страна на помещенията. Монтажът на витрини, прозорци и други подобни на височина да се извършва от вътрешната страна на помещенията, при ползване на скелета или платформи.

➤ Монтаж на технологично оборудване

Забранява се монтажа на технологично оборудване, което няма технически паспорт с инструкция за монтажа и експлоатацията му както и на техническото оборудване, за което има такива, но те не са известни на лицето водещо или извършващо монтажа. При ползване на люлки за монтаж технологично оборудване, закрепването на куките и болтове им към подлежащо на монтиране технологично оборудване да става на терена преди вдигането му. При монтаж на техническото оборудване с електрозадвижване, техническият ръководител се задължава да вземе мерки срещу евентуално самоволно включване на електродвигателя му.

➤ Електромонтажни работи

Електро-монтажните работи да се извършват при спазване на съответните изисквания на правилниците.

Забранява се на лицата заети с електромонтажа, да извършват работи, свързани с експлоатацията на електросъоръженията на стр. площадка.

Забранява се използването на електрически мрежи, разпределителни устройства, табла и техни отделни разклонения и връзки, намиращи се в процес на монтаж за временни електрически мрежи и инсталации, нужни за обслужването на стр. площадка.

След предаване за изпитване на монтираната електроинсталация или оборудване се забранява провеждане на електромонтажните работи по същите, без разрешение на организацията, ръководеща пуска им.

➤ Общи изисквания по противопожарна охрана

Пожаро и взривоопасните места на територията на стр. площадка да се картотекират, съгласно изискванията на т.2 от Постановление №34 на МС от 08.08.1968 г. и се означат със знаци по БДС 11010-73 или снабдени със съответни надписи.

На строителната площадка да има на определени места от техническия ръководител на обекта и съгласуван с органите по противопожарна охрана винаги годни за употреба подръчни уреди, съоръжения и инсталации за пожароизвестяване и гасене, в съответствие с „Противопожарни строителнотехнически норми“.

Подръчните противопожарни уреди, съоръжения и инсталации за пожарогасене на строителната площадка да се зачисляват на лица, определени от техническия ръководител на обекта за отговорници по противопожарната охрана, на които лица да се възлага контролът и отговорността за поддържане и привеждане в състояние на годност на тези уреди, съоръжения и инсталации. Резултатите от проверките да се вписват в специален приобектовен дневник.

Забранява се ползване на уредите и средствата по преходния абзац за стопански, производствени и други нужди, несвързани с пожарогасене.

Пожарните кранове към вътрешната противопожарна водопроводна мрежа на ползваните сгради с постоянен характер на строителната площадка да има шлангове и струйници и да са затворени в пломбирани касетки.

Местонахождението на външните пожарни кранове към външната противопожарна водопроводна мрежа и водоемите, където такива се изискват от „Противопожарните строително технически норми“, да е означено с надписи.

Пожарните кранове и водоеми да са годни и използвани за гасене на пожар и при зимни условия.

Достъпът до подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене, до пожарните кранове и хидранти, до сградите и съоръженията на строителната площадка да се поддържа винаги свободен.

Забранява се оставянето и складирането на материали, части, съоръжения, машини и други, както и паркирането на ПТМ и на превозни средства по пътищата и подходите към противопожарните уреди, съоръженията и инсталациите за пожароизвестяване и пожарогасене.

➤ Тенекеджийски работи

За да се избегне опасността от падащи предмети - като материали, инструменти, инвентар се прави парапет в края на покривните повърхности.

Складирането на материали на покрива се извършва само на приемната площадка. При приключване на работната смяна от повърхността на покрива се прибират на определено място всички инвентарни предмети, приспособления, материали и др. Лебедките, обслужващи висящите люлки, трябва да бъдат осигурени с двойно спирачно устройство. Когато те са установени на земята, трябва да бъдат натоварени с баласт по тежест най-малко двойна на теглото на люлката. При лебедките не се допускат външни лица.

Забранява се извършването на тенекеджийски работи при поледица, гъста мъгла и вятър със скорост по-голяма от 10 м/сек, както и при проливен дъжд и обилен снеговалеж.

При рязане на ламарина с механична ножица, ръцете трябва да бъдат осигурени с ръкавици с брезент. Механизмите се смазват и почистват само при спряно положение. Електрическите устройства и проводниците трябва да бъдат изолирани и механизмите съответно заземени. Да не се започва работа на места опасни за здравето и сигурността за живота на работниците.

➤ Монтажно - инсталационни работи

Не се допускат до изпълнение на СМР по ВК, ЕЛ и ОВ инсталации работници под 18 годишна възраст и не минали инструктаж от органите на ТБТ към съответните подразделения.

Преди започване на даден вид работа бригадирът е длъжен да инструктира работещите в бригадата, като ги запознае с характерните особености на обекта. Той отговаря и за допуснатите нарушения.

Работниците задължително да бъдат инструктирани за опасността при работа с преносими ръчни и механизирани инструменти, с които си служат при изпълнение на строително-монтажните работи.

➤ Аварии и зпополуки, даване на първа помощ

На обекта ще има инструкции за дейност при аварии, които да обхващат всички възможни случаи на аварии и причините, поради които могат да възникнат, сигнала известяващ „аварийното положение“, както и да определят поведението и задълженията на всяко длъжностно лице и работник на строителната площадка в случай на авария. С плана за ликвидиране на аварии и с инструкциите за дейност при аварии да са запознати всички лица, допускани на работа на строителните площадки.

При подаване на сигнал известяващ аварийно положение на строителната площадка, техническият ръководител на обекта или заместващият го в негово отсъствие се задължава да вземе незабавно следните мерки:

- в случай на пожар да осигури незабавно уведомяване на съответните органи на ППО, а при всякакъв друг вид аварии - директорът на строителната организация или заместващите го;

- на мястото на аварията или в съседните застрашени участъци на сградата или съоръжението да прекрати изпълнението на всякакви СМР;

- да изключи напрежението, захранващо всякакъв вид производствено оборудване в аварийния участък;

- организира овладяване или локализиране на аварията като се ползват защитни или обезопасени инструменти или съоръжения;

- да разпреди отстраняването на безопасно място на служителите и работниците, неангажирани с борбата срещу аварията;

- на входовете и изходите на строителната площадка да се постави дежурна охрана.

Право за смяна на аварийното положение и възобновяване на работата има само едно оторизирано лице от строителната организация или заместващите го по заповед.

Отменянето на аварийното положение да става след окончателното премахване на причините за аварията, при невъзможност за нейното повторение, разпространение или разрастване, както и при условие, че са взети всички необходими мерки за обезопасяване на лицата и средствата при възстановяване на работа.

Всички дейности неописани в тези мероприятия по безопасност на труда трябва да се извършват съгласно правилника по безопасност на труда при СМР - кн.Д-02-001/1982г.

Строителят извършва оценка на риска преди започване на работа и до завършване на обекта осигурява:

- извършването на СМР в технологична последователност и срокове, определени в инвестиционния проект и в плана за безопасност и здраве;

- комплексни ЗБУТ на всички работещи и на лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност, при извършване на СМР на изпълняваните от него строежи;

- изработването и актуализирането на инструкции по безопасност и здраве, съобразно конкретните условия на строителната площадка по видове СМР и при спазване на изискванията по Наредба №2/2004 г.;

- избора на местоположението на работните места при спазване на условията за безопасен и удобен достъп до тях и определянето на транспортни пътища и/или транспортни зони;

- необходимите предпазни средства и работно облекло и употребата им в съответствие с нормативната уредба и в зависимост от оценката на съществуващите професионални рискове за всеки конкретен случай;

- инструктажа, обучението, повишаването на квалификацията и проверката на знанията по ЗБУТ на работещите;

- картотекиране и отчет на извършените прегледи, изпитвания, техническа поддръжка и ремонти на съоръженията и работното оборудване (електрическите и повдигателни съоръжения, строителните машини, транспортните средства и др.) и постоянния им контрол с оглед отстраняване на дефекти, които могат да се отразят на безопасността или здравето на работещите;

- необходимите санитарно - битови помещения съобразно санитарно - хигиенните изисквания и изискванията за пожарна и аварийна безопасност (ПАБ), времетраенето на строителството и човешките ресурси;

- поддържането на ред и чистота на строителната площадка;

- изискванията за съхраняване и отстраняване използваните опасни материали;

- събирането, съхранението и транспортиране на отпадъци и отломки;

При необходимост се изработва и утвърждава вътрешни документи (заповеди, образци и др.) за осигуряване на ЗБУТ, съобразени с конкретни условия. За да може по всяко време да бъде оказана първа помощ на пострадалите при трудова злополука, пожар, бедствие или авария се изготвя схема и вид на сигнализацията за бедствие, авария, пожар или злополука, с определено място за оказване на първа помощ.

На строителната площадка се оборудва противопожарно табло, аптечка и се оказват евакуационните пътеки.

На определено място на строителната площадка се поставя табела с информация за:

- Телефонен номер и адрес на служба за ПАБ

- Телефонен номер и адрес на „Спешна медицинска помощ“

- Телефонен номер и адрес на „Гражданска защита“ - спасителна служба

Оборудва се противопожарното табло с подръчни уреди и съоръжения. До тях се осигурява постоянен достъп като в близост до таблото се забранява складирането на материали и паркирането на машини. Уредите и машините е забранено да се използват за производствени и други цели.

VIII. План за организация по изпълнение на мерките за опазване на околната среда

• Политика по опазване на околната среда

Фирма „Строителство и саниране-инженеринг-консулт“ ЕООД има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на околната среда съгласно ISO 14001.

Като се има предвид естеството на извършваните строително-монтажни работи, смятаме, че Нормативната уредба, която трябва спазваме включва най-малко следните нормативни документи:

- Закон за опазване на околната среда (изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г.);
 - Закон за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г.);
 - Закон за чистотата на атмосферния въздух (изм. и доп. ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012г.);
 - Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (брой: 89 на Държавен вестник от дата 13.11.2012 г.);
 - Наредба №6 от 26.06.2006г. за показателите за шум в околната среда,
- отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.

Всички работници и специалисти, които ще вземат участие в изграждането на обекта са запознати с прилаганата политика и цели по качеството /изискванията на система по опазване на околната среда/.

Основна отговорност за опазване на околната среда при изграждането на обекта, ще се носи от техническия ръководител на обекта.

Следвайки своята политика за опазване на околната среда, фирмата се ангажира да ограничи всички работи в рамките на строителната площадка, вземайки всички мерки за ограничаване на персонала и оборудването в рамките на строителните площадки.

Ще се вземат всички мерки за защита на околната среда, както върху строителната площадка, така и извън нея, като се ограничават вредите и нарушенията от замърсяване, шум или други ефекти на дейността.

Гарантираме, че за времето на срока на договора, твърдите отпадъци на повърхността и отпадъчните води от строителната площадката, няма да надвишават стойностите предвидени от закона и ще предприеме незабавни действия за ограничаване на последиците от замърсявания върху здравето на хората и околната среда.

Задължаваме се за времето на изпълнение на обекта да спазваме разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България, относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения.

• Мерките по опазване на околната среда

Мерки по опазване на околната среда се изразява в следното:

- строителните отпадъци се депонират на депа, предназначени за поемане на строителни отпадъци;
- при евентуално генериране на опасни отпадъци се сключва договор с фирма, която има лиценз за тяхното третиране;
- транспортните схеми в населените места за извозване на отпадъците до депата при необходимост се съгласуват с общината;
- против утечки на масла се извършва постоянен контрол на техническото състояние на машините;
- при изпълнение на рехабилитационните работи и изграждане на нови съоръжения унищожаването на дървесна растителност и храсти да бъде във възможните минимални размери, след съгласуване с компетентния орган.

При приключване на обекта се задължаваме:

- да почистим строителната площадка и околното ѝ пространство;
- да отстраним за своя сметка всички временно складирани на обекта отпадъци, като се извозат и депонират;

• Мерки по отношение събирането на строителни материали

При попадане на строителни материали извън огражденията на обекта, поради например силен вятър и др., те ще бъдат своевременно прибирани.

Строителните материали ще бъдат складирани в закрити помещения, като при тази организация вероятността от `разпиляване` на строителни материали е минимална.

Всеки ден от склада ще се изписват строителни материали в количества, необходими само за текущия ден. В края на всеки работен ден ще се организира връщането в склада на неизползваните през деня строителни материали.

• План за управление на качеството за изпълнение на поръчката

План за управление на качеството е част от цялостната визия и политика на фирма „Строителство и саниране-инженеринг-консулт“ ЕООД.

С оглед на плана за управление на качеството, фирмата се ангажира за следните основни цели:

1. Предоставяне на качествени строителни услуги в съответствие на нормативната уредба;
2. Разширяване на списъка с доставчици и контрагенти;
3. Стремелство за работа, съобразена с опазване на околната среда;
4. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
5. Въвеждане на нови методи и начин на работа, съобразени със съвременните изисквания на пазара;
6. Използване на висококачествени материали и техника при извършване на строителните и довършителни работи;
7. Непрекъснато подобряване и усъвършенстване на процесите и работната среда.

Повишаване на полезността при използване на наличните материали, човешка и финансова база:

1. Намаляване на загубите при използване на материали, техника и ресурси.
2. Постоянна мотивация на работния персонал.

3. Поддържане на добри взаимоотношения със всички заинтересовани страни, участници в изпълнението на поръчката.

4. Стремех към увеличаване на превантивните действия за сметка на коригиращите такива.

„Строителство и саниране-инженеринг-консулт“ ЕООД декларира, че при цялостната дейност по качествено изпълнение на поръчката, се ангажира да удовлетворява изискванията на Възложителя, да се стреми към непрекъснато подобряване ефикасността на работата, да спазва цялата приложима нормативна база.

„Строителство и саниране-инженеринг-консулт“ ЕООД, поема ангажимент за осигуряване на непрекъснато подобрене и предотвратяване на замърсяването, нараняванията и заболяванията, подобряване на ЗБУТ и резултатността от ЗБУТ, като ще работи и в посока на непрекъснато усъвършенстване на целият работен процес.

Качеството на изпълнение на строително-монтажните работи зависи от използването на качествени материали. Следенето за качествено изпълнение на видовете СМР е от самото влагане на материали в обекта.

Системата за управление на качеството има ръководна роля по отношение на всички останали системи. Системата се документира в така наречения наръчник по качеството. Цел на управление на качеството е да се съобразяват изискванията на Възложителя през етапите на строително-монтажните дейности, без да се разхищават материалните, финансовите или персоналните ресурси на „Строителство и саниране-инженеринг-консулт“ ЕООД. Следователно управление на качеството може да се разглежда в следните аспекти:

- външно-организационен аспект: познаване и съобразяване с желанията на Възложителя;
- вътрешно-организационен аспект: това са решенията, които се вземат по отношение на качеството, сроковете и цените на продуктите да не водят до влошаване на качеството.

Планиране на качеството обхваща всички дейности за дефиниране както на целите и изискванията за качеството, така и на изискванията за приложение на елементите на системата по качеството. Планирането може да се раздели на следните групи:

- планиране на продукта (разработване на концепцията, класифициране на изискванията и на показателите за качество);
- планиране на технологичните процеси;
- подготвяне на планове по управление на качеството, провеждане на мероприятия за подобряване на качеството.

Качеството на продукта е резултат от грижливо планиране, безгрешно изпълнение и последователен контрол. Целта при планиране на качеството е през всички етапи от разработването до приложението на продукта да се предвидят възможно най-точно всички свързани с качеството проблеми, въпроси и разходи. Планирането на качеството може да се разглежда в следните аспекти:

- външен аспект : зависимост на стойността на продукцията от нейното качество;
- вътрешен аспект : планиране качеството на строително-монтажните работи.

➤ Мерки за контрол на качеството

Осигуряване приоритет на качеството в дейността на всички звена на „Строителство и саниране-инженеринг-консулт“ ЕООД и поставяне на качеството на извършваните строително-монтажни работи и пълното съответствие с нормативните изисквания е в основата на всички пазарни и функционални стратегии и планове на обединението. Стремим се към прилагане на най-новите материали и технологии в строителната практика. Освен това успешно прилага системата по качество ISO 9001:2008. Осигуряването на качествената работа на обекта ще се извършва съобразно процедурите на внедрения стандарт.

Подборът на необходимите материали и изделия е направен прецизно от ръководството, съобразявайки се с изискванията на възложителя съгласно изисквания за качество на предвидените работи и използваните материали.

В строителството ще се влагат строителни материали, машини и оборудване и продукти, отговарящи на изискванията на действащите стандарти и изискванията на Възложителя.

Изпълнителят се задължава да спазва всички законови и подзаконови изисквания на нормативните актове и стандарти, регламентиращи видовете дейности, предмет на настоящата поръчка и определящи необходимото ниво на качество.

Качеството на използваните строителни материали и качеството на изпълнението на СМР ще се доказва със Сертификати за произход и качество на материалите, издаден от производителите, Декларации за съответствието на материалите, съгласно „Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти“ и всички описани изисквания приложими за настоящата обществена поръчка за изграждане на обектите.

15.05.2015г.


Управител:.....

/Г.Николова/

Обект: Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СУР във връзка с реализирането на Националната програма за енергийна ефективност на многоетажните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес: гр. Благоевград, ж.к. „Злато“, №55“

Изпълнител: "Енергоинженство и саниране-инженеринг-консулти" ЕООД

Диаграма на работната ръка

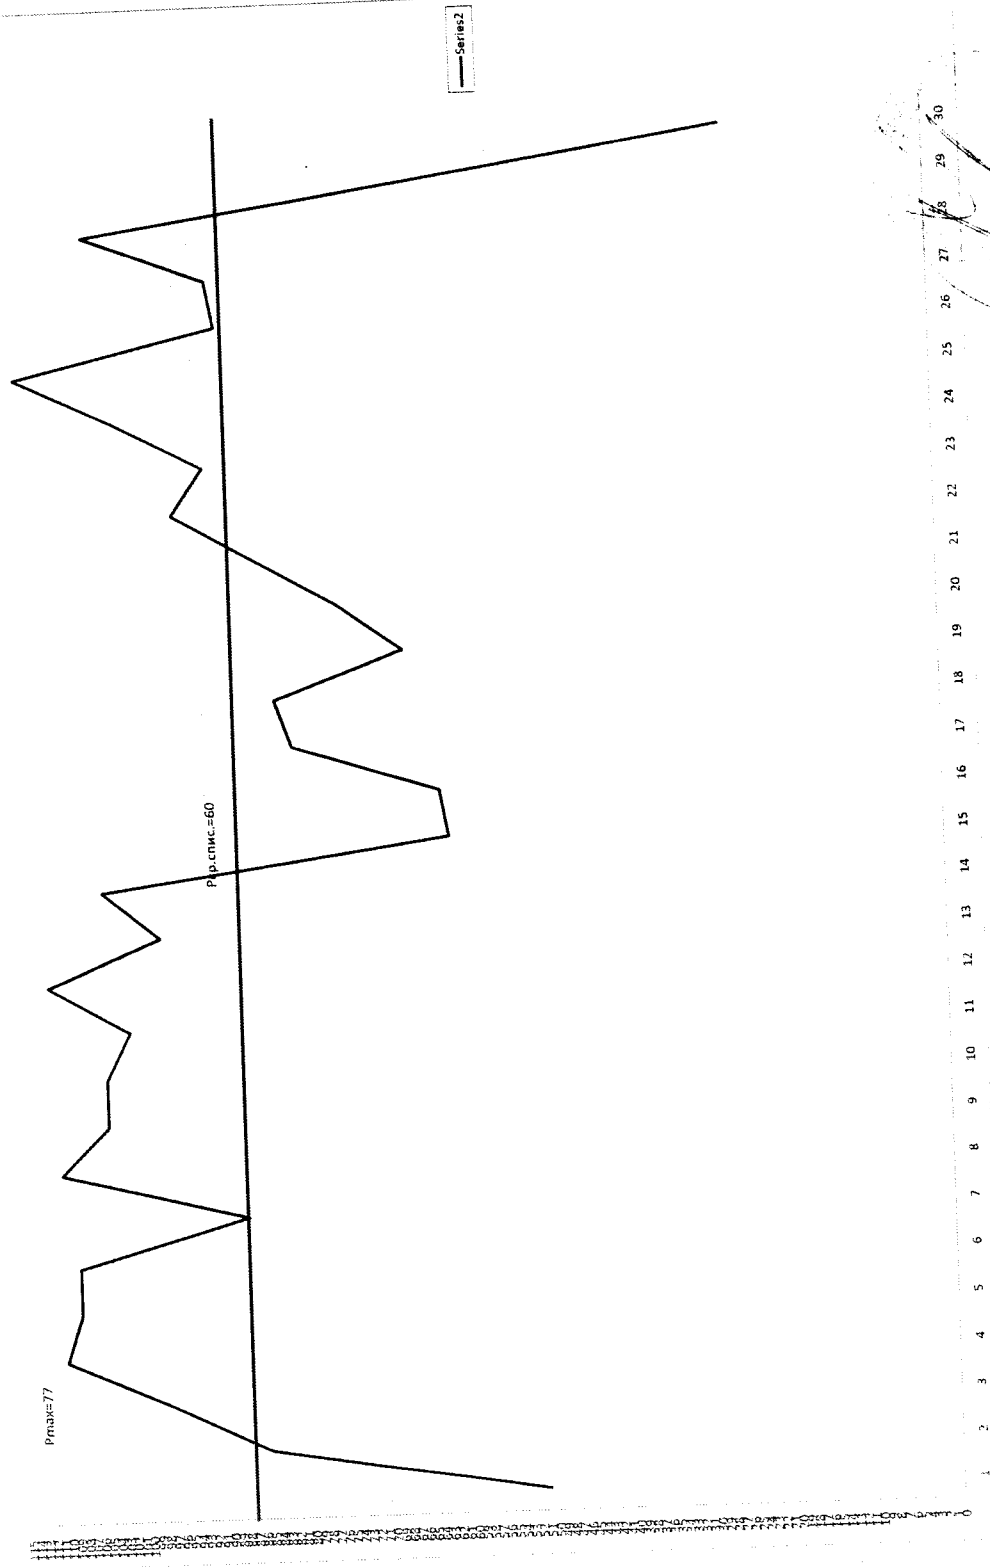

Управител: М. Димитров

М. Димитров



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ОБРАЗЕЦ №12

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции

Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Запад“ №55 ”

От: „Строителство и саниране-инженеринг-консулт“ ЕООД

(наименование на участника)

с адрес: гр. София ул. Суходолска 2, бл. № 31,
тел.: 02/950 09 80, факс: 02/950 09 80, e-mail: ssik_eood@abv.bg
регистриран по ф.д. № 4134 / 2005 г. по описа на Софийски градски съд.
ЕИК / Булстат: 131405777,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

I. Ние предлагаме да изпълним поръчката за обща цена в размер на 647 080,29 лв. (словом: шестотин четиридесет и седем хиляди и осемдесет лева и двадесет и девет стотинки) без ДДС или 776 496,35 лв. (словом: седемстотин седемдесет и шест хиляди четиристотин деведесет и шест лева и тридесет и пет стотинки) с ДДС, както следва:

За изготвяне на работен проект по всички части: 29 000,00 лв. (словом: двадесет и девет хиляди лева) без ДДС или 34 800,00 лв. (словом: тридесет и четири хиляди и осемстотин лева) с ДДС; (В предлаганата цена за изготвяне на работните проекти, Участникът следва да калкулира всички разходи включително и тези за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта)

За изпълнение на СМР 611 960,68 лв. (словом: шестотин и единадесет хиляди деветстотин и шейсет лева и шейсет и осем стотинки) без ДДС или 734 352,82 лв. (словом: седемстотин тридесет и четири хиляди триста педесет и два лева и осемдесет и две стотинки) с ДДС съгласно приложените КСС.

Упълномощена
лице
инженеринг-консулт ЕООД

и

и



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Както и 6 119,61 без ДДС или 7 343,53 с ДДС представляващи **непредвидени разходи*** по време на изпълнение на СМР. (Непредвидените разходи следва да са в размер на максимум 10% от стойността на СМР) **Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по програмата.*

II. Елементи на ценообразуване за видовете РСМР са както следва:

1. П1 – Средна часова ставка	3,50 лв./час
2. П2 - Допълнителни разходи върху труд	100 %
3. П3 – Допълнителни разходи върху механизация	7 %
4. П4 – Доставно -складови разходи	7 %
5. П5 – Печалба	10 %

Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите и нормативите за такъв вид РСМР, предвижданията и изискванията на Документацията за участие, предложените от нас условия за изпълнение на РСМР, проектодоговора, както и всички законови изисквания за осъществяване на строителство на обекти от вида и обема предмет на горепосочената обществена поръчка.

*посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на строителните работи в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.

Име и фамилия: Петкана Николова

Длъжност: Управител

Подпис и печат: _____

ВАЖНО!!!



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ВАЖНО!!!

Участникът изготвя работните проекти съгласно техническия паспорт и енергийното обследване. При изготвяне на ценовата оферта Участникът следва да предвиди в Количествено стойностните сметки всички задължителни мерки предписани в техническия паспорт и енергийното обследване, както и съпътстващите ги дейности.

**Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.*

Всяка страница от ценовото предложение трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

При оферирание на цена над прогнозната УЧАСТНИКЪТ ще бъде отстранен от участие в процедурата.

ЗАБЕЛЕЖКА:: Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик - ПЛИК №3 за всяка обособена позиция по отделно!

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции

Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Запад” №55 ”

Количествено-стойностна сметка

	Вид СМР	Ед.м.	К-во	Ед.цена	Стойност
	ТИ,ХИ И ДОГРАМА				
1	Доставка и монтаж на строително скеле, вкл.демонтаж	м2	4 908,12	5,25	25 779,90
2	Очукване на подкожушена мазилка по фасади	м2	1 100,00	1,93	2 117,50
3	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд	м2	3 932,60	1,63	6 393,62
4	Доставка и монтаж на топлоизолация EPS 5 см, $\lambda=0,035\text{W/mK}$, вкл.шпакловка, стъклотекстилна мрежа, дюбели	м2	3 592,60	36,02	129 405,45
5	Доставка и монтаж на топлоизолация EPS 2 см по страници на прозорци, вкл.шпакловка, стъклотекстилна мрежа, дюбели, ъглови профили	м	1 700,00	22,08	37 530,75
6	Доставка и полагане на силикатна мазилка по фасади	м2	3 612,60	17,15	61 939,76
7	Доставка и полагане на външна минерална мазилка по цокъл	м2	320,00	19,97	6 390,49
8	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд-бетонконтакт	м2	429,00	1,63	697,47
9	Очукване на компрометирана мазилка по таван	м2	150,00	2,89	433,13
10	Направа на нова мазилка по таван	м2	150,00	17,15	2 571,82
11	Доставка и монтаж на топлоизолация от автоклавни плочи, 8см, $\lambda=0,047\text{W/mK}$	м2	429,00	47,39	20 330,40
12	Доставка и полагане на силикатна мазилка	м2	429,00	17,15	7 355,41
13	Демонтаж на съществуващи технически съоръжения по покрив	бр.	1,00	554,40	554,40
14	Доставка и монтаж на топлоизолация от минерална вата	м2	453,20	44,13	20 000,82
15	Доставка и монтаж на пароизолационно фолио	м2	453,20	5,20	2 356,01
16	Демонтаж на съществуваща хидроизолация	м2	796,20	2,77	2 207,07
17	Възстановяване на компрометирана замазка	м2	120,00	13,24	1 588,54
18	Доставка и полагане на битумен грунд	м2	796,20	2,47	1 964,18
19	Доставка и монтаж на два пласта хидроизолационна мембрана (втория с посипка)	м2	796,20	20,93	16 664,47
20	Демонтаж ламаринена обшивка по покрив	м2	197,00	6,16	1 213,52
21	Доставка и монтаж на нова ламаринена обшивка по покрив	м2	197,00	19,74	3 888,36
22	Демонтаж щорцове от поцинкована ламарина	м	197,00	3,08	606,76
23	Направа и монтаж на нови щорцове от поцинкована ламарина	м	197,00	14,29	2 815,37
24	Направа на холкери	м	245,00	9,69	2 374,05
25	Монтаж на съществуващи технически съоръжения по покрив	бр.	1,00	554,40	554,40
26	Демонтаж на съществуваща дограма	м2	597,00	10,01	5 975,97
27	Доставка и монтаж на нова PVC дограма, $U<1,70\text{W/mK}$	м2	507,00	137,38	69 651,66
28	Доставка и монтаж на нова AL дограма, $U<2,720\text{W/mK}$	м2	90,00	169,16	15 224,40
29	Обръщане на вътрешни страници на прозорци	м	1 020,00	16,56	16 887,39
30	Боядисване с латекс по страници на прозорци	м	1 020,00	4,91	5 004,18

31	Доставка и монтаж на външна алуминиева подпрозоречна пола	м	680,00	26,17	17 794,92
32	Доставка и монтаж на вътрешна PVC подпрозоречна пола	м	340,00	22,64	7 696,92
33	Натоварване, превоз и разтоварване на строителни отпадъци	м3	120,00	21,82	2 618,88
	КОНСТРУКЦИИ				
1	Нова мазилка по тухлени парапети на балкони към етажните площадки по северозападната фасада	м2	30,00	10,30	309,00
	сутеренната стена				
1	Почистване на бетона и армировката, обезпрашаване и водонапиване на повредената зона	м2	10,00	7,70	77,00
2	Полагане на възстановителен разтвор, вкл. грунд	м2	10,00	29,18	291,83
	плочата над сутерена				
1	Почистване на бетона и армировката, обезпрашаване и водонапиване на повредената зона	м2	45,00	7,70	346,50
2	Полагане на възстановителен разтвор, вкл. грунд	м2	45,00	29,18	1 313,22
	ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ				
1	Частично зазидване на част от балконите	м2	120,00	39,83	4 779,34
2	Направа на изравнителна мазилка	м2	760,00	11,95	9 083,14
3	Направа на гипсова шпакловка по стени и тавани	м2	760,00	7,68	5 839,25
4	Боядисване с латекс по стени и тавани	м2	1 240,00	6,78	8 407,20
5	Боядисване с латекс по стени и тавани	м2	457,00	6,99	3 194,43
6	Боядисване с блажна боя по цокли	м	98,00	6,99	685,02
7	Боядисване с блажна боя по метални парапети	м	98,00	16,07	1 574,60
8	Възстановяване дървена ръкохватка по парапет	бр.	61,00	34,65	2 113,65
9	Демонтаж и монтаж на външни климатични тела	бр.	14,00	23,10	323,40
10	Демонтаж пожарни касети	бр.	14,00	301,41	4 219,75
11	Монтаж на нови пожарни касети (окомпл.)	бр.	14,00	301,41	4 219,75
12	Демонтаж на поцинковани тръби 2"	м	350,00	2,70	945,00
13	Монтаж на вертикалните водопроводни клонове от полипропиленови тръби 1 1/2"	м	350,00	16,87	5 904,75
	Изоляция за тръби	м	350,00	4,79	1 675,98
	ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ				
1	Разкъртване на стена до 20см широчина	м	750,00	3,85	2 887,50
2	Демонтаж на проводник	м	1 200,00	1,54	1 848,00
3	Демонтаж на осветителни тела в стълбищна клетка	бр.	70,00	3,08	215,60
4	Мълниезащитна инсталация	бр.	1,00	3 638,74	3 638,74
5	Изкопаване на улей за полагане на гофрирани тръби	м	1 280,00	7,26	9 292,80
6	Полагане на гофрирани тръби Ф23	м	470,00	1,92	900,82
7	Полагане на гофрирани тръби Ф29	м	810,00	2,18	1 762,22
8	Полагане ел.кабели СВТ 3x10мм2	м	470,00	11,46	5 387,92
9	Полагане ел.кабели СВТ 5x16мм3	м	810,00	26,50	21 466,86
10	Направа на лампен излаз	бр.	70,00	9,74	681,80
11	Ел.табла	бр.	14,00	541,20	7 576,80
12	Монтаж на нови осветителни тела енергоспестяващи с фотоклетка	бр.	70,00	55,06	3 854,20
13	ГРТ	бр.	1,00	2 384,80	2 384,80
14	Инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части	бр.	1,00	391,60	391,60
	Общо сума без ДДС:				611 960,68
	ДДС:				122 392,14
	Общо сума с ДДС:				734 352,81

Анализ на единичните цени

	име	мярка	к-во	цена	коэф	формула
N.1	Доставка и монтаж на строително скеле, вкл.демонтаж	м2	4 908,12			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н,	цена	коэф	
	скеле фасадно	м2	1,00	2,50	1,00	2,50
	ТРУД :					
	работник - I ст.	ч.ч.	0,25	3,50	1,20	1,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		7,00			0,18
	доп.р-ди труд (%)		100,00			1,05
	всичко преки					3,55
	общо допълнителни р-ди					1,23
	начисления (%)		10,00			0,48
	Обща цена :					5,25
N.2	Очукване на подкожусена мазилка по фасади	м2	1 100,00			
	ТРУД :					
			р.н,	цена	коэф	
	работник - I ст.	ч.ч.	0,25	3,50	1,00	0,88
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100,00			0,88
	всичко преки					0,88
	общо допълнителни р-ди					0,88
	начисления (%)		10,00			0,18
	Обща цена :					1,93
N.3	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд	м2	3 932,60			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н,	цена	коэф	
	ГРУНД БЕТОНКОНТАКТ	л.	0,20	2,00	1,00	0,40
	ТРУД :					
	работник - I ст.	ч.ч.	0,15	3,50	1,00	0,53
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		7,00			0,03
	доп.р-ди труд (%)		100,00			0,53
	всичко преки					0,93
	общо допълнителни р-ди					0,55
	начисления (%)		10,00			0,15
	Обща цена :					1,63
N.4	Доставка и монтаж на топлоизолация EPS 5 см, ??0,035W/mK, вкл.шпакловка, стъклотекстилна мрежа, дюбели	м2	3 592,60			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н,	цена	коэф	
	EPS теразид	м3	0,06	63,00	1,00	3,47
	дюбели теразид	бр.	6,00	0,12	1,00	0,72
	лепило за EPS Теразид	кг	5,00	0,21	1,00	1,05
	стъклофибърна мрежа Теразид 0,145кг/м2	м2	1,15	0,90	1,00	1,04
	Шпакловка за ТИ Теразид	кг	5,00	0,24	1,00	1,20
	ръбохранители	м	0,30	0,80	1,00	0,24

	водооткапващ профил	м	0,30	1,72	1,00	0,52
						8,23
	ТРУД :					
	работник - I ст.	ч.ч.	1,20	3,50	2,85	11,97
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		7,00			0,58
	доп.р-ди труд (%)		100,00			11,97
	всичко преки					20,20
	общо допълнителни р-ди					12,55
	начисления (%)		10,00			3,27
	Обща цена :					36,02
N.5	Доставка и монтаж на топлоизолация EPS 2 см по страници на прозорци, вкл.шпакловка, стъклотекстилна мрежа, дюбели, ъглови профили	м	1 700,00			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р,н,	цена	коэф	
	EPS теразид	м3	0,01	63,00	1,00	0,44
	дюбели теразид	бр.	4,00	0,12	1,00	0,48
	лепило за EPS Теразид	кг	3,00	0,21	1,00	0,63
	стъклофибърна мрежа Теразид 0,145кг/м2	м2	0,25	0,90	1,00	0,23
	Шпакловка за ТИ Теразид	кг	2,00	0,24	1,00	0,48
	ръбохранители	м	1,00	0,80	1,00	0,80
						3,06
	ТРУД :					
	работник - I ст.	ч.ч.	0,80	3,50	3,00	8,40
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		7,00			0,21
	доп.р-ди труд (%)		100,00			8,40
	всичко преки					11,46
	общо допълнителни р-ди					8,61
	начисления (%)		10,00			2,01
	Обща цена :					22,08
N.6	Доставка и полагане на силикатна мазилка по фасади	м2	3 612,60			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р,н,	цена	коэф	
	грунд теразид	кг	0,20	1,70	1,00	0,34
	мазилка минерална-бял	кг	3,00	2,30	1,00	6,90
						7,24
	ТРУД :					
	работник - I ст.	ч.ч.	0,70	3,50	1,60	3,92
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		7,00			0,51
	доп.р-ди труд (%)		100,00			3,92
	всичко преки					11,16
	общо допълнителни р-ди					4,43
	начисления (%)		10,00			1,56
	Обща цена :					17,15
N.7	Доставка и полагане на външна минерална мазилка по цокъл	м2	320,00			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р,н,	цена	коэф	
	МАЗИЛКА ДЕКОРАТИВНА	кг	3,00	3,10	1,00	9,30

	грунд теразид	кг	0,20	1,70	1,00	0,34
						9,64
	ТРУД :					
	работник - I ст.	ч.ч.	0,70	3,50	1,60	3,92
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		7,00			0,67
	доп.р-ди труд (%)		100,00			3,92
	всичко преки					13,56
	общо допълнителни р-ди					4,59
	начисления (%)		10,00			1,82
	Обща цена :					19,97
N.8	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд-бетонконтакт	м2	429,00			
	МАТЕРИАЛИ:					
		р.н.	цена	коэф		
	ГРУНД БЕТОНКОНТАКТ	л.	0,20	2,00	1,00	0,40
	ТРУД :					
	работник - I ст.	ч.ч.	0,15	3,50	1,00	0,53
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		7,00			0,03
	доп.р-ди труд (%)		100,00			0,53
	всичко преки					0,93
	общо допълнителни р-ди					0,55
	начисления (%)		10,00			0,15
	Обща цена :					1,63
N.9	Очукване на компрометирана мазилка по таван	м2	150,00			
	ТРУД :					
		р.н.	цена	коэф		
	работник - I ст.	ч.ч.	0,25	3,50	1,50	1,31
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100,00			1,31
	всичко преки					1,31
	общо допълнителни р-ди					1,31
	начисления (%)		10,00			0,26
	Обща цена :					2,89
N.10	Направа на нова мазилка по таван	м2	150,00			
	МАТЕРИАЛИ:					
		р.н.	цена	коэф		
	мазилка минерална-бял	кг	3,00	2,30	1,00	6,90
	грунд теразид	кг	0,20	1,70	1,00	0,34
						7,24
	ТРУД :					
	работник - I ст.	ч.ч.	0,70	3,50	1,60	3,92
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		7,00			0,51
	доп.р-ди труд (%)		100,00			3,92
	всичко преки					11,16
	общо допълнителни р-ди					4,43
	начисления (%)		10,00			1,56
	Обща цена :					17,15
N.11	Доставка и монтаж на топлоизолация от автоклавни плочи, 8см, $\lambda=0,047\text{W/mK}$	м2	429,00			

	МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	коэф	
		м2	1,00	18,00	1,00	18,00
	плочи мултипор	кг	4,00	1,15	1,00	4,60
	лепило за мултипор					22,60
	ТРУД :	ч.ч.	0,90	3,50	3,00	9,45
	работник - I ст.					
	ДОП.РАЗХОДИ:		7,00			1,58
	доп.р.материали (%)		100,00			9,45
	доп.р-ди труд (%)					32,05
	всичко преки					11,03
	общо допълнителни р-ди		10,00			4,31
	начисления (%)					47,39
	Обща цена :					
N.12	Доставка и полагане на силикатна мазилка	м2	429,00			
	МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	коэф	
		кг	3,00	2,30	1,00	6,90
	мазилка минерална-бял	кг	0,20	1,70	1,00	0,34
	грунд теразид					7,24
	ТРУД :	ч.ч.	0,70	3,50	1,60	3,92
	работник - I ст.					
	ДОП.РАЗХОДИ:		7,00			0,51
	доп.р.материали (%)		100,00			3,92
	доп.р-ди труд (%)					11,16
	всичко преки					4,43
	общо допълнителни р-ди		10,00			1,56
	начисления (%)					17,15
	Обща цена :					
N.13	Демонтаж на съществуващи технически съоръжения по покрив	бр.	1,00			
	ТРУД :		р.н.	цена	коэф	
		ч.ч.	24,00	3,50	3,00	252,00
	работник - I ст.					
	ДОП.РАЗХОДИ:		100,00			252,00
	доп.р-ди труд (%)					252,00
	всичко преки					252,00
	общо допълнителни р-ди		10,00			50,40
	начисления (%)					554,40
	Обща цена :					
N.14	Доставка и монтаж на топлоизолация от минерална вата	м2	453,20			
	МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	коэф	
		бр.	6,00	0,12	1,00	0,72
	дюбели теразид	м2	1,00	25,00	1,00	25,00
	каменна вата 12см					25,72
	ТРУД :	ч.ч.	0,45	3,50	4,00	6,30
	работник - I ст.					
	ДОП.РАЗХОДИ:		7,00			1,80
	доп.р.материали (%)		100,00			6,30
	доп.р-ди труд (%)					32,02
	всичко преки					8,10
	общо допълнителни р-ди					

			10,00			4,01
	начисления (%)					44,13
	Обща цена :					
N.15	Доставка и монтаж на пароиоляционнo фoлио	м2	453,20			
	МАТЕРИАЛИ:					
		р.н.	цена	коэф		
	ПАРОИЗОЛЯЦИОННО ФОЛИО	м2	1,00	1,80	1,00	1,80
	ТРУД :	ч.ч.	0,20	3,50	2,00	1,40
	работник - I ст.					
	ДОП.РАЗХОДИ:		7,00			0,13
	доп.р.материали (%)		100,00			1,40
	доп.р-ди труд (%)					3,20
	всичко преки					1,53
	общо допълнителни р-ди		10,00			0,47
	начисления (%)					5,20
	Обща цена :					
N.16	Демонтаж на съществуваща хидроизолация	м2	796,20			
	ТРУД :					
		р.н.	цена	коэф		
	работник - I ст.	ч.ч.	0,18	3,50	2,00	1,26
	ДОП.РАЗХОДИ:		100,00			1,26
	доп.р-ди труд (%)					1,26
	всичко преки					1,26
	общо допълнителни р-ди		10,00			0,25
	начисления (%)					2,77
	Обща цена :					
N.17	Възстановяване на компрометирана замазка	м2	120,00			
	МАТЕРИАЛИ:					
		р.н.	цена	коэф		
	замазка циментова	м3	0,04	98,00	1,00	3,92
	ТРУД :	ч.ч.	0,70	3,50	1,60	3,92
	работник - I ст.					
	ДОП.РАЗХОДИ:		7,00			0,27
	доп.р.материали (%)		100,00			3,92
	доп.р-ди труд (%)					7,84
	всичко преки					4,19
	общо допълнителни р-ди		10,00			1,20
	начисления (%)					13,24
	Обща цена :					
N.18	Доставка и полагане на битумен грунд	м2	796,20			
	МАТЕРИАЛИ:					
		р.н.	цена	коэф		
	ГРУНД БИТУМЕН	л.	0,30	2,08	1,00	0,62
	ТРУД :	ч.ч.	0,15	3,50	1,50	0,79
	работник - I ст.					
	ДОП.РАЗХОДИ:		7,00			0,04
	доп.р.материали (%)		100,00			0,79
	доп.р-ди труд (%)					1,41
	всичко преки					0,83
	общо допълнителни р-ди		10,00			0,22
	начисления (%)					2,47
	Обща цена :					

N.19	Доставка и монтаж на два пласта хидроизолационна мембрана (втория с посипка)	м2	796,20			
	МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	коэф	
	ХИДРОИЗОЛАЦИОННА МЕМБРАНА 3,5КГ БЕЗ ПОСИПКА	м2	1,15	5,20	1,00	5,98
	ХИДРОИЗОЛАЦИОННА МЕМБРАНА 4КГ С ПОСИПКА	м2	1,15	6,00	1,00	6,90
						12,88
	ТРУД :	ч.ч.	0,75	3,50	1,00	2,63
	работник - I ст.					
	ДОП.РАЗХОДИ:		7,00			0,90
	доп.р.материали (%)		100,00			2,63
	доп.р-ди труд (%)					15,51
	всичко преки					3,53
	общо допълнителни р-ди		10,00			1,90
	начисления (%)					20,93
	Обща цена :					
N.20	Демонтаж ламаринена обшивка по покрив	м2	197,00			
	ТРУД :		р.н.	цена	коэф	
	работник - I ст.	ч.ч.	0,40	3,50	2,00	2,80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100,00			2,80
	всичко преки					2,80
	общо допълнителни р-ди		10,00			0,56
	начисления (%)					6,16
	Обща цена :					
N.21	Доставка и монтаж на нова ламаринена обшивка по покрив	м2	197,00			
	МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	коэф	
	ламарина поцинкована 0,5мм	м2	1,03	11,20	1,00	11,54
	ТРУД :	ч.ч.	0,80	3,50	1,00	2,80
	работник - I ст.					
	ДОП.РАЗХОДИ:		7,00			0,81
	доп.р.материали (%)		100,00			2,80
	доп.р-ди труд (%)					14,34
	всичко преки					3,61
	общо допълнителни р-ди		10,00			1,79
	начисления (%)					19,74
	Обща цена :					
N.22	Демонтаж щорцове от поцинкована ламарина	м	197,00			
	ТРУД :		р.н.	цена	коэф	
	работник - I ст.	ч.ч.	0,20	3,50	2,00	1,40
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100,00			1,40
	всичко преки					1,40
	общо допълнителни р-ди		10,00			0,28
	начисления (%)					3,08
	Обща цена :					

N.23	Направа и монтаж на нови шорцове от поцинкована ламарина	м	197,00			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р,н,	цена	коэф	
	ламарина поцинкована 0,5мм	м2	0,50	11,20	1,00	5,60
	ТРУД :					
	работник - I ст.	ч.ч.	0,50	3,50	2,00	3,50
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		7,00			0,39
	доп.р-ди труд (%)		100,00			3,50
	всичко преки					9,10
	общо допълнителни р-ди					3,89
	начисления (%)		10,00			1,30
	Обща цена :					14,29
N.24	Направа на холкери	м	245,00			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р,н,	цена	коэф	
	ХИДРОИЗОЛАЦИОННА МЕМБРАНА 4КГ С ПОСИПКА	м2	0,50	6,00	1,00	3,00
	ТРУД :					
	работник - I ст.	ч.ч.	0,40	3,50	2,00	2,80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		7,00			0,21
	доп.р-ди труд (%)		100,00			2,80
	всичко преки					5,80
	общо допълнителни р-ди					3,01
	начисления (%)		10,00			0,88
	Обща цена :					9,69
N.25	Монтаж на съществуващи технически съоръжения по покрив	бр.	1,00			
	ТРУД :					
			р,н,	цена	коэф	
	работник - I ст.	ч.ч.	24,00	3,50	3,00	252,00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100,00			252,00
	всичко преки					252,00
	общо допълнителни р-ди					252,00
	начисления (%)		10,00			50,40
	Обща цена :					554,40
N.26	Демонтаж на съществуваща дограма	м2	597,00			
	ТРУД :					
			р,н,	цена	коэф	
	работник - I ст.	ч.ч.	1,30	3,50	1,00	4,55
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100,00			4,55
	всичко преки					4,55
	общо допълнителни р-ди					4,55
	начисления (%)		10,00			0,91
	Обща цена :					10,01
N.27	Доставка и монтаж на нова PVC дограма, U?1.70W/mK	м2	507,00			

	МАТЕРИАЛИ:		р,н,	цена	коэф	
		м2	1,00	102,00	1,00	102,00
	РВС ДОГРАМА					
	ТРУД :	ч.ч.	1,50	3,50	1,50	7,88
	работник - I ст.					
	ДОП.РАЗХОДИ:		7,00			7,14
	доп.р.материали (%)		100,00			7,88
	доп.р-ди труд (%)					109,88
	всичко преки					15,02
	общо допълнителни р-ди		10,00			12,49
	начисления (%)					137,38
	Обща цена :					
N.28	Доставка и монтаж на нова AL дограма, U?2,720W/mK	м2	90,00			
	МАТЕРИАЛИ:		р,н,	цена	коэф	
		м2	1,00	129,00	1,00	129,00
	AL ДОГРАМА					
	ТРУД :	ч.ч.	1,50	3,50	1,50	7,88
	работник - I ст.					
	ДОП.РАЗХОДИ:		7,00			9,03
	доп.р.материали (%)		100,00			7,88
	доп.р-ди труд (%)					136,88
	всичко преки					16,91
	общо допълнителни р-ди		10,00			15,38
	начисления (%)					169,16
	Обща цена :					
N.29	Обръщане на вътрешни страници на прозорци	м	1 020,00			
	МАТЕРИАЛИ:		р,н,	цена	коэф	
		м2	0,50	2,30	1,00	1,15
	GKB 12,5	кг	1,20	0,35	1,00	0,42
	ЛЕПИЛНА СМЕС ЗА ГИПСОКАРТОН	м	1,00	0,90	1,00	0,90
	РЪБОХРАНИТЕЛ	кг	0,50	0,95	1,00	0,48
	гипсова шпакловка					2,95
	ТРУД :	ч.ч.	0,85	3,50	2,00	5,95
	работник - I ст.					
	ДОП.РАЗХОДИ:		7,00			0,21
	доп.р.материали (%)		100,00			5,95
	доп.р-ди труд (%)					8,90
	всичко преки					6,16
	общо допълнителни р-ди		10,00			1,51
	начисления (%)					16,56
	Обща цена :					
N.30	Боядисване с латекс по страници на прозорци	м	1 020,00			
	МАТЕРИАЛИ:		р,н,	цена	коэф	
		л.	0,35	4,90	1,00	1,72
	латекс					
	ТРУД :	ч.ч.	0,25	3,50	1,50	1,31
	работник - I ст.					
	ДОП.РАЗХОДИ:		7,00			0,12
	доп.р.материали (%)		100,00			1,31
	доп.р-ди труд (%)					3,03
	всичко преки					1,43
	общо допълнителни р-ди					

	начисления (%)		10,00			0,45
	Обща цена :					4,91
N.31	Доставка и монтаж на външна алуминиева подпрозоречна пола	м	680,00			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коэф	
	подпр.перваз външен 17см	м	1,00	17,00	1,00	17,00
	ТРУД :					
	работник - I ст.	ч.ч.	0,40	3,50	2,00	2,80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		7,00			1,19
	доп.р-ди труд (%)		100,00			2,80
	всичко преки					19,80
	общо допълнителни р-ди		10,00			3,99
	начисления (%)					2,38
	Обща цена :					26,17
N.32	Доставка и монтаж на вътрешна PVC подпрозоречна пола	м	340,00			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коэф	
	подпр.перваз вътрешен 20см	м	1,00	14,00	1,00	14,00
	ТРУД :					
	работник - I ст.	ч.ч.	0,40	3,50	2,00	2,80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		7,00			0,98
	доп.р-ди труд (%)		100,00			2,80
	всичко преки					16,80
	общо допълнителни р-ди		10,00			3,78
	начисления (%)					2,06
	Обща цена :					22,64
N.33	Натоварване, превоз и разтоварване на строителни отпадъци	м3	120,00			
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			р.н.	цена	коэф	
	камион	мсм	0,15	80,00	1,00	12,00
	ТРУД :					
	работник - I ст.	ч.ч.	1,00	3,50	1,00	3,50
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		7,00			0,84
	доп.р-ди труд (%)		100,00			3,50
	всичко преки					15,50
	общо допълнителни р-ди		10,00			4,34
	начисления (%)					1,98
	Обща цена :					21,82
N.34	Нова мазилка по тухлени парапети на балкони към етажните площадки по северозападната фасада	м2	30,00			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коэф	
	вароциментова мазилка	кг	3,00	0,42	1,00	1,26
	грунд теразид	кг	0,20	1,70	1,00	0,34
						1,60

	ТРУД :					
	работник - I ст.	ч.ч.	0,75	3,40	1,50	3,83
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		7,00			0,11
	доп.р-ди труд (%)		100,00			3,83
	всичко преки					5,43
	общо допълнителни р-ди		10,00			3,94
	начисления (%)					0,94
	Обща цена :					10,30
N.35	Почистване на бетона и армировката, обезпрашаване и водонапиване на повредената зона	м2	10,00			
	ТРУД :					
	работник - I ст.	ч.ч.	1,00	3,50	1,00	3,50
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100,00			3,50
	всичко преки					3,50
	общо допълнителни р-ди		10,00			3,50
	начисления (%)					0,70
	Обща цена :					7,70
N.36	Полагане на възстановителен разтвор, вкл. грунд	м2	10,00			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р,н,	цена	коэф	
	полим.модифиц.циментова мазилка	кг	1,50	5,94	1,00	8,91
	грунд полимерен	л.	0,20	14,00	1,00	2,80
						11,71
	ТРУД :					
	работник - I ст.	ч.ч.	2,00	3,50	1,00	7,00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		7,00			0,82
	доп.р-ди труд (%)		100,00			7,00
	всичко преки					18,71
	общо допълнителни р-ди		10,00			7,82
	начисления (%)					2,65
	Обща цена :					29,18
N.37	Почистване на бетона и армировката, обезпрашаване и водонапиване на повредената зона	м2	45,00			
	ТРУД :					
	работник - I ст.	ч.ч.	1,00	3,50	1,00	3,50
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100,00			3,50
	всичко преки					3,50
	общо допълнителни р-ди		10,00			3,50
	начисления (%)					0,70
	Обща цена :					7,70
N.38	Полагане на възстановителен разтвор, вкл. грунд	м2	45,00			
	МАТЕРИАЛИ:					

			р.н.	цена	коэф	
	полим.модифиц.циментова мазилка	кг	1,50	5,94	1,00	8,91
	грунд полимерен	л.	0,20	14,00	1,00	2,80
						11,71
	ТРУД :					
	работник - I ст.	ч.ч.	2,00	3,50	1,00	7,00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		7,00			0,82
	доп.р-ди труд (%)		100,00			7,00
	всичко преки					18,71
	общо допълнителни р-ди					7,82
	начисления (%)		10,00			2,65
	Обща цена :					29,18
N.39	Частично зазидване на част от балконите	м2	120,00			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коэф	
	итонг 125x250x600	бр.	6,25	2,35	1,00	14,69
	лепилен разтвор	кг	15,00	0,23	1,00	3,45
						18,14
	ТРУД :					
	работник - I ст.	ч.ч.	1,20	3,50	2,00	8,40
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		7,00			1,27
	доп.р-ди труд (%)		100,00			8,40
	всичко преки					26,54
	общо допълнителни р-ди					9,67
	начисления (%)		10,00			3,62
	Обща цена :					39,83
N.40	Направа на изравнителна мазилка	м2	760,00			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коэф	
	МАЗИЛКА ВАРО-ЦИМЕНТОВА	кг	5,00	0,50	1,00	2,50
	ТРУД :					
	работник - I ст.	ч.ч.	0,78	3,50	1,50	4,10
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		7,00			0,18
	доп.р-ди труд (%)		100,00			4,10
	всичко преки					6,60
	общо допълнителни р-ди					4,27
	начисления (%)		10,00			1,09
	Обща цена :					11,95
N.41	Направа на гипсова шпакловка по стени и тавани	м2	760,00			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коэф	
	гипсова шпакловка	кг	1,50	0,95	1,00	1,43
	ТРУД :					
	работник - I ст.	ч.ч.	0,52	3,50	1,50	2,73
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		7,00			0,10
	доп.р-ди труд (%)		100,00			2,73
	всичко преки					4,16
	общо допълнителни р-ди					2,83
	начисления (%)		10,00			0,70

	Обща цена :					7,68
N.42	Боядисване с латекс по стени и тавани	м2	1 240,00			
	МАТЕРИАЛИ:		р.н,	цена	коэф	
	латекс	л.	0,35	4,50	1,00	1,58
	ТРУД :	ч.ч.	0,40	3,50	1,60	2,24
	работник - I ст.					
	ДОП.РАЗХОДИ:		7,00			0,11
	доп.р.материали (%)		100,00			2,24
	доп.р-ди труд (%)					3,82
	всичко преки					2,35
	общо допълнителни р-ди		10,00			0,62
	начисления (%)					6,78
	Обща цена :					
N.43	Боядисване с блажна боя по цокли.	м2	457,00			
	МАТЕРИАЛИ:		р.н,	цена	коэф	
	БЛАЖНА БОЯ	кг	0,50	5,00	1,00	2,50
	ТРУД :	ч.ч.	0,35	3,50	1,50	1,84
	работник - I ст.					
	ДОП.РАЗХОДИ:		7,00			0,18
	доп.р.материали (%)		100,00			1,84
	доп.р-ди труд (%)					4,34
	всичко преки					2,01
	общо допълнителни р-ди		10,00			0,64
	начисления (%)					6,99
	Обща цена :					
N.44	Боядисване с блажна боя по метални парапети	м	98,00			
	МАТЕРИАЛИ:		р.н,	цена	коэф	
	БЛАЖНА БОЯ	кг	0,50	5,00	1,00	2,50
	ТРУД :	ч.ч.	0,35	3,50	1,50	1,84
	работник - I ст.					
	ДОП.РАЗХОДИ:		7,00			0,18
	доп.р.материали (%)		100,00			1,84
	доп.р-ди труд (%)					4,34
	всичко преки					2,01
	общо допълнителни р-ди		10,00			0,64
	начисления (%)					6,99
	Обща цена :					
N.45	Възстановяване дървена ръкохватка по парапет	м	98,00			
	МАТЕРИАЛИ:		р.н,	цена	коэф	
	дървен материал	м3	0,01	540,00	1,00	4,32
	лак за дърво	л.	0,10	8,40	1,00	0,84
	болтове	бр.	1,00	0,15	1,00	0,15
						5,31
	ТРУД :	ч.ч.	0,85	3,50	1,50	4,46
	работник - I ст.					
	ДОП.РАЗХОДИ:		7,00			0,37
	доп.р.материали (%)		100,00			4,46
	доп.р-ди труд (%)					

	всичко преки					9,77
	общо допълнителни р-ди					4,83
	начисления (%)		10,00			1,46
	Обща цена :					16,07
N.46	Демонтаж и монтаж на външни климатични тела	бр.	61,00			
	ТРУД :					
			р,н,	цена	коэф	
	работник - I ст.	ч.ч.	3,00	3,50	1,50	15,75
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100,00			15,75
	всичко преки					15,75
	общо допълнителни р-ди					15,75
	начисления (%)		10,00			3,15
	Обща цена :					34,65
N.47	Демонтаж пожарни касети	бр.	14,00			
	ТРУД :					
			р,н,	цена	коэф	
	работник - I ст.	ч.ч.	3,00	3,50	1,00	10,50
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100,00			10,50
	всичко преки					10,50
	общо допълнителни р-ди					10,50
	начисления (%)		10,00			2,10
	Обща цена :					23,10
N.48	Монтаж на нови пожарни касети (окомпл.)	бр.	14,00			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р,н,	цена	коэф	
	пожарна касета	бр.	1,00	110,00	1,00	110,00
	струйник	бр.	1,00	24,00	1,00	24,00
	пожарен шланг	бр.	1,00	61,00	1,00	61,00
	пожарен кран	бр.	1,00	48,00	1,00	48,00
						243,00
	ТРУД :					
	работник - I ст.	ч.ч.	2,00	3,50	1,00	7,00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		7,00			17,01
	доп.р-ди труд (%)		100,00			7,00
	всичко преки					250,00
	общо допълнителни р-ди					24,01
	начисления (%)		10,00			27,40
	Обща цена :					301,41
N.49	Демонтаж на поцинковани тръби 2"	м	350,00			
	ТРУД :					
			р,н,	цена	коэф	
	работник - I ст.	ч.ч.	0,35	3,50	1,00	1,23
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100,00			1,23
	всичко преки					1,23
	общо допълнителни р-ди					1,23
	начисления (%)		10,00			0,25
	Обща цена :					2,70

N.50	Монтаж на вертикалните водопроводни клонове от полипропиленови тръби 1 1/2"	м	350,00			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коэф	
	ППР тръби 1 1/2"	м	1,00	7,00	1,00	7,00
	фотинги ППР тръба 1 1/2"	бр.	1,00	2,10	1,00	2,10
						9,10
	ТРУД :					
	работник - I ст.	ч.ч.	0,80	3,50	1,00	2,80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		7,00			0,64
	доп.р-ди труд (%)		100,00			2,80
	всичко преки					11,90
	общо допълнителни р-ди					3,44
	начисления (%)		10,00			1,53
	Обща цена :					16,87
N.51	Изолация за тръби	м	350,00			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коэф	
	Изолация тръбна Ф54	м	1,00	2,76	1,00	2,76
	ТРУД :					
	работник - I ст.	ч.ч.	0,20	3,50	1,00	0,70
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		7,00			0,19
	доп.р-ди труд (%)		100,00			0,70
	всичко преки					3,46
	общо допълнителни р-ди					0,89
	начисления (%)		10,00			0,44
	Обща цена :					4,79
N.52	Разкъртване на стена до 20см широчина	м	750,00			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	
	работник - I ст.	ч.ч.	0,50	3,50	1,00	1,75
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100,00			1,75
	всичко преки					1,75
	общо допълнителни р-ди					1,75
	начисления (%)		10,00			0,35
	Обща цена :					3,85
N.53	Демонтаж на проводник	м	1 200,00			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	
	работник - I ст.	ч.ч.	0,20	3,50	1,00	0,70
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100,00			0,70
	всичко преки					0,70
	общо допълнителни р-ди					0,70
	начисления (%)		10,00			0,14
	Обща цена :					1,54
N.54	Демонтаж на осветителни тела в стълбишна клетка	бр.	70,00			

	ТРУД :		р.н,	цена	коэф	
		ч.ч.	0,40	3,50	1,00	1,40
	работник - I ст.					
	ДОП.РАЗХОДИ:		100,00			1,40
	доп.р-ди труд (%)					1,40
	всичко преки					1,40
	общо допълнителни р-ди		10,00			0,28
	начисления (%)					3,08
	Обща цена :					
N.55	Мълниезащитна инсталация	бр.	1,00			
	МАТЕРИАЛИ:		р.н,	цена	коэф	
	мълниеприеман прът 4м	бр.	2,00	1 108,00	1,00	2 216,00
	заземителни колове	бр.	4,00	16,00	1,00	64,00
	съединител прав	бр.	4,00	5,38	1,00	21,52
	алуминиево въже	м	108,00	2,00	1,00	216,00
	шина 4x40	м	20,00	13,00	1,00	260,00
						2 777,52
	ТРУД :					
	работник - I ст.	ч.ч.	48,00	3,50	1,00	168,00
	ДОП.РАЗХОДИ:		7,00			194,43
	доп.р.материали (%)		100,00			168,00
	доп.р-ди труд (%)					2 945,52
	всичко преки					362,43
	общо допълнителни р-ди		10,00			330,79
	начисления (%)					3 638,74
	Обща цена :					
N.56	Изкопаване на улей за полагане на гофрирани тръби и възстановяване на улея	м	1 280,00			
	МАТЕРИАЛИ:		р.н,	цена	коэф	
	вароциментова мазилка	кг	3,00	0,42	1,00	1,26
	ТРУД :					
	работник - I ст.	ч.ч.	0,50	3,50	1,50	2,63
	ДОП.РАЗХОДИ:		7,00			0,09
	доп.р.материали (%)		100,00			2,63
	доп.р-ди труд (%)					3,89
	всичко преки					2,71
	общо допълнителни р-ди		10,00			0,66
	начисления (%)					7,26
	Обща цена :					
N.57	Полагане на гофрирани тръби Ф23	м	470,00			
	МАТЕРИАЛИ:		р.н,	цена	коэф	
	тръба гофрирана Ф23	м	1,00	0,32	1,00	0,32
	ТРУД :					
	работник - I ст.	ч.ч.	0,20	3,50	1,00	0,70
	ДОП.РАЗХОДИ:		7,00			0,02
	доп.р.материали (%)		100,00			0,70
	доп.р-ди труд (%)					1,02
	всичко преки					0,72
	общо допълнителни р-ди		10,00			0,17
	начисления (%)					

	Обща цена :					1,92
N.58	Полагане на гофрирани тръби Ф29	м	810,00			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н,	цена	коэф	
	гофрирана тръба Ф29	м	1,00	0,54	1,00	0,54
	ТРУД :					
	работник - I ст.	ч.ч.	0,20	3,50	1,00	0,70
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		7,00			0,04
	доп.р-ди труд (%)		100,00			0,70
	всичко преки					1,24
	общо допълнителни р-ди					0,74
	начисления (%)		10,00			0,20
	Обща цена :					2,18
N.59	Полагане ел.кабели СВТ 3x10мм2	м	470,00			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н,	цена	коэф	
	СВТ 3x10мм2	м	1,00	7,45	1,00	7,45
	ТРУД :					
	работник - I ст.	ч.ч.	0,35	3,50	1,00	1,23
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		7,00			0,52
	доп.р-ди труд (%)		100,00			1,23
	всичко преки					8,68
	общо допълнителни р-ди					1,75
	начисления (%)		10,00			1,04
	Обща цена :					11,46
N.60	Полагане ел.кабели СВТ 5x16мм3	м	810,00			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н,	цена	коэф	
	СВТ 5x16мм2	м	1,00	19,90	1,00	19,90
	ТРУД :					
	работник - I ст.	ч.ч.	0,40	3,50	1,00	1,40
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		7,00			1,39
	доп.р-ди труд (%)		100,00			1,40
	всичко преки					21,30
	общо допълнителни р-ди					2,79
	начисления (%)		10,00			2,41
	Обща цена :					26,50
N.61	Направа на лампен излаз	бр.	70,00			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н,	цена	коэф	
	СВТ 3x1,5	м	2,00	2,50	1,00	5,00
	ТРУД :					
	работник - I ст.	ч.ч.	0,50	3,50	1,00	1,75
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		7,00			0,35
	доп.р-ди труд (%)		100,00			1,75
	всичко преки					6,75
	общо допълнителни р-ди					2,10
	начисления (%)		10,00			0,89

	Обща цена :					9,74
N.62	Ел.табла	бр.	14,00			
	МАТЕРИАЛИ:					
		р.н.	цена	коэф		
	ел.табла	бр.	1,00	450,00	1,00	450,00
	ТРУД :					
	работник - I ст.	ч.ч.	1,50	3,50	1,00	5,25
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		7,00			31,50
	доп.р-ди труд (%)		100,00			5,25
	всичко преки					455,25
	общо допълнителни р-ди					36,75
	начисления (%)		10,00			49,20
	Обща цена :					541,20
N.63	Монтаж на нови осветителни тела енергоспестяващи с фотоклетка	бр.	70,00			
	МАТЕРИАЛИ:					
		р.н.	цена	коэф		
	ОСВЕТИТЕЛ С ФОТОКЛЕТКА	бр.	1,00	35,00	1,00	35,00
	ТРУД :					
	работник - I ст.	ч.ч.	0,90	3,50	2,00	6,30
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		7,00			2,45
	доп.р-ди труд (%)		100,00			6,30
	всичко преки					41,30
	общо допълнителни р-ди					8,75
	начисления (%)		10,00			5,01
	Обща цена :					55,06
N.64	ГРТ	бр.	1,00			
	МАТЕРИАЛИ:					
		р.н.	цена	коэф		
	ГРТ	бр.	1,00	2 000,00	1,00	2 000,00
	ТРУД :					
	работник - I ст.	ч.ч.	4,00	3,50	1,00	14,00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		7,00			140,00
	доп.р-ди труд (%)		100,00			14,00
	всичко преки					2 014,00
	общо допълнителни р-ди					154,00
	начисления (%)		10,00			216,80
	Обща цена :					2 384,80
N.65	Инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части	бр.	1,00			
	МАТЕРИАЛИ:					
		р.н.	цена	коэф		
	система за центр.управление	бр.	1,00	320,00	1,00	320,00
	ТРУД :					
	работник - I ст.	ч.ч.	2,00	3,40	1,00	6,80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		7,00			22,40
	доп.р-ди труд (%)		100,00			6,80

					326,80
	всичко преки				29,20
	общо допълнителни р-ди		10,00		35,60
	начисления (%)				391,60
	Обща цена :				




София 1111, ул. Елисавета Багряна №20
www.registryagency.bg

тел.: 9486 181, факс: 9486 194
office@registryagency.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20150701163859 / 01.07.2015г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на **"СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК 131405777** в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 01.07.2015 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

1.ЕИК/ПИК **131405777**
"СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ" ЕООД
4134/2005 110

Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

2.Фирма	СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ
3.Правна форма	Еднолично дружество с ограничена отговорност
5.Седалище и адрес на управление	БЪЛГАРИЯ гр. София 1373, Област София (столица); Община Столична, Район р-н Красна поляна, ж.к. ЗАПАДЕН ПАРК ул.СУХОДОЛСКА 2, бл. 31, ет. 1, ап. 3
6.Предмет на дейност	Строителство и саниране, строително-монтажни и ремонтни дейности на жилищни, административни, обществени и промишлени сгради и съоръжения и прилежащата им инфраструктура, строителство на преносни проводи на техническата инфраструктура и съоръженията към тях в областта на водоснабдяването, канализацията, електро и топлоснабдяването, проучване, проектиране, консултации, строителен надзор и оценка за съответствие на инвестиционното проектиране, контрол на строителния процес, обслужване на физически и юридически лица в страната и в чужбина, експертни, търговски, финансови и данъчни консултации по осъществяването на стопанска и други дейности от физически и юридически лица в страната и в чужбина, представителство на български и чуждестранни фирми в страната и в чужбина, всякакви други дейности, незабранени със закон.
7.Управители	Петкана Петрова Николова, ЕГН 5301296330, държава БЪЛГАРИЯ



20. Единоличен
собственик на
капитала
Размер
32. Внесен
капитал

Петкана Петрова Николова, ЕГН 5301296330, държава: БЪЛГАРИЯ

5000 лева

5000 лева

Част "Обявени актове"

Раздел **Актуален учредителен акт**

Актуален учредителен акт


1001. Описание на обявения акт Вид: Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Описание:

Раздел **Обявени актове**

Обявени актове

1001. Описание на обявения акт Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет 2008
Вид: Годишен финансов отчет
Описание:
Година: 2009
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Година: 2010
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Година: 2011
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Година: 2012
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Година: 2013

(Име и фамилия)





АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

София 1111, ул. Елисавета Багряна №20
www.registryagency.bg

тел.: 9486 181, факс: 9486 194
office@registryagency.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20150701163934 / 01.07.2015г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на **"СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК 131405777** в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 01.07.2015 г. липсват следните обстоятелства и актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Ликвидация

Ликвидация

Срок на ликвидацията

Ликвидатори

Представител

Продължаване на търговската дейност

Спиране или прекратяване на производството по ликвидация

Възобновяване на ликвидацията

Раздел Несъстоятелност

Данни за производството по несъстоятелност

Откриване на производство по несъстоятелност

Начална дата на неплатежоспособността/свръхзадължеността

Органи на длъжника

Спиране на производството

Възобновяване на производството

Прекратяване на производството

Отказ за утвърждаване на оздравителен план

Ограничаване разпоредителната власт на длъжника

Общ запор и възбрана

Осребряване и разпределение

Обявяване в несъстоятелност

Възстановяване в права



Възстановяване в права – отхвърляне на молбата

Синлици

Контролни органи

(Име и фамилия)

Борислав

(подпис и печат)





НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ СОФИЯ, офис СОФИЯ
БУЛСТАТ 1310631880221

Изх.№ 220201500191448/26.06.2015г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за наличието или липсата на задължения

Настоящото се издава на основание чл.87, ал.6 от ДОПК, в уверение на това, че:
СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ /ЕООД/

(име/наименование на задълженото лице)

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен № от регистъра на НАП

ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР **131405777**

Адрес за
кореспонденция

обл.София - град , общ.Столична гр.СОФИЯ, бул. БЪЛГАРИЯ #
102 ет.2,

Адрес по чл.8 от
ДОПК

обл.София - град , общ.Столична гр.СОФИЯ, жк ЗАПАДЕН
ПАРКул.СУХОДОЛСКА 2 бл.31 ет.1 ап.3,

Представявано от

ПЕТКАНА ПЕТРОВА НИКОЛОВА

(трите имена на представляващия/пълномощника)

В качеството му на

Представяващ субекта

(длъжност на представляващия)

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП

5301296330

.....
(в случай на упълномощаване - № и дата на пълномощното)

Няма задължения.

Настоящото се издава по искане вх.№ 220161500611803/26.06.2015 г.,
за да послужи пред ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР.


Удостоверението се издава по данни на ТД СОФИЯ, офис СОФИЯ, актуални към
26.06.2015 год.


ОРГАН ПО

ПРИХОДИТЕ:

ЮЛИЯ МИЛУШЕВА

(име, подпис, печат)





СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ
ОТДЕЛ ОП КРАСНА ПОЛЯНА
1000 гр.СОФИЯ Р-Н КРАСНА ПОЛЯНА
ул.ОСВОБОЖДЕНИЕ № 25

Изх. № 7208004730 / 26.06.2015 г.



УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.87, АЛ.6 ОТ ДОПК

Настоящото се издава на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК, в уверение на това, че:

СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ

ЕИК по БУЛСТАТ 131405777

Адрес за кореспонденция

ул. СУХОДОЛСКА № 2 бл. 31 вх. 1 ет. 2 ап. 5, гр. СОФИЯ 1000, общ. СТОЛИЧНА, обл. СОФИЯ-град

Адрес по чл.8 от ДОПК

ул. СУХОДОЛСКА № 2 бл. 31 вх. 1 ет. 2 ап. 5, гр. СОФИЯ 1000, общ. СТОЛИЧНА, обл. СОФИЯ-град

НЯМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ КЪМ СТОЛИЧНА ОБЩИНА


Настоящото се издава по искане Вх. № 7208004730/26.06.2015 г., за да послужи пред КЪДЕТО Е НЕОБХОДИМО

Удостоверението се издава по данни на СТОЛИЧНА ОБЩИНА, актуални към 26.06.2015 г.

Подпис:

Издаде: РУМЯНА РАДЕВА

Началник отдел:



ДЕКЛАРАЦИЯ

За липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаната Петкана Петрова Николова с ЕГН 5301296330, л.к. № 194976797 от 07.02.2006г. издадена от МВР София, в качеството ми на управител на „**Строителство и саниране-инженеринг-консулт**” **ЕООД**, ЕИК 131405777 , със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к. Западен парк, ул."Суходолска 2" , Бл. 31, ет.1, ап.3

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т.23 а от Допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;
2. Не съм сключил договор с лице по чл.21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;


Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

02.07.2015 г.

(дата на подписване)

Декларатор: _____


(име подпис)

Дата на издаване: **24.06.2015 г.**

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА
СЪДИМОСТ ПРИ **СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД**,
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

ПЕТКАНА ПЕТРОВА НИКОЛОВА

ЕГН/ЛНЧ: **5301296330**

РОДЕН(А): **29.01.1953, гр. София общ. Столична обл.**
София

ГРАЖДАНСТВО: **България**

НАСТОЯЩ АДРЕС: **гр. София общ. Столична обл. София**
УЛ.ЕДИСОН №8А

МАЙКА: **МАРИЙКА МАРИНОВА МАРИНОВА**


БАЩА: **ПЕТЪР НИНОВ МАРИНОВ**

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: ДОГОВОР

Служител Бюро Съдимост:

✱ /Елена Василева/



ИВБ (ТЧ) АД

411 СЧЕТ 2

Дата: 14.07.2015

Ссч № 1421, БУД, Черни връх 200

Издател на вяровател

Продукт: СЛЕНА БЛАНКЕТ-ИТЕРАЦИЯ С РА

Сметка № на получателя

Вид плащане

Банков код

835100180173301/14600

1021803

Три Банков, ИВБ (ТЧ) АД - БЛАНКЕТ РАД

ПЛАТЕЖНО НАЧЕТО И РЕЗУЛТАТ

Три

120 ПЛАТЕЖ КОДЕСНАТА

1001 1001401

Основание за плащане: ЗА РЕЗУЛТАТ, ПРЕКЪТ И РЕЗУЛТАТ

Спецификация:

01.1. ЖК. ЗАТЪД ВЛ.55

Вид и № документ

Дата документ

Период на плащане

9

Наредител: СЛЕНА БЛАНКЕТ-ИТЕРАЦИЯ


Сметка на вярвателя: БУД

17130021/600

1001/1001803 ИВБ (ТЧ) АД

Счетоводител:

А. Бланкет



ПРОСЪД ПРОСЪРКА БЛАНКЕТ-ИТЕРАЦИЯ 17130021/600

14.07.2015
