

Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата на ф-ма „Евросистем“ ЕООД гр.Кричим

№	Документи за подбор	Номер на страница
	ПЛИК №1 „Документи за подбор“:	
1	Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата - 2 листа, оригинал	1 - 2
2	Предложение, попълнено по Образец №1 , 2 листа оригинал	3 – 4
3	Декларация за регистрация по ЗТР попълнена по Образец №2 , оригинал	5
4	Декларация по чл.47, ал.1, т.1 попълнена по Образец №3 -2 листа оригинал	6 – 7
5	Списък-Декларация по чл.51 ал.1 т.2 от ЗОП- по образец №4 , 2 листа оригинал	8 - 9
6	Референции - удостоверения за добро изпълнение на посоченото в списъка на изпълненото строителство 5 бр. заверено копие	10 - 14
7	Списък - Декларация на квалифицираните работници наети на трудов или граждански договор по Образец №5 -3 листа оригинал	15 - 17
8	Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП по Образец №6 , оригинал	18
9	Документ за внесена банкова гаранция- оригинал	19
10	Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП по Образец №9 , оригинал	20
11	Декларация по чл.3 и чл. 5 т.3 от ЗИФОД по Образец №10 , оригинал	21
12	Декларация по чл.55, ал.7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП по Образец №14 , оригинал	22
13	Декларация по чл.56 , ал.1, т.11 от ЗОП по Образец №15 , оригинал	23
14	Декларация по чл. 51, ал.1, т.9 от ЗОП по Образец №16 оригинал	24
15	Списък , удостоверения и декларации по Образец. 17 – 30 листа оригинал и заверени копия	25 – 54
16	Декларация за техническа спецификация на материалите- Образец № 18 , 1 стр. оригинал	55
17	Сертификат за техническа спецификация на материалите - 12 стр. заверено копие	56 – 67
18	Сертификат за внедрена Система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 заверено копие	68
19	Сертификат за внедрена Система за управление на околната среда ISO 14001:2004 заверено копие	69
20	Сертификат за внедрена Система за управление SA 8000:2014- заверено копие	70
21	Сертификат за внедрена Система за управление OHSAS 18001:2007-заверено копие	71
22	Застраховка Професионална отговорност- 2 листа заверено копие	72 – 73
23	Удостоверение от Камара на строителите в България – 2 листа заверено копие	74 - 75



№	Документи за подбор	Номер на страница
24	Декларация за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка Образец №19 оригинал	76
25	Декларация за сключени договори за строителство по Национална програма за енергийна ефективност по Образец №20	77
	ПЛИК №2 „Предложение за изпълнение на поръчката“:	
1	Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Образец №11 , оригинал;	1 – 3
2	Подобен Линеен график за видове СМР, оригинал;	4 – 5
3	Диаграма на работната ръка, оригинал;	6
4	Технологично- строителна програма за изпълнение на СМР- оригинал;	7 - 29
	ПЛИК №3 „Предлагана цена“:	
1	Предлагана цена- Образец №12 , оригинал;	1 – 3
2	Количествено стойностна сметка- оригинал;	4 - 5

Дата: 22.02.2016 г.

Подпис и печат.....



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

**„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции
Обособена позиция № 23. Многофамилна жилищна сграда – блок № 45 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Еленово”**

I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта е подадена от: ф-ма „Евросистем“ ЕООД
и подписана от: Адем Османов Юсеинов

в качеството му на : управител

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес: П.К. 4220 ,Гр.Кричим ,община Кричим ,ул. „Кирил и Методи“ №44

Телефон № : 0897 995 400
e-mail: evrosistem@abv.bg

2. Лице за контакти: Адем Османов Юсеинов Длъжност: управител
Лична карта №641846516 ,издадена на 20.01.2011 г. от МВР-Пловдив
телефон : 0897 995 400

3. Обслужваща банка: ДСК-АД
Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:

IBAN: BG37STSA93000013853061 BIC : STSABGSF Титуляр на сметката: Адем Османов Юсеинов

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:

IBAN: BG37STSA93000013853061 BIC: STSABGSF
Титуляр на сметката: Адем Османов Юсеинов

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет при условията, обявени в тази документация и приети от нас.

2. Заявяваме, че представяме оферта за участие в процедурата с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на**



община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции за Сграда с административен адрес
Обособена позиция № 23. Многофамилна жилищна сграда – блок № 45 вх. А и вх. Б, с
административен адрес ж.к. “Еленово”

3. Запознати сме и се задължаваме да спазваме условията за участие в процедурата.

4. Запознати сме и се задължаваме да спазваме етичните клаузи на настоящата процедура.

5. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

6. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в откритата процедура.

7. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 180 календарни дни, но не по-малко от **180 календарни дни** от датата на получаване на офертата и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.


8. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Като неразделна част от настоящата оферта, представяме **Списък на документите съдържащи се в офертата** в подписан и подпечатан вид.

/Описват се всички представени от участника документи (задължителни и други - по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника и относно подизпълнителите - ако такива се предвиждат, документи относно икономическото и финансово състояние на участника, доказателства за техническите възможности и/или професионална квалификация на участника, които съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП и настоящата документация следва да бъдат поставени в плик № 1 „Документи за подбор”/.

Дата: 22.02.16 г.

Адем Юсеинов
(Подпис и печат)



*** Когато Участник в процедурата е обединение, настоящия образец на оферта се представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението/договорът за създаване на обединение.

**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР**

Подписаният: :Адем Османов Юсеинов

Данни по документ за самоличност: Лична карта №641846516 ,издадена на 20.01.2011 г. от МВР-Пловдив

в качеството си на : управител

на Участник: ф-ма „ Евросистем” ЕООД , в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 23. Многофамилна жилищна сграда – блок № 45 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Еленово”

ДЕКЛАРИРАМ:


Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: **160086706**

Дата: 22.02.2016 г.

.....

ДЕКЛАРАТОР:Адем Юсеинов

(подпис, печат)



ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“ - „д“ /без б.“е”/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Подписаният: Адем Османов Юсеинов

Данни по документ за самоличност : Лична карта №641846516 ,издадена на 20.01.2011 г. от МВР-Пловдив

в качеството си на : управител

на Участник: „ Евросистем” ЕООД ,в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград– III – ти етап по обособени позиции

Обособена позиция № 23. Многофамилна жилищна сграда – блок № 45 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Еленово”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

- а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
- б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
- в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
- г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
- д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

1. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

2. Представяваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност;

3. Представяваният от мен участник не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

4. Представяваният от мен участник не се намира в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;

5. Не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,

6. Представяваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.



на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.

7. **Не съм осъден** с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;


8. **Представяваният от мен участник не е** в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 22.02 2016 г.

гр.....

ДЕКЛАРАТОР: Адем Юсеинов



✓ * Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.

* Декларацията се попълва от участника съгласно чл.47, ал. 4 от ЗОП, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.

СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП

на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на
офертата с обекти еднакви или сходни с предмета на поръчката.

Подписаният: Адем Османов Юсеинов

Данни по документ за самоличност : Лична карта №641846516 ,издадена на 20.01.2011 г. от
МВР-Пловдив

в качеството си на : управител

на -ф-ма,, Евросистем” ЕООД


участник: ф-ма,, Евросистем” , в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: :
„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с
реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните
жилищни сгради на територията на община Благоевград -III – ти етап по обособени
позиции

Обособена позиция № 23. Многофамилна жилищна сграда – блок № 45 вх. А и вх. Б, с
административен адрес ж.к. “Еленово”

ДЕКЛАРИРАМ:

През последните пет години, считано от датата на подаване на офертите, представляваният от
мен участник е изпълнил следното строителство еднакво или сходно с предмета на
обществената поръчка:

№ по ред	строителство (кратко описание)	Възложител	Период на изпълнение	Стойност /лева/
1	Топлоизолация фасади,Подмяна външна и вътрешна дограма,Покривни работи, Подмяна отоплителна инсталация, Хидроизолация.	„НСК Инженеринг Груп” - ООД	По договор от 18.07.2014 г.	787252,80 лв.
2.	Част Електро,част ВИК и част ОВК	Община Първомай ; детска градина с.Дълбок извор	По договор от 25.04.2013 г.	30948,11 лв.
3.	Част АС ,ОВК и ВИК	НУ „ Кирил Нектариев ” гр.Пловдив	По договор от 27.05.2015 г.	41798,47 лв.
4.	Изпълнение на Топлоизолационна система	ОУ „Панайот Волов ” гр.Пловдив	по договор от 12.08.2013 г.	129577,29 лв.
5.	Част АС , доставка и монтаж на PVC дограма,Хидроизолация по покрив ,Електро- инсталация.	Кметство с.Говедаре общ.Пазарджик	по договор от 25.05.2015 г.	28547,67 лв.



Изпълнението на изискването се доказва с:

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или


в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

За „строителство с предмет, сходен с предмета на поръчката“, възложителят ще приема: **СМР по полагане на хидро и топло изолация на обществени или жилищни сгради.**

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

22. 02. 2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: Адем Юсеинов



РЕФЕРЕНЦИЯ

"НСК Инженеринг Груп" ООД, в качеството си на Изпълнител на обект: „Интегриран проект за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура на територията на Община Стамболийски”, издаваме настоящата референция на "Евросистем" ЕООД в уверение на това, че дружеството е извършило строително - монтажни работи на гореописания обект в периода 07.2014 г. – 09.2014 г. размер на 787252.80 лв. (седемстотин осемдесет и седем хиляди двеста петдесет и два лв. и осемдесет ст.). Изпълнените видове СМР са следните:

- Топлоизолация фасади;
- Подмяна външна и вътрешна дограма
- Ремонт санитарни възли
- Покривни работи
- Подмяна отоплителна инсталация
- Подмяна на осветителни тела
- Хидроизолация

В кратките срокове за реализация на обекта и при европейски изисквания за качество на изпълняваните СМР, инженерно - техническия персонал и изпълнителския състав на фирмата показаха добра организация, висока технологична дисциплина и стриктно спазване на договорените срокове. Не допуснаха отклонения от проектната документация, както и изпълниха всичките ни изисквания за материали, доставчици и качество на изпълнение. Благодарение на професионализма на ръководителите на "Евросистем" ЕООД, не беше регистрирано нито едно отклонение от междинните срокове или от нормативите за извършване и приемане на СМР. Ръководството на "Евросистем" ЕООД се отличава с изключителна отговорност в спазване на нормативната и законова база на Република България в опазване на живота и здравето на работещите на строителната площадка, а също и опазване на околната среда, обграждаща строителната площадка. "Евросистем" ЕООД е предпочитан партньор за всеки бъдещ инвеститор. Настоящата референция да послужи където е необходимо.

Контакти:

Стоян Натов, телефон: 0887272220

Гр. Пловдив, ул. Кичево № 64

17.11.2014 г.

Възложител:.....

Стоян Натов



Възложено с оригинала




ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

АДРЕС: УЛИЦА "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ - ЮГ" № 50
ТЕЛ: 0336/62201, 62139; ФАКС: 0336/62139, 62325

E-mail: obaparv@parvomar.escom.bg
<http://www.parvomar.bg/>

ДО

„Евросистем“ ЕООД
ГР. КРИЧИМ 4220
УЛ. „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ № 44



УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Община Първомай, издава настоящото удостоверение на „Евросистем“ ЕООД гр. Кричим, в уверение на това, че дружеството разполага с необходимата техника и квалифициран персонал, даващи му възможност за изпълнение на строително-монтажни работи в областта на електромонтажни работи, ВиК работи-сградни инсталации и ОВК инсталации.

През 2013 г., дружеството изпълни строително-ремонтни работи в сградата на детската градина с. Дълбок извор, община Първомай на обща стойност 30 948,11 лв с вкл. ДДС. Изпълнените видове СМР обхващат дейности по част Електро, част ВиК и ОВК. Същите бяха изпълнени в уговорените срокове и с необходимото качество.

„Евросистем“ ЕООД разполага с високо квалифицирани инженерно-технически кадри и изпълнителски състав, способни да се справят с поетите ангажименти. Стриктното спазване на договорната дисциплина ги прави надежден партньор. Фирмата доказва че може да изпълни на професионално ниво и в съответствие с действащите нормативни изисквания, поставените задачи.

Удостоверението за добро изпълнение да послужи на „Евросистем“ ЕООД - гр. Кричим за участие в обществени поръчки, търгове и други.


За контакти:
гр. Първомай
Н. Желязкова-гл. експ. "СБ"
тел. 0336 62808

НЖ/НЖ

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

КМЕТ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ:

/Ангел Ангелов Паназов/



НУ "Кирил Нектариев"	
гр. Пловдив, ул. "Правда" 50	
Изм. №	199
дата:	31.08.2015 г.

РЕФЕРЕНЦИЯ

На „Евросистем“ ЕООД

Относно изпълнение на Строително-ремонтно работи в НУ „Кирил Нектариев” – гр.Пловдив

Настоящата референция се дава на „Евросистем“ ЕООД – гр. Кричим с управител Адем Юсеинов като израз на задоволството ни от работата на фирмата

През 2015г. , в Изпълнение на договор №14 от 27.05.2015г. „Евросистем“ ЕООД изпълни строително-ремонтни работи в НУ „Кирил Нектариев” – гр. Пловдив на стойност 41798,47лв.

„Евросистем“ ЕООД разполага с високо квалифицирани инженерно-технически кадри и изпълнителски състав, способни да се справят с поетите ангажменти. Стриктното спазване на договорната дисциплина ги прави надежден партньор. Фирмата доказва ,че може да изпълни на професионално ниво и в съответствие действащите нормативни изисквания **строително-ремонтни работи** по част: „АС”, „ОВК” и „ВиК”.


Референцията се издава за да послужи при тържни процедури и други инвеститори.

Контакти:


НУ „Кирил Нектариев” – гр.Пловдив

Борислав Шушнев , тел:0898495790

Директор:.....



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



2015-09-09-2015 / 243

РЕФЕРЕНЦИЯ

На „Евросистем“ ЕООД

Относно изпълнение на Строително-ремонтни работи в НУ „Панайот Волов“ гр.Пловдив. по договор от 12.08.2013 – Прилагане на мерки за енергийна ефективност в обект: ОУ „Панайот Волов“ гр.Пловдив. Настоящата референция се дава на „Евросистем“ ЕООД – гр. Кричим с управител Адем Юсеинов като израз на задоволството ни от работата на фирмата


През 2013г. в Изпълнение на договор от 12.08.2013. „Евросистем“ ЕООД изпълни строително-ремонтни работи на обект: ОУ „Панайот Волов“ гр.Пловдив на стойност **129577,29** лв.с включен ДДС. Изпълнените видове СМР са следните:

- Изпълнение на топло изолационна система
- Доставка и монтаж на PVC дограма
- Полагане на XPS и замазка по покрив
- Полагане на два пласта хидроизолация по покрив
- Отводняване на покрив


„Евросистем“ ЕООД разполага с високо квалифицирани инженерно-технически кадри и изпълнителски състав, способни да се справят с поетите ангажименти. Стриктното спазване на договорната дисциплина ги прави надежден партньор. Фирмата доказва ,че може да изпълни на професионално ниво и в съответствие с действащите нормативни изисквания .

Референцията се издава за да послужи при тържни процедури и други инвеститори.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Управител



РЕФЕРЕНЦИЯ

На „Евросистем“ ЕООД

2 426 08.09 15

Относно изпълнение на Строително-ремонтно работи в Кметство с. Говедаре по договор от 25.05.2015 – Ремонт на сграда на стадиона в с. Говедаре, общ. Пазарджик Настоящата референция се дава на „Евросистем“ ЕООД – гр. Кричим с управител Адем Юсеинов като израз на задоволството ни от работата на фирмата

През 2015г. в Изпълнение на договор от 25.05.2015г. „Евросистем“ ЕООД изпълни строително-ремонтни работи в Кметство с. Говедаре, общ. Пазарджик на стойност 28547,67 лв.с включен ДДС. Изпълнените видове СМР са следните:

- Изпълнение на част: „АС“
- Доставка и монтаж на: „PVC“ дограма
- Полагане на два пласта „хидроизолация“ по покрив
- Изпълнение на част „Електро-инсталация“


„Евросистем“ ЕООД разполага с високо квалифицирани инженерно-технически кадри и изпълнителски състав, способни да се справят с поетите ангажименти. Стриктното спазване на договорната дисциплина ги прави надежден партньор. Фирмата доказва, че може да изпълни на професионално ниво и в съответствие действащите нормативни изисквания строително-ремонтни работи

Референцията се издава за да послужи при тържни процедури и други инвеститори.

Кмет с. Говедаре:

Йордан Бакърджиев

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



СПИСЪК -ДЕКЛАРАЦИЯ

на квалифицираните работници, наети на трудов или граждански договор, които ще
вземат участие при изпълнението на поръчката

Подписаният: Адем Османов Юсеинов

Данни по документ за самоличност : Лична карта №641846516 ,издадена на 20.01.2011 г. от
МВР-Пловдив

в качеството си на : управител

на ф-ма,, Евросистем'' ЕООД , ЕИК : 160086706


участник: ф-ма,, Евросистем'' ЕООД , в процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет: : „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с
реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните
жилищни сгради на територията на община Благоевград- III – ти етап по обособени
позиции

Обособена позиция № 23. Многофамилна жилищна сграда – блок № 45 вх. А и вх. Б, с
административен адрес ж.к. “Еленово”

ДЕКЛАРИРАМ:

На основание чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП ще използваме следния екип за изпълнение на поръчката:

Име, презиме и фамилия	Заемана длъжност	Година проф. стаж
<i>инж.Тодор Иванов Денков</i>	<i>Главен инженер</i>	<i>15 г.</i>
<i>инж.Георги Димитров Милушев</i>	<i>Контрол по качеството</i>	<i>18 г.</i>
<i>1.Емил Щерев Ангелов</i>	<i>Работник топлоизолация</i>	<i>3 г.</i>
<i>2.Ака Хаков Арифов</i>	<i>Работник топлоизолация</i>	<i>3г.</i>
<i>3.Никола Митков Ангелов</i>	<i>Работник топлоизолация</i>	<i>3 г.</i>
<i>4.Емрах Зекерие Фарис</i>	<i>Работник топлоизолация</i>	<i>3 г.</i>
<i>5.Ружди Сали Юрук</i>	<i>Работник топлоизолация</i>	<i>4 г.</i>
<i>6.Сейхан Мустафа Мехмед</i>	<i>Работник топлоизолация</i>	<i>3г.</i>



7.Сергей Евтимов Кулев	Работник топлоизолация	4г.
8.Тодор Георгиев Калеев	Работник топлоизолация	5г.
9.Самир Севриеви Балабанов	Работник топлоизолация	1г.
10.Димитър Данаилов Стоилов	Работник топлоизолация	2г.
11.Георги Методиев Дончев	Работник хидроизолация	3г.
12.Методи Христов Дончев	Работник хидроизолация	5г.
13.Ивайло Трайков Ангелов	Работник хидроизолация	1г.
14.Димитър Иванов Шавалов	Работник хидроизолация	1г.
15.Петко Димитров Петков	Работник хидроизолация	3г.
16.Румен Николов Георгиев	Ел. техник	30г.
17.Васил Костадинов Арнаудов	Ел. техник	25г.
18.Николай Кирилов Илиев	Работник настилки	2г.
19.Мирослав Димитров Петков	Работник настилки	1г.
20.Юмер Ахмедов Алиев	Работник настилки	1г.
21.Георги Пламенов Кючуков	Работник монтаж дограма	4г.
22.Петър Мирославов Граматиков	Работник монтаж дограма	12г.
23.Илко Димитров Чолаков	Работник монтаж дограма	10г.
24.Мартин Иванов Димитров	Работник монтаж дограма	5г.
25.Ангел Василев Миндилев	Работник монтаж дограма	10г.



	<i>дограма</i>	
<i>26.Георги Стойков Найденов</i>	<i>Работник монтаж дограма</i>	<i>2г.</i>
<i>27.Борис Кирилов Илиев</i>	<i>Бояджия</i>	<i>3г.</i>
<i>28.Йордан Георгиев Спасов</i>	<i>Бояджия</i>	<i>7г.</i>
<i>29.Стойко Ангелов Найденов</i>	<i>Бояджия</i>	<i>4г.</i>
<i>30.Иван Сашов Цонев</i>	<i>Общ работник</i>	<i>18г.</i>
<i>31.Славчо Петров Кисимов</i>	<i>Общ работник</i>	<i>3г.</i>
<i>32.Атанас Ненов Ковачев</i>	<i>Общ работник</i>	<i>1г.</i>
<i>33.Иван Гавроилов Кисянов</i>	<i>Общ работник</i>	<i>1г.</i>
<i>34.Иван Димитров Василев</i>	<i>Общ работник</i>	<i>1г.</i>
<i>35.Кирил Атанасов Стоянов</i>	<i>Общ работник</i>	<i>1г.</i>
<i>36.Гьойнюл Севдиев Ибрямов</i>	<i>Общ работник</i>	<i>2г.</i>

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

22.02.2016..... г.
(дата на подписване)



Декларатор: Адем Юсеинов

Д Е К Л А Р А Ц И Я *
за участието или неучастието на подизпълнители
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният: Адем Османов Юсеинов, с лична карта №641846516, издадена на 20.01.2011 г. от МВР-Пловдив с ЕГН : 7907234602, в качеството ми на управител на - ф-ма,, Евросистем” ЕООД

участник в обществена поръчка с предмет: : „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции

Обособена позиция № 23. Многофамилна жилищна сграда – блок № 45 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Еленово”

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът : ф-ма,, Евросистем” ЕООД
когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка **няма да използва** подизпълнители;

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:.....,

(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;


3. Видът на работите и дейностите, които ще извършва подизпълнителя са следните:

.....
4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

22.02.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: Адем Юсеинов



* Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.

Пловдив, 22.02.2016г.

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА

Реф. № LGISS28309 / 16 / PL

Известени сме от нашият клиент Евросистем ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Кричим, ул. Кирил и Методий №44, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 160086706, наричано за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в откритата с Ваше Решение № РП-34/29.12.2015/27.04.2015 г., открит процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции, за Обособена позиция № 23 Многофамилна жилищна сграда – блок № 45, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Еленово".

Информирани сме, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ трябва да представи в офертата си банкова гаранция за участие в процедурата, издадена във Ваша полза, за сумата в размер на BGN 8.900,00 (словом: осем хиляди и деветстотин лева).

Като се има предвид гореспоменатото, ние, Райфайзенбанк (България) ЕАД, със седалище и адрес на управление бул. "Никола Вапцаров" № 55, Експо 2000, Район Лозенец, 1407 София, България, с настоящата гаранция поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочената от Вас банкова сметка, сумата от **BGN 8.900,00** (словом: осем хиляди и деветстотин лева), в срок до 3 (три) работни дни след получаване на първо Ваше писмено искане за плащане, съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от следните действия:

- а) оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите;
- б) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка в едномесечен срок след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител в случаите, когато не е подадена жалба или е подадена жалба, но не е поискано налагане на временна мярка.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Вашето искане за плащане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез автентично SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаващо, че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез куриер и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено или след постъпване на Вашето писмено искане за плащане или автентично SWIFT съобщение на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила от 00.00 часа на 22.02.2016г.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в 24.00 часа на 19.08.2016г. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали оригинала на настоящата гаранция ни е изпратен обратно или не.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

С уважение,

.....
Пламен Георгиев
Управител на Офис Пловдив 3

.....
Николай Вълков
Специалист кредитиране на МСП

„РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)“ ЕАД

ДЕКЛАРАЦИЯ

**по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
за приемане на условията в проекта на договора**

Подписаният: Адем Османов Юсеинов

Данни по документ за самоличност :Лична карта №641846516 ,издадена на 20.01.2011 г. от
МВР-Пловдив

в качеството си на управител
на ф-ма „ Евросистем ”ЕООД

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на
Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции


Обособена позиция № 23. Многофамилна жилищна сграда – блок № 45 вх. А и
вх. Б, с административен адрес ж.к. “Еленово”

ДЕКЛАРИРАМ:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

22.02.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: Адем Юсеинов



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: Адем Османов Юсеинов

Данни по документ за самоличност :Лична карта №641846516 ,издадена на 20.01.2011 г. от МВР-Пловдив

в качеството си на управител
на - ф-ма „ Евросистем ”ЕООД

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции

Обособена позиция № 23. Многофамилна жилищна сграда – блок № 45 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Еленово”

ДЕКЛАРИРАМ:


За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на хипотезата по чл. 5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от процедурата по възлагане на обществената поръчка.

22.02.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: Адем Юсеинов





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №14

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Подписаният: Адем Османов Юсеинов
Лична карта №641846516, издадена на 20.01.2011 г. от МВР-Пловдив
в качеството си на управител
на участник: ф-ма Евросистем ЕООД

Във връзка с участието на ф-ма Евросистем ЕООД
в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на
Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната
програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на
община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 23. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 45 вх. А и вх. Б, с
административен адрес ж.к. "Еленово"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не съм свързано лице или свързано предприятие с кандидати или участници, подали
самостоятелни оферти в процедурата.

2. Не съм участвал като външен експерт в разработването на документацията за участие в
настоящата процедура.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на
чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 22.02 2016 г.

гр.....

ДЕКЛАРАТОР: Адем Юсеинов



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №15

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Долуподписаният :Адем Османов Юсеинов с лична карта №641846516, издадена на 20.01.2011г. от МВР-Пловдив, с ЕГН:7907234602 в качеството ми на управител на ф-ма,, Евросистем "ЕООД

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 23. Многофамилна жилищна сграда – блок № 45 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Еленово"

ДЕКЛАРИРАМ, че:


при определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията за минимална цена на труда, определени съгласно §1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата
Име и фамилия
Длъжност
Подпис и печат

22. / 02. / 2016г.

Адем Юсеинов
управител





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 16

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП

Долуподписаният: Адем Османов Юсеинов, в качеството си на управител
на ф-ма „Евросистем“ ЕООД

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 23. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 45 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Еленово"

ДЕКЛАРИРАМ, че:


Техническото оборудване, с което разполагаме е следното :

1. Заваръчен апарат-5бр.
2. Оградни пана -300л.м.
3. Тръбно скеле-3000 м2
4. Пробивна техника-5бр.
5. Лекотоварни автомобили- 2бр.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата 22.02.2016г.

ПОДПИСИ: ...





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 17

Списък на инженерно-техническия състав и екипа от проектанти за изпълнението на поръчката.

Ф-ма „Евросистем“ – ЕООД /посочете фирмата на участника/, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 23. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 45 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Еленово"


открита с решение №РП-34/ 29.12.2015 г. на Кмета на Община Благоевград
Участникът ф-ма „Евросистем“ ЕООД , който представлявам, ще използва следният екип за изпълнение на поръчката:

СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ				
№ по ред	Специалност	Име, презиме и фамилия	Квалификация	Общ професионален опит
1.	Висше, Строителен инженер по ПГС, 1993, ВВИСУ „Любен Каравелов” дипл. № 02261	Тодор Иванов Денков	Ръководител екип	ГУСВ под. 66340 – Пловдив 1993г. – 2000г. – Строителен инженер; „Строителна Компания ЗАГОРА” ЕАД – Стара Загора – 2008г.-2011г.- Началник на строителен Обект; „Понсстройинженеринг” ЕАД – Бургас – 2012г.-2013г. – Ръководител проект „Повишаване енергийната ефективност на



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

				образователната инфраструктура в община Раковски, способстваща устойчиво развитие.” -ОДЗ „Радост“ с. Стряма; ОУ“Отец Паисий“ – с. Стряма ОУ „Христо Ботев“ – гр. Раковски – 4 сгради ОДЗ „Щастливо детство“ – гр. Раковски; ПГ „Петър Парчевич“ – гр. Раковски; „Евросистем” ЕООД – Кричим - 2013г.-2015г. – Технически ръководител
2.	Средно, строителен техник, 1965 г. Строителен техникум „Георги Златков” гр. Брацигово дипл. № 1171	Добринка Сотирова Денкова	технически ръководител	БКС – Карлово 1967г-2003 г. – Технически ръководител. ЕТ”Кока трейд къмпани Константин Костов” – Пловдив 2008-2015 г. -Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОДЗ „Синчец“ – с. Белозем -Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СОУ „Гео Милев“ – с. Белозем
3.	Висше-Водоснабдяване и Канализация; диплом. Серия АМ № 000926 от 03.03. 1975г.	Георги Христов Маринов	Специалист по ВИК Магистър Конструктивна част на ВИК системи ,водопровод и канализация.	ВИК Проектиране и изпълнение в Проектантска Организация гр.Смолян ;период от 1976 г. до 2015г. длъжност – Проектант и изпълнител





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

				-Жилищни сгради в УПИ-ХVII-1084 кв. 48 гр. Чепеларе -Комплекс за обществено обслужване- автосервиз и сватбен салон в УПИ-VIII кв. 48 гр. Ардино
4	Висше-Магистър, Промислена топлотехника, дипломиран-1973 диплома №008677 /1973 ВМЕИ-София	Атанас Георгиев Беширов	ОВК инженер	Проектантска организация гр.Смолян, период от 2004г. до 2015г., длъжност-Проектант и ръководител на група Спортна зала „Смолян“ – гр. Смолян; Хотел-ресторант „Александър“ – гр. Златоград; Шивашки цех – с. Кирково
5	Висше— Строителен инженер диплом.1987г. диплома серия В №010864/ 20.08.1987г.	Георги Димитров Милушев	Отговорник за контрола на качеството Удостоверение за завършено на 28.07.2015г. Обучение по контрол върху качеството на изпълнение на строителството №8/28.07.2015 г.;Национален център за професионално обучение в системата на БТПП	Сиенит-ООД от 2005г. до 2010г. ; Евросистем ЕООД от 2014г. до 2015 г.: „Център за обучение на семейства“ – гр. Ракитово; Строително- ремонтни работи в ОУ “Христо Ботев “ – с. Йоаким Груево



№ по ред	СПИСЪК НА ПРОЕКТАНТСКИЯ ЕКИП			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Проектантска правоспособност	Общ професионален опит
1.	Архитект	Антоний Маринов Маринов	регистрационен номер № 03211	28 г.
2.	Конструктор	Емилия Боянова Попова	регистрационен номер №01016	35 г.
3.	Проектант по част „Енергийна ефективност“	Галина Любомирова Хубенова	регистрационен номер №41157	9 г.
4.	Проектант по част „ОВК“	Иван Петров Борисов	регистрационен номер №13500	7 г.
5.	Проектант по част „Електрическа“	Радосвета Иванова Радева	регистрационен номер №06315	28 г.
6.	Специалист по ЗБУТ	Адем Османов Юсеинов	удостоверение №24/22.01.2016 г. От Камара на строителите в България	8 г.
7.	Проектант по част „Пожарна безопасност“	Гено Иванов Ненов	регистрационен номер №42009	26 г.
8.	Проектант по част „ПБЗ“	Васил Лазаров Петков	регистрационен номер №01008	21 г.
9.	Проектант по част „Управление на отпадъците“	Мирослав Веселинов Милушев	регистрационен номер №06078	10 г.

1. През целия период на изпълнение на обществената поръчка ще осигуря активното участие на горепосочените експерти.
2. Прилагам 12 броя декларации за ангажираност на експертите.

Дата: 22.02.2016г.

Декларатор :





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Добринка Сотирова Денкова

ЕГН 4707064458, л.к. №641451973 издадена от МВР-Пловдив на 20.11.2010 г., адрес гр. Карлово, ул. Хан Крум №8, бл.2 вх.Б ет.3 ап.24
(данни по документ за самоличност)

Заемана позиция : **Технически ръководител**
в офертата на „Евросистем”- ЕООД
(наименование а участника)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. На разположение съм да поема работата по обществена поръчка с предмет „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград III –ти етап , по обособени позиции :

Обособена позиция №23: “Многофамилна жилищна сграда – блок №45, вх. „А“, вх. „Б“, с административен адрес ж. к. „Еленово”;

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обособената позиция.
3. Заявените от участника по отношение на мен данни и информация са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

22.02.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: 

Забележка: Декларацията се представя поотделно за всеки експерт, който не е на трудово правоотношение с участника, като се прилага в Плик № 1.



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

Подписаният/ата **Георги Христов Маринов** (*трите имена*)

ЕГН: **4804096049**, с постоянен адрес: **гр.Смолян , ул.Карлък №3**
(данни по документ за самоличност)

в качеството ми на

ВиК инженер
(позиция на експерта)

в офертата на

„Евросистем ”-ЕООД
(наименование а участника)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. На разположение съм да поема работата по обществена поръчка с предмет **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград III –ти етап .**

Обособена позиция №23: “Многофамилна жилищна сграда – блок №45, вх. „А“, вх. „Б“, с административен адрес ж. к. „Еленово”;

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обособената позиция.

3. Заявените от участника по отношение на мен данни и информация са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

22.02.2016г......
(дата на подписване)

Декларатор: .....

Забележка: Декларацията се представя поотделно за всеки експерт, който не е на трудово правоотношение с участника, като се прилага в Плик № 1.



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

Подписаният/ата Атанас Георгиев Беширов *(трите имена)*

ЕГН: 5001046068, с постоянен адрес: гр.Смолян, ул.Орфей №3, бл.2, вх.В, ап.35
(данни по документ за самоличност)

в качеството ми на **ОВК-инженер**
(позиция на експерта)

в офертата на **„Евросистем“-ЕООД**
(наименование а участника)


ДЕКЛАРИРАМ:

1. На разположение съм да поема работата по обществена поръчка с предмет „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград III-ти етап по обособени позиции

Обособена позиция №23: „Многофамилна жилищна сграда – блок №45, вх. „А“, вх. „Б“, с административен адрес ж. к. „Еленово“;

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обособената позиция.
3. Заявените от участника по отношение на мен данни и информация са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

22.02.2016 г.....
(дата на подписване)

Декларатор: 

Забележка: Декларацията се представя поотделно за всеки експерт, който не е на трудово правоотношение с участника, като се прилага в Плик № 1.



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От: Антоний Маринов Маринов

Заемана позиция : **Ръководител на екипа-Архитект**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции**

Обособена позиция №23: „Многофамилна жилищна сграда – блок №45, вх. „А“, вх. „Б“, с административен адрес ж. к. „Еленово“

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

22.02.2016..... г.

(дата на подписване)

Декларатор:



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От: Емилия Боянова Попова

Заема на позиция : **Конструктор**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция №23: „Многофамилна жилищна сграда – блок №45, вх. „А“, вх. „Б“, с административен адрес ж. к. „Еленово”

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.

3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

22.02.2016 г.

(дата на подписване)

Декларатор



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От: Галина Любомирова Хубенова

Заемана позиция : Проектант по част,, Енергийна ефективност”

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 23. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 45 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Еленово”

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

22.02.2016..... г.

(дата на подписване)

Декларатор:



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От: Иван Петров Борисов

Заета позиция : Проектант по част „ОВК”

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 23. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 45 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Еленово"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

22.02.2016 г.

Декларатор: 



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От: Радосвета Иванова Радева

Заема на позиция : Проектант по част „Електрическа“

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 23. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 45 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Еленово"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

22.02.2016 г.

Декларатор:



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От: Адем Османов Юсеинов

Заема на позиция : Специалист по ЗБУТ

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 23. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 45 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Еленово"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

22.02.2016 г.

Декларатор:





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От: Гено Иванов Ненов

Заема на позиция : Проектант по част, „Пожарна безопасност”

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 23. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 45 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Еленово"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

22.02.2016 г.

Декларатор:



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От: Васил Лазаров Петков

Заемана позиция : Проектант по част,, ПБЗ”

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 23. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 45 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Еленово”

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

22.02.2016..... г.

Декларатор:



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От: Мирослав Веселинов Милушев

Заемана позиция : Проектант по част,, Управление на отпадъците”

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 23. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 45 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Еленово"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

22.02.2016 г.

Декларатор:



НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
В СИСТЕМАТА НА БТПП
ПЛОВДИВ

Тел.: 032 908984, 032 908980, 0878809145, e-mail: office@pcci.bg



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
BULGARIAN CONSTRUCTION CHAMBER
ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО - ПЛОВДИВ

УДОСТОВЕРЕНИЕ


№ 8 28.07 2015 г.

Настоящото удостоверение се издава на

Ицн Георги Димитров Милушев
(име, презиме, фамилия)

Евросистем ЕООД
(фирма)

за завършено на 28.07 2015 г., обучение по
„Контрол върху качеството на изпълнение на строител-
ството, за съответствие на вляганите в строежите стро-
ителни продукти със съществените изисквания за безопас-
ност” за длъжностни лица от фирмите, извършващи строителни
дейности.



За НЦПО - ПЛОВДИВ:

(Кирил Тюлев - Управител)

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за пълна проектантска правоспособност

архитект


Антоний Маринов Маринов

регистрационен номер 03211

валидност: 01/01/2016 – 31/12/2016



Председател на КР
арх. Весела Георгиева



Председател на УС
арх. Владимир Дамянов


МЯСТО ЗА ЛИЧЕН ПЕЧАТ И ПОДПИС



Архитектите с пълна проектантска правоспособност, вписани в регистъра на Камарата на архитектите в България, в съответствие с придобитата проектантска квалификация могат да предоставят проектантски услуги в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране без ограничения по вид и размер, да договарят участие в инженеринг на строежи и да упражняват контрол по изпълнението на проектите им. (Чл.7, ал.7, изр.1 от ЗКАИИП)

Архитектите с пълна проектантска правоспособност, към гореописаните проекти могат да изработват и „Генерален план“, „Интериор и дизайн“, „Благоустройство“, „Пожарна безопасност“, „План за безопасност и здраве“, „Енергийна ефективност“, „План за управление на строителните отпадъци“ и други в съответствие с придобитата им професионална квалификация.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА





УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 01016

Важи за 2016 година

ИНЖ. ЕМИЛИЯ БОЯНОВА ПОПОВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 12/11.01.2005 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Председател на РК

инж. П. Кордов



Председател на КР

инж. И. Карастеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Киндрев

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 41157

Важи за 2016 година

ИНЖ. ГАЛИНА ЛЮБОМИРОВА ХУБЕНОВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН
МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР ПО ТОПЛОТЕХНИКА

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 85/27.01.2012 г. по части:

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ, ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛО И
ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

Председател на РК

инж. Т. Кордов



Председател на КР

инж. И. Каратеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинаре

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**



УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 13500

Важи за 2016 година

ИНЖ. ИВАН ПЕТРОВ БОРИСОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

МАШИНЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 52/31.10.2008 г. по части:

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ, ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛО И
ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

Председател на РК

инж. Е. Кордов



Председател на КР

инж. И. Каратеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Катарев

ВЪРНО С
ОРИГИНАЛА

КИИП

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 06315

Важи за 2016 година

ИНЖ. РАДОСВЕТА ИВАНОВА РАДЕВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лица с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 11/03.12.2004 г. по части:

ЕЛЕКТРИЧЕСКА

Председател на РК

инж. Р. Кордов



Председател на КР

инж. И. Кордеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинареву

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМАТА НА ТПП/К В БЪЛГАРИЯ КЛОН ПЛОВДИВ



УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 24 / 22.01. 2016г.

по чл. 26, ал. (2) от ЗЗБУТ, съгл. чл. 9, във връзка с чл. 2, ал. (1) и чл. 6, ал. (2) от Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Настоящото удостоверение се издава на

Адем Османов Юсеинов

(име, презиме, фамилия)


Евросистем" ЕООД

(представител на)

за завършено на 22.01. 2016 г. периодично обучение по безопасност и здраве при работа, съгласно ЗЗБУТ и Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Съгласно чл. 7, ал. (5) от Наредба № РД-07-2 / 16.12.2009 г., настоящото удостоверение е в сила до 22.01. 2017г.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Експерт ПКО: _____

/ К.ТЮЛЕВ /





УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 42009

Важи за 2016 година

ИНЖ. ГЕНО ИВАНОВ НЕНОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ХИМИК-ОРГАНИК

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 106/28.02.2014 г. по части:

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ИЗРАБОТЕНА СЪГЛАСНО ЗУТ, НАРЕДБА №4 ЗА
ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И ПРИЛОЖЕНИЕ №3 КЪМ ЧЛ.4, АЛ.1 ОТ
НАРЕДБА №13-1971 ЗА СТПНОБП

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ТЕХНИЧЕСКА ЗАПИСКА И ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ,
СХЕМИ И СИТУАЦИОННИ ПЛАНОВЕ

Председател на РК

инж. Г. Кордов



Председател на КР

инж. И. Карапетев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Куманов

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 01008

Важи за 2016 година

ИНЖ. ВАСИЛ ЛАЗАРОВ ПЕТКОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 10/17.09.2004 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Председател на РК

инж. Т. Кордобе



Председател на КР

инж. И. Каришкова

Председател на УС на КИИП

ВЯНО С. Кинарево

ОРИГИНАЛА





УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 06078

Важи за 2016 година

ИНЖ. МИРОСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ МИЛУШЕВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 13/11-02.2005 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Председател на РК

инж. Т. Кордов



Председател на КР

инж. И. Кордов

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинаров

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА

153500000439884

Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗПАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: "АРЧИС"ЕООД

гр.СОФИЯ ул.ГЕОРГИ Пеячевич 48 ЕИК175262868

(трите имена/фирма, адрес, телефон, факс, ЕГН/Булстат, данъчен №)

Представяван от: арх.АНТОНИЙ МАРИНОВ МАРИНОВ - УПРАВИТЕЛ

(трите имена, длъжност)

Професионална дейност: ☐ Проектант ☐ Консултант А ☐ Консултант Б ☐ Строител ☐ Лице, упражняващо строителен надзор

Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти

Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор ☐ Лице, упражняващо технически контрол

Застрахователно покритие: ☒ Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ

☐ Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект:
(само за Клауза Б)

(наименование и адрес)

Лимити на отговорност (в лева)	Дейност 1 ПРОЕКТАНТ	Дейност 2:	Дейност 3:
Лимит за едно събитие, в т.ч.:	25000 ЛВ		
лимит за имуществени вреди			
лимит за неимуществени вреди			
лимит за едно увредено лице			
Общ лимит на отговорност	50000 ЛВ		

Самоучастие на застрахования: НЕ

Срок на застраховка: 12 от 00.00 часа на 13.05.2015 г. до 24.00 час 12.05.2016 г.

Ретроактивна дата: НЕ год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от (00) часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Дължимна застрахователна премия: 50 лева. 2% ЗДЗП - 1 ЛЕВ

словом: ПЕТИДЕСЕТ И ЕДИН ЛЕВА

Начин на плащане: ☒ еднократно ☐ разсрочено

лева на _____ год.;
лева на _____ год.;
лева на _____ год.;
лева на _____ год.

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицата. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24,00 часа на петнадесетия ден от датата на подаване на неплатената разсрочена вноска.

Дата и място на издаване на полицата: 12.05.2015 г. год. гр. СОФИЯ

Настоящата Полица, Въпросник/предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавъци и други приоружаващи документи си неразделна част от застрахователния договор.

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПОСРЕДНИК: ФОРУКОМ БРОКЕР ООД КОД 35090397

Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", запознах се с тях и заявявам, че ги приемам.

Застрахован:

(подпис и печат)

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

Застраховател:

(подпис и печат)

СЕРТИФИКАТ № 00455/06.08.2015 г.

С настоящото ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД, наричано по-нататък Застраховател, удостоверява наличието на договор за задължителната застраховка по Закона за устройство на територията (ЗУТ), покриваща отговорността на посочения по-долу Застрахован - лице по чл. 171 на ЗУТ /проектант/, сключен, по начин и условия както следва:

ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:

Застраховката покрива професионалната отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, съгласно Специалните условия на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД.

№ 7261510000453

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР:**ЗАСТРАХОВАН:**

ИВАН ПЕТРОВ БОРИСОВ

ПЕРИОД НА ЗАСТРАХОВКАТА:

ЕГН: 7411246668

12 месеца

от 00:00:00 часа на 07.08.2015 г.

до 24:00:00 часа на 06.08.2016 г.

и 5/пет/ години назад 07.08.2010 г. ретроактивна дата за всички обекти.

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД,

ул. "Осогово" № 38-40,

1303 София,

тел. (02) 904 77 00

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:

Съгласно приложимата нормативна уредба и Специалните условия на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД, и в рамките на посочения лимит на отговорност, договорен в договор № 7261510000452

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА :

50 000 лв. (словом петдесет хиляди)

лева за всички застрахователни събития през периода на застраховката. За едно събитие през срока на застраховката до лимита на застраховането, но не по-малко от 50% от застрахователната сума.


ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТИЕ:

Обезщетението се изплаща в 15-дневен срок след доказване на основанието и размера на дължимата сума и съобразно предвиденото в Специални условия.

СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ

Без самоучастие на застрахования.

Този сертификат съдържа основни положения по сключената застраховка, но не възпроизвежда изцяло съдържанието на приложимите нормативна уредба, Специални условия и договор и не може да им бъде противопоставен.

ЗАСТРАХОВАН:**ЗАСТРАХОВАТЕЛ:****ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**



Застрахователно акционерно дружество
Армеец
www.armeec.bg

Застрахователно акционерно дружество "Армеец"
София 1000, ул. "Стефан Караджа" №2
ЕИК по Булстат: 121076907
Решение №7 / 15.06.1998 г. на НСЗ

КВИТАНЦИЯ №: 0001913759 / 08-01-2016 11:28
за платена сума по полица №: 0000404564 / 09-07-2015
Сключена от: АВАНГАРД ИНШУРЪНС БРОКЕР ЕООД (10090298) - София-7 (570) 570
За застраховка: ОТГОВОРНОСТИ

Застраховано лице: **Гено Иванов Ненов**
ЕГН/ЕИК по Булстат: **4607186386**
Данни за обекта:
Начин на плащане: **В брой на застрахователния посредник**
Дата на плащане: **08-01-2016 11:28**

Документ	Дата на падеж	Поредност на вноската	Застрахователна премия	2% ДЗП	Общо
Полица	09-01-2016	2	26.25 лв.	0.53 лв.	26.78 лв.
Общо			26.25 лв.	0.53 лв.	26.78 лв.
Словом: двадесет и шест и 0.78 лева					

За Застрахования:

(Подпис)
Гено Иванов Ненов/

За Застрахователя:

(Подпис и печат)

Агент/брокер: **АВАНГАРД ИНШУРЪНС БРОКЕР**
ЕООД Код: **10090298**
Агенция: **София-7 (570) Код: 570**
Регистратор: **Ралица Йорданова Кралева**

Документът е отпечатан на: 08-01-2016 11:27

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

(Подпис и печат)

Алианс България
Застрахователно акционерно дружество

Общо застраховане

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 13180153070000014

"Алианс България" – Застрахователно Акционерно Дружество на основание предложение от Застрахования и срещу платена застрахователна премия застрахова професионалната отговорност на Застрахования по начин и условия, както следва:

ВИД ЗАСТРАХОВКА:

Професионална отговорност в проектирането и строителството

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

ЗАО "Алианс България",
бул. "Княз Дондуков" № 59, 1504 София
ДДС № BG040638060, ЕИК : 040638060

ЗАСТРАХОВАН:

МИРОСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ МИЛУШЕВ ЕГН: 7604031468
Адрес : гр. СОФИЯ, п. код 1784, Ж.к.ПОЛИГОНА, Бл.7, Ет.7, Ап.53
Проектант, Категория строежи: III
от 00:00:00 часа на 28.02.2015 г. до 24:00:00 часа на 27.02.2016 г.
27.02.2010 г.

ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:

СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:

РЕТРОАКТИВНА ДАТА:

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ:

Съгласно действащата нормативна уредба

50,000.00 BGN за всяко едно събитие.

100,000.00 BGN в агрегат за срока на застраховката.

10.00 % (десет процента), но не по-малко от 1,000.00 BGN (хиляда BGN) от всяка щета.

САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:

100.00 BGN (сто BGN)

ДАНЪК ПО ЗДЗП:

2.00 BGN (два BGN)

ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА:

102.00 BGN (сто и два BGN)

СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ: 28.02.2015 г.

102.00 BGN в т.ч. премия 100.00 BGN и данък 2.00 BGN

Общите условия на застраховката, приложенията, добавъците и други писмени договорености между страните (ако има такива) представляват неразделна част от настоящата полица.

С подписа си по-долу Застрахованият удостоверява, че е съгласен и приема общите условия към настоящата полица, екземпляр от които са му предадени към момента на подписване на полицата, както и че му е предоставена писмено информация като потребител на застрахователни услуги по чл. 185 ал. 3 от Кодекса за застраховане.

В случай на неплащане или непълно плащане на дължима вноска от застрахователната премия, застраховката се прекратява към 24.00 часа на 15-ия ден, считано от датата на съответния падеж, посочен в застрахователната полица.

ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ: 21.01.2015 г., гр. СОФИЯ

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

/Петър Иванов Иванов/

ЗАСТРАХОВАН:

/МИРОСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ
МИЛУШЕВ/

Посредник: ГП ВАЛЕНТИНА КОТОВА - СОФИЯ 7 ООД, гр./с. СОФИЯ, п. код 1113, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ, №14, ЛД № 3070000
Посредник: "БЪЛГАРИЯ НЕТ" АД, гр. СОФИЯ, п.код 1504, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ № 59, ЛД № 0010005

№ 1220180

Оригинал

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Allianz

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ

"ЕВРОСИСТЕМ" ЕООД

/посочете фирмата на участника/,

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 23. Многофамилна жилищна сграда – блок № 45 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Еленово”

открита с решение № РП-34/ 29.12.2015г. на Кмета на Община Благоевград


№ по ред	Вид материал	Мярка	Количество
1	Експандиран полистерен	м2	3171,00
2	Екструдирен полистерен	м2	474,00
3	Стъклотекстилна мрежа	м2	3171,00
4	Лепилна и шпакловъчна смес	кг	19026,00
5	Мазилка	кг	8879,00
6	PVC дограма	м2	566,00
7	Хидроизолация без посипка	м2	474,00
8	Хидроизолация с посипка	м2	474,00
9	Цимент	кг	896,0
10	Ламарина	м2	160,00

Към декларацията прилагам следните сертификати за съответствие:

1. Сертификат за топлоизолационна система;
2. Декларация за съответствие за PVC дограма;
3. Декларация за експлоатационни показатели за хидроизолация без посипка
4. Декларация за експлоатационни показатели за хидроизолация с посипка
5. Сертификат за качество за цимент
6. Декларация за съответствие и сертификат за качество за ламарина;

22.02.2016г.

УЧАСТНИК:.....
Адем Юсеинов-Управител



® **НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ
ПО СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ЕООД**

Илия Бешков" 1
RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING MATERIALS

тел.: 973 27 87, 873 76 88, факс: 973 29 10

e-mail: niism@abv.bg, niism@niism.com

НАПРАВЛЕНИЕ ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ
ЛИЦЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СЕРТИФИКАЦИЯ
Разрешение № РОССП – 03/17.09.2007 г. на МРРБ.

СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕН КОНТРОЛ

03 – НСИСОССП – 161-4/10.08.2015 г.

В съответствие с част трета на Наредбата за съществения изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти е установено, че строителният продукт

**ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА (ETICS)
"DEKOTHERM"**

(Външна топлоизолационна комбинирана система (ETICS) на основата на експандиран пенополистирен за фасадни стени на сгради от първа до шеста категория по ЗУТ) (чл.55, ал.(3), т.7 от НСИСОССП)

"ОРГАХИМ" АД

гр. Русе, бул. "Трети март" № 21

в гр. Русе, бул. "Трети март" № 21

е подложен от производителя на първоначално изпитване на типа, производствен контрол, текущо изпитване на пробни образци по предписан план за изпитване и НИИСМ ЕООД е извършил първоначален контрол (одит) на производствения контрол и осъществява постоянен контрол, оценка и одобряване на производствения контрол.

Този сертификат удостоверява, че всички разпоредби по отношение на оценяване на системата за производствен контрол и изискванията на

БДС EN 13499:2004 и ETAG 004


са приложени и изпълнени.

Този сертификат е издаден за първи път на **10.08.2015 г.** и остава валиден до **10.08.2018 г.**, или докато изискванията на техническата спецификация са изпълнени и условията на производство или производствен контрол не са изменени.

Сертификатът заедно с Приложението се състои от 3 страници.


Град: София
дата: 10.08.2015 г.

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**



Управител

/инж. В. Димитров/




НИИСМ-ЕООД

ОЦЕНЯВАНЕ
СЪОТВЕТСТВИЕТО
НА СТРОИТЕЛНИТЕ
ПРОДУКТИ

DEKOTHERM STANDART 10 (EPS) Вариант 1	Крепежни елементи	
	Пластмасови набивни дюбели за топлоизолации ПДИП	„Панчев“ ЕООД, гр. Варна
	Основно покритие – продукти под марката Deko professional	
	Армираща алкалоустойчива стъкловлакнеста мрежа	„Джи Пласт“ ООД, Варна
	Universal Лепилна и шпакловъчна смес с фибри	„Авалон Индъстри“ АД, гр. Русе
	Строителен грунд водоразредим концентрат	„Оргехим“ АД, гр. Русе
	Финишно покритие – продукти под марката Deko professional	
	Фасадна боя със силикон	„Оргехим“ АД, гр. Русе
	Лепилен слой – продукти под марката Deko professional	
	1. DekoFix Лепилна смес 2. DekoFlex Лепилна и шпакловъчна смес с фибри	1. „Мапей България“ АД, гр. Русе; 2. „Авалон Индъстри“ АД, гр. Русе
DEKOTHERM STANDART 10 (EPS) Вариант 2	Топлоизолационен материал – продукти под марката Deko professional	
	Експандиран полистирен: 1. EPS-F 100, плътност 15-17 kg/m ³ ; 2. EPS-F 90, плътност 14-16 kg/m ³	1. „Булпор“ ЕООД, гр. Шумен; 2. „Авалон Индъстри“ АД, гр. Русе
	Крепежни елементи	
	Пластмасови набивни дюбели за топлоизолации ПДИП	„Панчев“ ЕООД, гр. Варна
	Основно покритие – продукти под марката Deko professional	
	Армираща алкалоустойчива стъкловлакнеста мрежа	„Джи Пласт“ ООД, Варна
	DekoFlex Лепилна и шпакловъчна смес с фибри	„Авалон Индъстри“ АД, гр. Русе
	Силикат-модифициран грунд за мазилки	„Оргехим“ АД, гр. Русе
	Финишно покритие – продукти под марката Deko professional	
	Силикат-модифицирана мазилка с влачена структура	„Оргехим“ АД, гр. Русе
DEKOTHERM STANDART 10 (EPS) Вариант 2	Лепилен слой – продукти под марката Deko professional	
	1. DekoFix Лепилна смес 2. DekoFlex Лепилна и шпакловъчна смес с фибри	1. „Мапей България“ АД, гр. Русе; 2. „Авалон Индъстри“ АД, гр. Русе
	Топлоизолационен материал – продукти под марката Deko professional	
	Експандиран полистирен: 1. EPS-F 100, плътност 15-17 kg/m ³ ; 2. EPS-F 90, плътност 14-16 kg/m ³	1. „Булпор“ ЕООД, гр. Шумен; 2. „Авалон Индъстри“ АД, гр. Русе
	Крепежни елементи	
	Пластмасови набивни дюбели за топлоизолации ПДИП	„Панчев“ ЕООД, гр. Варна
	Основно покритие – продукти под марката Deko professional	
	Армираща алкалоустойчива стъкловлакнеста мрежа	„Джи Пласт“ ООД, Варна
	DekoFlex Лепилна и шпакловъчна смес с фибри	„Авалон Индъстри“ АД, гр. Русе
	Силиконов грунд за мазилки	„Оргехим“ АД, гр. Русе
	Финишно покритие – продукти под марката Deko professional	
	Силиконова мазилка с влачена структура	„Оргехим“ АД, гр. Русе
	Силиконова мазилка с драскана структура	„Оргехим“ АД, гр. Русе

ВАРНО С
ОРИГИНАЛА





ВИАС ЕООД
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ **CE**

Долуподписаният Веско Василев - Управител на ВИАС ЕООД
с адрес: гр.Шумен,бул."Ришки проход" 68а
декларирам на собствена отговорност, че продуктът

ВИВА ПЛАСТ
три, четири и петкамерен PVC профил,

за който се отнася тази декларация е произведен в условията на въведена и поддържана Система за производствен контрол (СПК) и е в съответствие с
БДС EN 477:2003; БДС EN 14351-1; БДС EN 14609:2005; БДС EN 477:2003
БДС EN 478:2002; БДС EN 12211:2003; БДС EN 1026:2003
БДС EN 479:2002 ; БДС EN ISO 140-3:2003; БДС EN ISO 717-1:2003
БДС EN 514:2003; БДС EN ISO 12567-1; БДС EN 12210:2003
БДС EN 60695-11-10; БДС EN 13115:2004; БДС EN 12208:2003

и съответствието е оценено съгласно Директива 89/106/ЕЕС на Съвета на Европейската общност от 21 декември 1988 г. за хармонизиране на законите, наредбите и административните разпоредби на страните членки по отношение на строителните продукти (Construction Products Directive - CPD), изменена с Директива 93/68/ЕЕС на Съвета на ЕО от 22 юли 1993 г., въведена в българското законодателство с част втора на Наредбата за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на протокол от първоначално изпитване на типа на продукта № 626-1-462; 626-1-463/06.07.2007 г.; №626-1-782/03.09.2009; № ИТТ-09.23/15.01.2010; № ИТТ-09.24/10.11.2009; № ИТТ-09.47/25.01.2010 издадени от „НИСИ“ ЕООД гр.София, протокол от изпитване № ИЦ-49-68/06.08.2009г. издаден от „Изпитвателен център по пожарна и аварийна безопасност“ гр.София и сертифицирана Система за производствен контрол № BG-018/01/09 от 09.12.2009 г.

Нотифицирано лице за оценяване и съответствие на строителни продукти – ЕВРОБУЛСЕРТ ООД – гр.София,ул."Христо Белчев" № 8, с Идентификационен номер NB 2079 от регистъра на Европейската комисия и Разрешение № CPD 13 – NB 2079/07.07.2008 г. на МРРБ


Годината за поставяне на маркировката **CE** е 2009.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.


Указания за приложение:
За изготвяне на врати и прозорци

гр.Шумен

Управител:



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



CE

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
Съгласно Приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

Име на продукта: **Изофлекс-58, APP, 3кг без минерална посипка**

№ 1165

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
БДС EN 13707 SALAMBO APP 00004

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да идентифицира строителния продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4

Номер на партидата: виж опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с хармонизираната спецификация, както е предвидено от производителя:

Хидроизолация на покривни конструкции

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

АДИ КОМЕРС ЕООД, ул. Олиmpi Панов 19, 7000, Русе, България


5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в чл. 12, параграф 2:

Неприложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 2+

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:
Нотифицираната лаборатория НИСИ-ЕООД, извърши изпитване 2+ и издаде протокол



8. Декларираните експлоатационни показатели



**ВЪРНА С
ОРИГИНАЛА**

[Handwritten signature]

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизирана техническа спецификация
1. Реакция на огън		
-Клас по реакция на огън	C ₁₀₀ (14)	
2. Клас по реакция на огън	F	
3. Дебелина, mm	NPD	
4. Маса на единица площ, kg/m ²	3,1	
5. Водонепропускливост, МПа	не пропуска вода, издържа	
6. Якоост на огън, N/50 mm:		
▲ надлъжно	475	
▲ напречно	250	
7. Относително удължение при огън, %		
▲ надлъжно:	6	
▲ напречно:	11	
8. Съпротивление на проникване на корени	NPD	
9. Съпротивление на статично пробиване, N	NPD	
10. Съпротивление на разкъсване/сече стъбло на гвоздей, N	NPD	
▲ надлъжно:		
▲ напречно:		
11. Якоост на свързване на снажданията, N/50 mm:		
▲ надлъжно:	480	
▲ напречно:	250	
12. Дълготрайност-само за последен монтиран пласт без защита	NPD	
13. Отъжделяемост при ниска температура, °C	-10	
14. Устойчивост на стичане при повишени температури, °C	120° C - няма стичане	
15. Адхезия на боята, %		

БДС EN 13707: 2004
+A2:2009

ВЪРНО С
ОТ ИВАН ПАЛА




CE


9. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т. 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Дата: 14. 09. 2014 г.

Инспектор качество:
/ Даниела Христова /



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
Съгласно Приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

Име на продукта: **Изофлекс-58, APP, 4кг с минерална посипка**

» 1164

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
БДС EN 13707 SALAMBO APP 00009

2. Тип, партиден или серийен номер или друг елемент, който позволява да идентифицира строителния продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4

Номер на партидата: **виж опаковката**

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие хармонизираната спецификация, както е предвидено от производителя:

Хидроизолация на покривни конструкции

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

АДИ КОМЕРС ЕООД, ул. Олимпи Панов 19, 7000, Русе, България

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в чл. 12, параграф 2:

Неприложимо



6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 2+

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:
Нотифицираната лаборатория НИСИ-ЕООД, извърши изпитване по система 2+ и издаде протокол


8. Декларирани експлоатационни показатели

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**



Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизирана техническа спецификация
1. Реакция на огън		
-Клас по реакция на огън отвън	C _{prod} (14)	
2.Клас по реакция на огън	F	
3. Дебелина, mm	NPD	
4.Маса на единица площ, kg/m ²	4.1	
5. Водонепропускливост, МРа	не пропуска вода, издържа	
6. Якоост на опън, N/50 mm:		
^ надлъжно	520	
^ напречно	250	
7. Относително удължение при опън, %		БДС EN 13707; 2004 +A2:2009
^ надлъжно:	6	
^ напречно:	10	
8. Съпротивление на проникване на корени	NPD	
9. Съпротивление на статично пробиване, N	NPD	
10. Съпротивление на разкъсване/със стъбло на гвоздей, N	NPD	
^ надлъжно:		
^ напречно:		
11. Якоост на срязване на снажданията, N/50 mm:		
^ надлъжно:	525	
^ напречно	255	
12. Дълготрайност-само за последен завършващ пласт без защита	NPD	
13. Огъваемост при ниска температура, °C	При 0°C няма пукнатини	
14. Устойчивост на стичане при повишени температури, °C	120°C - няма стичане	
15. Адхезия на покритката, %	5.3	

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



CE


9. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т. 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Дата:


14.09.2017

Инспектор качество:

/ Даниела Христова



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА





НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ЕООД

www.niism.com

1528 София, ул. "Илия Бешков" 1

тел.: +359 2/ 973 27 87, 873 76 88, факс: 973 29 10

RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING MATERIALS

1528 Sofia, I. Beshkov Str. 1, PK 60

e-mail: niism@abv.bg, niism@niism.com

НАПРАВЛЕНИЕ ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ
ОРГАН ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ

Разрешение № CPD 05 – NB 1950/17.09.2007 г.

НИИСМ-ЕООД
ОЦЕНЯВАНЕ
СЪОТВЕТСТВИЕТО
НА СТРОИТЕЛНИ
ПРОДУКТИ

ЕС - СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

1950 – CPD – 057-1/14.12.2007 г.

В съответствие с Директива 89/106/ЕЕС на Съвета на Европейската общност от 21 декември 1988 г. за хармонизиране на законите, наредбите и административните разпоредби на страните членки по отношение на строителните продукти (Construction Products Directive – CPD), изменена с Директива 93/68/ЕЕС на Съвета на ЕО от 22 юли 1993 г., въведена в българското законодателство с част втора на Наредбата за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, е установено, че строителният продукт

ПОРТЛАНДИМЕНТ

СЕМ I 52,5 N

пуснат на пазара от
"ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ" АД
с. Бели извор, обл. Враца

и произведен в завод
с. Бели извор, обл. Враца

е подложен от производителя на производствен контрол и на текущо изпитване на пробни образци, взети от производството по предписан план за изпитване, и че нотифицираният орган НИИСМ ЕООД е извършил първоначално изпитване на типа за съответните характеристики на продукта, първоначален контрол (одит) на производствения контрол, осъществява постоянен контрол (надзор), оценка и одобряване на производствения контрол и провежда одит-изпитване на пробни образци, взети от производството, от пазара и от строителната площадка.

Този сертификат удостоверява, че всички разпоредби по отношение на оценяване съответствието и експлоатационните характеристики, определени с приложение ZA на стандарт


БДС EN 197-1

са приложени и че продуктът съответства на всички предписани изисквания.

Този сертификат е издаден за първи път на 14.12.2007 г. и остава валиден, докато изискванията на хармонизираната техническа спецификация по отношение на условията на производство в завода или производствения контрол не са изменени значително.

Град: София
дата: 14.12.2007

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



НИИСМ-ЕООД

Ръководител НОСП:

СЪОТВЕТСТВИЕ:

НА СТРОИТЕЛНИ

ПРОДУКТИ

/инж. В. Лалова/

/прф.д-р инж. Иван Янев/

"МАЛЕГРИА" ЕООД

Доставка и търговия с черни метали, профили за сухо строителство
Гр.София, складова база гара Яна, тел. 0889 595 383 e-mail: malegria.sg@gmail.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният/та Савина Тодорова Георгиева, в качеството си на:
Управител на фирма „Малегрия“ ЕООД,
гр.София, ул.„Проф.Христо Вакрелски“ № 5А, вх.Б

Декларирам на собствена отговорност, че металът / цинкован лист 0.4 x 1000 x 2000 мм/,

е съгласно сертификат 60052553/29.01.2015 г.

Декларирам, че ми е известна отговорността, съгласно чл. 313 от НК.

Дата: 16.09.2015 г.

Управител:

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА





Figure 1 illustrates the steps of the proposed algorithm for finding a minimum spanning tree. The process starts with a graph with 6 nodes and 7 edges. The algorithm proceeds by selecting edges in increasing order of weight, rejecting those that would either create a cycle or result in a vertex with a degree greater than 2. The steps are as follows:

- (a) Initial graph with 6 nodes and 7 edges.
- (b) Select edge (1,2) with weight 1.
- (c) Select edge (2,3) with weight 1.
- (d) Select edge (3,4) with weight 1.
- (e) Select edge (4,5) with weight 1.
- (f) Select edge (5,6) with weight 1.
- (g) Select edge (1,3) with weight 2.
- (h) Select edge (2,4) with weight 2.
- (i) Select edge (3,5) with weight 2.
- (j) Select edge (4,6) with weight 2.
- (k) Final minimum spanning tree with 5 edges and total weight 10.

11. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541

1. The first part of the document is a list of names and their corresponding addresses. The names are listed in the left column, and the addresses are listed in the right column. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The addresses are: 123 Main St, 456 Elm St, and 789 Oak St.

2. The second part of the document is a list of names and their corresponding addresses. The names are listed in the left column, and the addresses are listed in the right column. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The addresses are: 123 Main St, 456 Elm St, and 789 Oak St.

3. The third part of the document is a list of names and their corresponding addresses. The names are listed in the left column, and the addresses are listed in the right column. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The addresses are: 123 Main St, 456 Elm St, and 789 Oak St.

4. The fourth part of the document is a list of names and their corresponding addresses. The names are listed in the left column, and the addresses are listed in the right column. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The addresses are: 123 Main St, 456 Elm St, and 789 Oak St.

5. The fifth part of the document is a list of names and their corresponding addresses. The names are listed in the left column, and the addresses are listed in the right column. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The addresses are: 123 Main St, 456 Elm St, and 789 Oak St.

6. The sixth part of the document is a list of names and their corresponding addresses. The names are listed in the left column, and the addresses are listed in the right column. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The addresses are: 123 Main St, 456 Elm St, and 789 Oak St.





7. The seventh part of the document is a list of names and their corresponding addresses. The names are listed in the left column, and the addresses are listed in the right column. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The addresses are: 123 Main St, 456 Elm St, and 789 Oak St.

8. The eighth part of the document is a list of names and their corresponding addresses. The names are listed in the left column, and the addresses are listed in the right column. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The addresses are: 123 Main St, 456 Elm St, and 789 Oak St.

9. The ninth part of the document is a list of names and their corresponding addresses. The names are listed in the left column, and the addresses are listed in the right column. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The addresses are: 123 Main St, 456 Elm St, and 789 Oak St.

10. The tenth part of the document is a list of names and their corresponding addresses. The names are listed in the left column, and the addresses are listed in the right column. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The addresses are: 123 Main St, 456 Elm St, and 789 Oak St.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

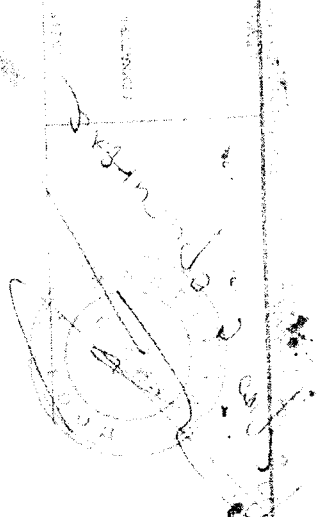



Quality Certified

Certificate of Registration

Евросистем ЕООД

ул. Кирил и Методий 44, Кричим, 4220, България

Горепосоченият лицензополучател е оценен и регистриран от TQCS International Pty Ltd. като способен да контролира качеството на стоките или услугите, които предоставя, в съответствие с изискванията на Лицензното споразумение, на или от адреса посочен по-горе, според система за управление, съответстваща на:

ISO 9001:2008

Регистрацията покрива строителство на сгради, телекомуникационни съоръжения и прилежаща инфраструктура.

Изключения: 7.3

Дата на издаване: 26 март 2014
Валиден до: 20 март 2017

Craig J Bates
President
TQCS International (Group) Pty Ltd



Лиценз No: BG232-QC-EC-SC
Първоначална сертификация: 21 март 2011

Bozhidar Pindev
General Manager
TQCSI Bulgaria Ltd

Този сертификат потвърждава издадения оригинален сертификат и е валиден, докато е видим като електронно копие на www.tqcsi.com и надзорните одити са удовлетворително приключени.



TQCS INTERNATIONAL PTY LTD
www.tqcsi.com



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Environmentally Certified

Certificate of Registration

Евросистем ЕООД

ул. Кирил и Методий 44, Кричим, 4220, България

Горепосоченият лицензополучател е оценен и регистриран от TQCS International Pty Ltd. като способен да контролира аспектите на околната среда, свързани с неговите операции, в съответствие с изискванията на Лицензното споразумение, на или от адреса посочен по-горе, според система за управление на околната среда, съответстваща на:

ISO 14001:2004

Регистрацията покрива строителство на сгради, телекомуникационни съоръжения и прилежаща инфраструктура.

Дата на издаване: 26 март 2014

Валиден до: 20 март 2017

Craig J Bates
President
TQCS International (Group) Pty Ltd



Лиценз No: BG232-QC-EC-SC

Първоначална сертификация: 21 март 2011

Bozhidar Pindev
General Manager
TQCSI Bulgaria Ltd

Този сертификат потвърждава издадения оригинален сертификат и е валиден, докато е видим като електронно копие на www.tqcsi.com и надзорните одити са удовлетворително приключени.



TQCS INTERNATIONAL PTY LTD
www.tqcsi.com

AVCB



www.ias-anz.org/register

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Social Accountability Certified

Certificate of Registration

Евросистем ЕООД

ул. Кирил и Методий 44, Кричим, 4220, България

Горепосоченият лицензополучател е оценен и регистриран от TQCSI International Pty Ltd. като способен да поддържа изискванията за социална отговорност и управление в съответствие с изискванията на Лицензното споразумение, на или от адреса посочен по-горе, според система за управление на социалната отговорност, съответстваща на:

SA 8000:2014

Регистрацията покрива високо и ниско строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, електроразпределителни мрежи и съоръжения.

Дата на издаване: 09 февруари 2015

Валиден до: 20 март 2017



Лиценз No: BG232-SA

Първоначална регистрация: 26 март 2014

Craig J Bates
President
TQCS International (Group) Pty Ltd

Bozhidar Pindiev
General Manager
TQCSI Bulgaria Ltd

This certificate verifies the original certificate issued and is valid as long as it is displayed as an electronic copy at www.tqcsi.com and surveillance audits are satisfactorily completed.



TQCS INTERNATIONAL PTY LTD
www.tqcsi.com



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Safety Certified

Certificate of Registration

Евросистем ЕООД

ул. Кирил и Методий 44, Кричим, 4220, България

Горепосоченият лицензополучател е оценен и регистриран от TQCS International Pty Ltd. като способен да контролира здравето и безопасността при работа, в съответствие с изискванията на Лицензното споразумение, на или от адреса посочен по-горе, според система за управление на безопасността, съответстваща на:

OHSAS 18001:2007

Регистрацията покрива строителство на сгради, телекомуникационни съоръжения и прилежаща инфраструктура.

Дата на издаване: 26 март 2014

Валиден до: 20 март 2017

Лиценз No: BG232-QC-EC-SC

Първоначална сертификация 21 март 2011

Craig J Bates
President
TQCS International (Group) Pty Ltd



Bozhidar Pindev
General Manager
TQCSI Bulgaria Ltd

Този сертификат потвърждава издадения оригинален сертификат и е валиден, докато е видим като електронно копие на www.tqcsi.com и надзорните одити са удовлетворително приключени.



TQCS INTERNATIONAL PTY LTD
www.tqcsi.com



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 15-268-1317 0000456131

Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

На основание Въпросник-предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на

Застрахован: **"ЕВРОСИСТЕМ" ЕООД**
гр. Кривопаланкско, ул. "Кирил и Методий" № 44, Булевард: 160086706
(приете имена, фирма, адрес, телефон, факс, ЕПЧЕБКИ)

Представяван от: **Адем Османов Юсеинов - Управител**
(приете имена, длъжност)

Професионална дейност: ☐ Проектант ☐ Консултант А ☐ Консултант Б ☒ Строител ☐ Личе, упражняващо строителен надзор
Консултант А - консултант, извършващ оценка за съответствие на инвестиционните обекти ☐ Личе, упражняващо технически контрол
Консултант Б - консултант, извършващ строителен надзор

Застрахователно покритие: ☒ Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ ☐ Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект:
(само за Клауза Б)

(наименование и адрес)

Лимити на отговорност (в лева) Дейност 1: Строител Дейност 2: Дейност 3:

Лимит за едно събитие, в г.л.:	100 000		
лимит за имуществени вреди			
лимит за неимуществени вреди			
лимит за едно увредено лице			
Общ лимит на отговорност	200 000		

Самоучастие на застрахования: **НЯМА**

Срок на застраховката: 12 месеца от 00:00 часа на 2.6.2015 до 24:00 часа на 1.6.2016

Ретроактивна дата: без год

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00:00 часа на деня, следващ поставянето на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на застрахователя.

Застрахователна премия: 200 лева; 2% ЗДП: 4 лева; ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА: 204 лева
словом: Двеста и четири лева

Начин на плащане: ☒ еднократно ☐ разсрочено ☒ в брой ☐ по банков път

Вноска / Падж	I-ва/01-06-2015 г.	II-ра, 01-07-2015 г.	III-та, 01-08-2015 г.	IV-та, 01-09-2015 г.
Премия, лв:	200,00			
2% ЗДП в лв:	4,00			
Обща сума в лв:	204,00			

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полницата. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24:00 часа на петнадесетия ден от датата на паджа на неплатената разсрочена вноска.

Дата и място на издаване на полницата: 1.6.2015 год гр. Пловдив

Настоящата Полница, Въпросник-предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавъци и други придружаващи документи са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник: "Корект Консулт-Д" ООД. 26090269

(приете имена - ЕООД)

Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", запознах се с тях и заявявам, че ги приемам.

Застрахован:

(подпис и печат)

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

Застраховател:

(подпис и печат)



ЗАСТРАХОВАТЕЛНО
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
Армеец
www.armeec.bg

Застрахователно акционерно дружество "Армеец"
София 1000, ул. "Стефан Караджа" №2
ЕИК по Булстат: 121076907
Решение №7 / 15.06.1998 г. на НСЗ

КВИТАНЦИЯ №: 0001485153 / 01-06-2015 13:27
за платена сума по полица №:0000456131 / 01-06-2015
Сключена от: КОРЕКТ КОНСУЛТ - Д ООД (26090269) - Пловдив - 6/268 268
За застраховка: ОТГОВОРНОСТИ

Застраховано лице: Евросистем ЕООД
ЕГН/ЕИК по Булстат: 160086706
Данни за обекта: -
Начин на плащане: В брой на застрахователния посредник
Дата на плащане: 01-06-2015 13:27

Документ	Дата на падеж	Поредност на вноската	Застрахователна премия	2% ДЗП	Общо
Полица	01-06-2015	1	200.00 лв.	4.00 лв.	204.00 лв.
Общо			200.00 лв.	4.00 лв.	204.00 лв.

Словом: двеста и четири лева

За Застрахования:

(Подпис)

/"Евросистем" ЕООД/


За Застрахователя:

(Подпис и печат)

Агент/брокер: КОРЕКТ КОНСУЛТ - Д ООД Код: 26090269
Агенция: Пловдив - 6/268 Код: 268
Регистратор: СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

Документът е отпечатан на 01-06-2015 13:27

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 1 - TV 012795

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **ЕВРОСИСТЕМ ЕООД**
Седналище и адрес на управление: **4220 Кричим, ул. "Кирил и Методий" №44**
Представяващ: **Адем Османов Юсеинов**
ЕИК: **160086706**

В удостоверение на това, че с решение на комисията и протокол 0579/02.10.2013 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:
● **ПЪРВА ГРУПА** ● - строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● **СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ** ● (с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 1.4.4 и т. 1.5.6)

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № 1 - TV 03

Строител: **ЕВРОСИСТЕМ ЕООД**

ЕИК: **160086706**

НАСТОЯЩИЯ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ № 1 - TV 012795.

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА 30.09.2016

Председател на комисията:

• Сградн • 2015 •

Д-р инж. Георги Линков

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

(инж. Светослав ГЛОСОВ)

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ V - TV 008905

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **ЕВРОСИСТЕМ ЕООД**
Седналище и адрес на управление: **4220 Кричим, ул. "Кири и Методий" №44**
Представяващ: **Адем Османов Юсеинов**
ЕИК: **160086706**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0579/02.10.2013 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

• ПЕТА ГРУПА • – отдални видове СМР съгласно КИД - 2008, сектор "Строителство" с класове:

41.20 ; 42.11 ; 42.12 ; 42.13 ; 42.21 ; 42.22 ; 42.99 ; 43.11 ; 43.12 ; 43.21 ; 43.22 ; 43.29 ; 43.31 ;
43.32 ; 43.33 ; 43.34 ; 43.39 ; 43.91 ; 43.99 ; 80.20.



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАПОН № I - TV 03

Стойност: ЕВРОСИСТЕМ ЕООД

ЕИК: 160086706

НАСТОЯЩИЯ ТАПОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА
ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР
НА СТРОИТЕЛИТЕ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ I - TV 012795


ВАЛИДНОСТ НА ТАПОНА 30.09.2016

Председател на комисията:



София • 2015 •

Д-р инж. Георги Линков




ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

инж. Светослав Глобов

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

УЧАСТНИК: Адем Юсеинов-управител
/име, длъжност/

Образец №19

ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка

Долуподписаният Адем Османов Юсеинов, с лична карта № 641846516, издадена на 20.01.2011 г. от МВР-Пловдив, с ЕГН: 7907234602, в качеството ми на управител, на ф-ма „Евросистем“ ЕООД,

участник в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции


Обособена позиция № 23. Многофамилна жилищна сграда – блок № 45
вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Еленово”

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Напълно съм запознат с всички условия, обстоятелства необходими за изпълнение на обекта на горепосочената обществена поръчка, които биха повлияли при изготвянето на техническото и ценовото ми предложение.
2. Извършил съм посещение и оглед на обекта за изпълнение на ремонтно строително-монтажните работи, предмет на горепосочената обществена поръчка и съм запознат с всички условия и особености на строителната площадка.
3. Незапознаването с мястото и условията за изпълнение на поръчката е за наш риск при оценяването от комисията на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка

22.02.2016 г. г.
(дата на подписване)

Декларатор:





О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Образец № 20

ДЕКЛАРАЦИЯ

за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Долуподписаният Адем Османов Юсеинов, с лична карта № 641846516, издадена на 20.01.2011г. от МВР-Пловдив с ЕГН :7907234602 в качеството ми на **управител**, на ф-ма „Евросистем“ ЕООД

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

**Обособена позиция № 23. Многофамилна жилищна сграда – блок № 45
вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Еленово”**

ДЕКЛАРИРАМ:

Към момента на подаване на офертата няма други сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради с Възложителя.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

22.02.2016г. Г.

Декларатор: Адем Юсеинов



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №11

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции

Обособена позиция 23. Многофамилна жилищна сграда – блок № 45 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Еленово”

"ЕВРОСИСТЕМ" ЕООД
Наименование на участника

Адем Османов Юсеинов
(Грите имена на лицето, представляващо участника юридическо лице)

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:	
Седалище и адрес на управление: • Страна, код, град, община • Квартал, ул., №, • Телефон, факс, • E-mail:	България, 4220, гр.Кричим, общ.Кричим ул. "Кирил и Методий" № 44 тел. 0897 995 400, факс evrosistem@abv.bg

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като подробно се запознахме с условията на документацията за участие в обществената поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции**

Обособена позиция № 23. Многофамилна жилищна сграда – блок № 45 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Еленово”

Предлагаме:

гаранционен срок за СМР 10,06 години



Михаил Камбуров



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

1	2	3	4	5	6	7
№ по ред	Вид СМР по отделните части	% от обема СМР /%/	Минимален гаранц. срок по Наредба 2 /години/	Предложен от участника гаранц. срок /години/	Общ гаранц. срок	Среден гаранц. срок
1.	Конструкции	1	8	8	16	0,16
2.	Хидроизолации	6	5	5	10	0,60
3.	Топлоизолации	48	5	5	10	4,80
4.	Довършителни работи	42	5	5	10	4,20
5.	Ел. инсталации	3	5	5	10	0,30
6.						

Където:

- в колона 3 се записва тежестта на всяка от отделните части спрямо общата стойност на обекта в %
- в колона 6 се сумират колона 5 и колона 4
- в колона 7 се умножават колона 6 и колона 3
- общият среден гаранционен срок се получава като сума от средните гаранционни срокове по отделните части.

Указание: Участниците трябва да предложат гаранционни срокове за изпълнените строителни работи, които не могат да бъдат по-малки от предвидените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоразжения и строителни обекти.

Забележка: Участниците могат да предложат гаранционни срокове по – дълги от предвидените в горепосочената наредба, които да бъдат не повече от 2 /два/ пъти минималният гаранционен срок, предвиден в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г.

*В случай, че се констатира предложен под установения минимум или над максимум предложен срок по тези показатели, офертата на участника се предлага за отстраняване.

Срокът за изпълнение на поръчката е сбор от срока за изпълнение на строителството и срока за изготвяне на работен проект. Срокът за изпълнение на строителството за всяка обособена позиция по отделно не следва да бъде по-малък от 30 календарни дни и не по-дълъг от 45 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число.

Срокът за изготвяне на работен проект да бъде от 15 /петнадесет/ до не повече от 20 /двадесет / календарни дни . Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число.

Срок за изпълнение на строителството: 30 /тридесет/ календарни дни.



Адам Юсифов



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Указание: Срокът за изпълнение на строителството не следва да бъде по – малък от 30 календарни дни и не по – дълъг от 45 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число!

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за строителство извън горепосочените такива.

Срок за проектиране 15 /петнадесет/ календарни дни.

Забележка: Срокът за изготвяне на работен проект да бъде от 15 /петнадесет / до не повече от 20 /двадесет/ календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число!

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за проектиране /изготвяне на идеен проект/ извън горепосочените срокове.

Прилагам:

Подобен линеен график и диаграма на работната ръка, изготвени съобразно изискванията от документацията за участие.

Забележка: Във всяка от таблиците, в които участникът сам прави изброяването, той може да добавя толкова редове, колкото са му необходими.

ВАЖНО!!! Всяка страница от техническата оферта трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

ДАТА: 22.02.2016 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:





ЗАБЕЛЕЖКА:: Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик - ПЛИК №2 за всяка обособена позиция по отделно!



Участник, който представи програма, която не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата.



Адем Юсеинов

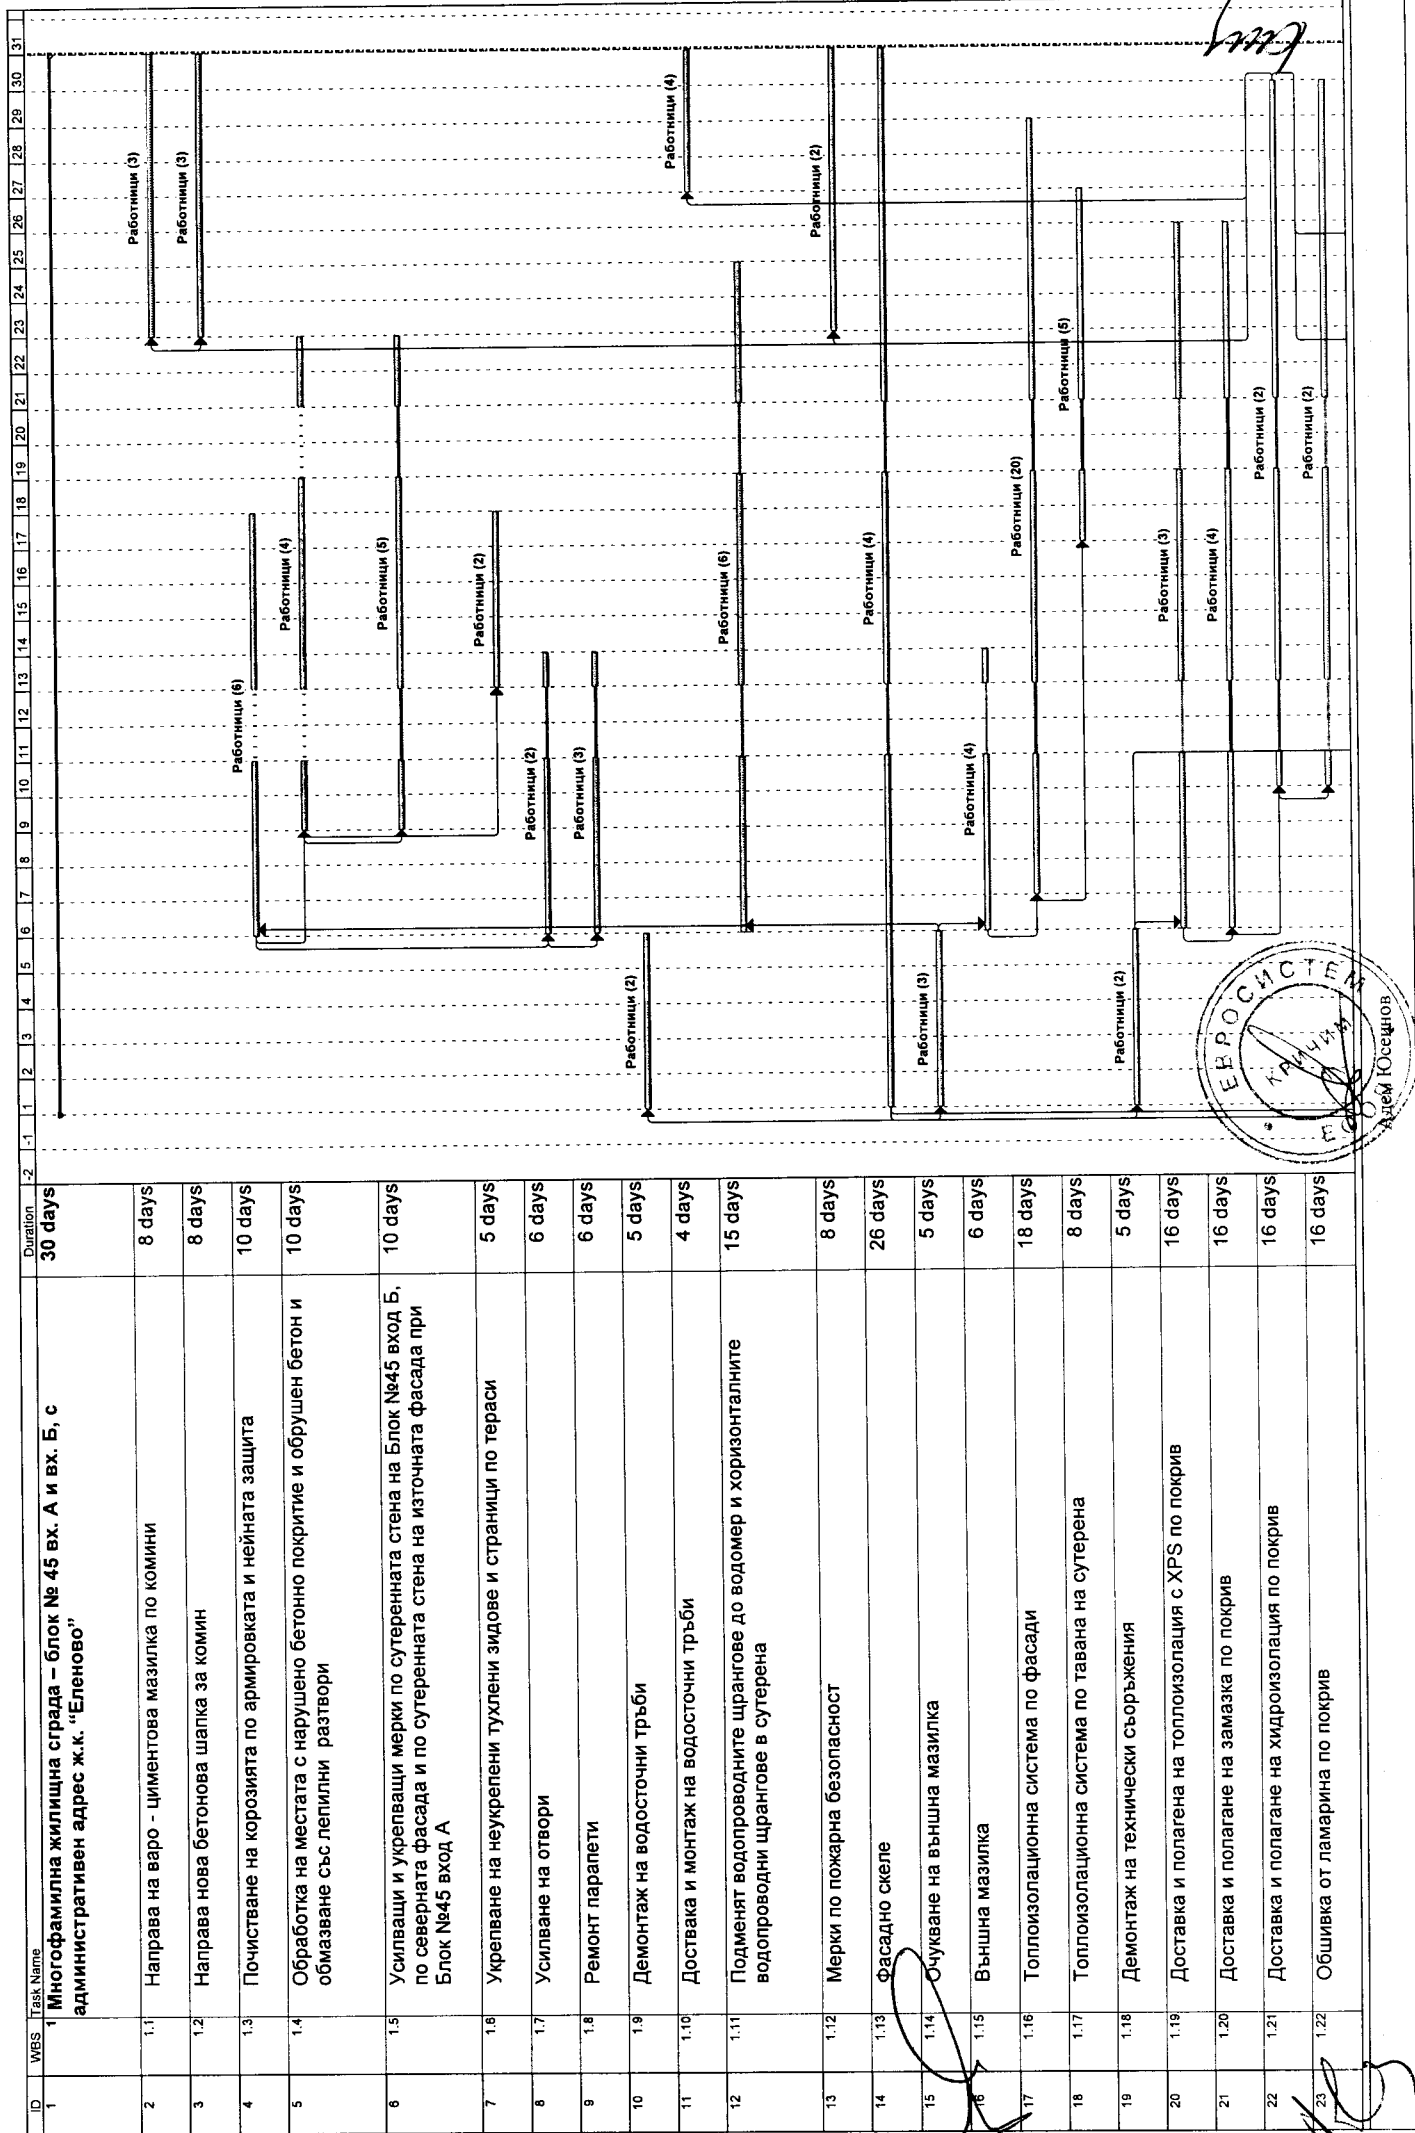

ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА

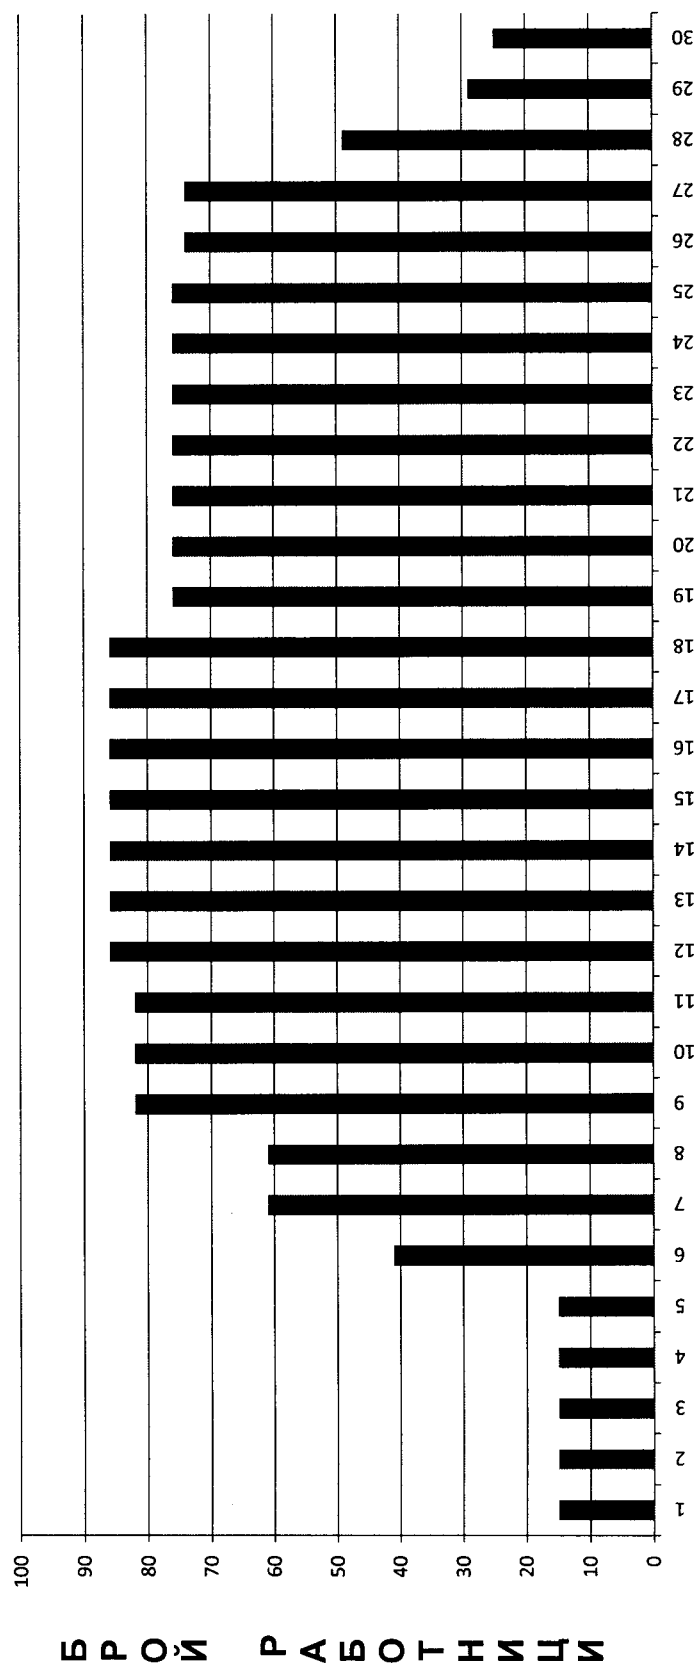

100

100

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

hmp

ОБЕКТ: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции

Обособена позиция № 23 Многофамилна жилищна сграда – блок № 45 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Еленово”

I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

I.I. Предмет:

ОБЕКТ на настоящата поръчка са многофамилни жилищни сгради, одобрени за обновяване в рамките на **Националната програма енергийна ефективност** на многофамилни жилищни сгради.

Предметът на обществената поръчка е: Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за многофамилна жилищна сграда – блок № 45 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Еленово”

I.II. Описание на дейностите

- **Разработване на работни проекти за нуждите на обновяването**

Изготвянето на работен проект за нуждите на обновяването се възлага на екип от правоспособни проектанти.

Работни проекти за нуждите на обновяването ще бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба №4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите ще бъдат придружени с подробни количествени сметки по приложимите части, както и с опис на видовете и количествата СМР, които спадат към всеки обобщен вид СМР, съгласно препоръките за задължителните СМР в техническите паспорти и енергийните обследвания за обектите.

Работният проект ще бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на Общината.


В обяснителните записки проектантите подробно ще се опишат необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение, и количествени сметки.

При изготвяне на проектна документация, екипът за разработване на инвестиционен проект трябва ще ползва предписанията за обновяване, дадени в изготвените за съответната сграда техническо и енергийно обследване.

- **Изпълнение на СМР**

Изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност се извършва в съответствие с част трета "Строителство" от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен обект.

Адем Юсеинов



Разрешение за строеж се издава от общинската администрация и при представяне на техническа документация с оценено съответствие. Докладът за оценка на съответствието ще бъде изготвен от оторизиран изпълнител и е предмет на допълнително възлагане от страна на Възложителя.

Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта се определят от изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ и от указанията на Възложителя, предоставени в настоящата документация.

Строителят (физическо или юридическо лице, притежаващо съответната компетентност) изпълнява СМР за обновяване за енергийна ефективност за всеки обект в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора и изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.

По време на изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност лицензиран консултант строителен надзор (чл. 166 от ЗУТ) въз основа на сключен договор за всеки обект упражнява строителен надзор в обхвата на договора и съобразно изискванията на чл. 168 от ЗУТ.

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР изпълнителят, посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на отделни части на работния проект, се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на СМР за обновяване за енергийна ефективност, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа.

- Осъществяване на авторски надзор

Изпълнителят ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба, посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават необходимата квалификация.

Авторският надзор ще бъде упражняван след писмена покана от Възложителя във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, относно:

- Присъствие при съставяне и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и др.;
- Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в строителството;
- Изработване и съгласуване на промени в проектната документация, при необходимост, по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор и др.;
- Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите.

II. РАБОТНА ПРОГРАМА

Подходът, който възнамеряваме да приложим при изпълнение на поръчката е подробно описан в съответната последователност, етапност, обвързаност и е отразен с неговите задачи и под – задачи.

Отделните етапи на изпълнение на обособената позиция представляват жизнения цикъл на управление на договора и съставят и обуславят интегрираният начин на управление на Договора, както и отразяват стратегията, условията, методите, похватите и организацията на работата по реализиране предмета на поръчката.

ЕТАПИ на изпълнение на поръчката:

- ✓ Инициране,
- ✓ Планиране, в т.ч. Проектиране
- ✓ Изпълнение,
- ✓ Контролиране и авторски надзор
- ✓ Управление,
- ✓ Приключване.

ЕТАП НА ИНИЦИИРАНЕ: Този ЕТАП, се състои от процеси за оторизиране на договора и включват:

Издава се известие/ уведомително писмо за изпълнение на договора, с което официално се дава старт на изпълнението на Договора и в него се указват съответните правомощия на съответните лица, както от страна на изпълнителя на настоящия договор, така и от страна на изпълнителите по други договори и съответно от страна на Възложителя. При липса на известие, то с подписването на договора започва изпълнението, но Възложителя е длъжен официално да укаже съответните правомощия на съответните лица, както от страна на изпълнителя на настоящия договор, така и от страна на изпълнителите по други договори и съответно от страна на Възложителя и Бенефициентите

Предоставяне на наличните документи, така и друга налична документация и информация, за която Възложителя е сметнал, че е необходима

ЕТАП НА ПЛАНИРАНЕ, В Т.Ч. ПРОЕКТИРАНЕ: Този ЕТАП, се състои от процеси за определяне на всички Задачи и ресурси за изпълнение на Договора, които процеси се наименоуват като Задачи и имат най-голямо значение за успешното управление на Договора/Договора.

В настоящата Задача влизат Задачи и задължения на Изпълнителя описани в техническите спецификации. С изпълнение на тази Задача и горе описаните Задачи и задължения от техническите спецификации, ще бъдат поставени основите за постигане, но не само, а и за изпълнение на част или напълно доколкото е приложимо на Специфичните цели идентифицирани.

Изработване на инвестиционен проект във фаза работен проект, съгласно техническите спецификации към документацията за възлагане на обществена поръчка и съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, както следва:

- Част Архитектурна
- Част Конструктивна/конструктивно становище
- Част Водоснабдяване и Канализация

Адем Юсеинов



- Част Електро
- Част Енергийна ефективност
- Част Пожарна Безопасност
- Част ПБЗ /План безопасност и здраве/
- Проект за организация и изпълнение на строителството
- План за управление на строителните отпадъци
- Част Проектно – Сметна документация

Изпълнителя мобилизира и обезпечават офиса, площадката и обекта за работа

Изпълнителя извършва предварителен Преглед и анализ на съществуващата информация, която е предоставена след подписването на договора, както и текущото състояние на площадките/трасетата за да изпълни в съответното качество, обхват и обем съответните

ЗАДАЧИ

В ОБХВАТА НА ТАЗИ ЗАДАЧА, ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ПОДРОБНИ ПРЕГЛЕДИ И АНАЛИЗИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, ЩЕ СЕ ОТРАЗЯТ СЪОТВЕТНИТЕ КОМЕНТАРИ, СТАНОВИЩА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ/ПРЕПОРЪКИ, КАКТО, ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ И ПРОВЕРКА ЗА ОКОМПЛЕКТОВАНOST НА СЪОТВЕТНИТЕ ДОКУМЕНТИ, ИНВЕСТИЦИОННИ ДОГОВОРИ ЗА НАЛИЧИЕТО НА ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ СЪГЛАСУВАТЕЛНИ СТАНОВИЩА ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ДАВАНЕ НА ПРЕПОРЪКИ, В СЛУЧАЙ НА ПРОПУСКИ, АДРЕСИРАНИ ДО ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ЩЕ ОБХВАНЕ СЛЕДНИТЕ ПОД-ЗАДАЧИ:

ЕТАП НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: В настоящия етап влизат част от следните Задачи и задължения на Изпълнителя описани в техническите спецификации. С изпълнение на този етап и горе описаните Задачи и задължения от техническите спецификации, ще бъдат поставени основите за постигане, но не само, а и за изпълнение на част или напълно доколкото е приложимо на Специфичните цели.

Законосъобразно, качествено и срочно започване, изпълнение и завършване на строителството, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството в съответствие с техническите спецификации и инвестиционните проекти, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, всички други действащи нормативни документи.

Подготвителни работи - временно строителство

- Подготовка на строителството и временно строителство
- Подготовка на строителната площадка
- Мобилизация на механизация и изграждане на обектов офис
- Изготвяне и съгласуване на временна организация на движението

Основно строителство


- Демонтажни работи;
- Строително-монтажни работи по части: конструктивна и архитектура, в т.ч. и покрив;
- Инсталации Електро;

Изготвяне на ексекутивна документация и кадастрални заснемания на целия обект съгласно чл. 52 от Закона за кадастъра и имотния регистър;

Въвеждане на обекта в експлоатация след получаване на Разрешение за ползване;

ПРЕДОСТАВЯНЕ, СЪГЛАСУВАНЕ/ПРИЕМАНЕ И РЕВИЗИРАНЕ НА ЗАДАЧАТА

Дейностите и действията по настоящия етап, съответстват и са идентични с описаното в горните етапи



ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА ЗАДАЧАТА (изготвя се от Изпълнителя)

Дейностите и действията по настоящия етап, съответстват и са идентични с описаното в горните етапи

ЕТАП КОНТРОЛИРАНЕ И АВТОРСКИ НАДЗОР: Процеси за следене и измерване на изпълнението спрямо плана (изходната рамка). Всички отклонения се измерват, за да се установи дали са значителни (излизащи извън допустимите граници, заложиени в плана) и налагат промени, което изисква съгласуване и одобряване на актуализирани планове за обхвата, ресурсите или времето. Контролирането на работата по Договора включва и вземането на превантивни мерки за предотвратяване на проблеми, преди те да се проявили негативно върху целите на Договора, както и предприемане на коригиращи мерки за решаване на възникнали проблеми или противоречия между участниците в Договора.

ЕТАП НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДОГОВОРА: Изпълнението на предмета на поръчката се разделя на ЕТАПИ и Задачи и под-Задачи, за да се осигури по-добър контрол върху работата. Всяка Задача завършва с доставянето на определен резултат, който подлежи на преглед и одобряване. Краят на всеки ЕТАП и Задача бележи важна контролна точка по отношение на потвърждаване на технически и финансови потребности на Възложителя, за удовлетворяване, на които е предприет конкретният Договор. ЕТАПИТЕ на Договора описват неговият жизнен цикъл от инициирането до неговото приключване и които ЕТАПИ съставят интегрираният вид на управление. Всяка група процеси за управление на Договора се състои от един или повече управленски процеси.

ЕТАП НА ПРИКЛЮЧВАНЕ: Процеси за одобряване и приемане на резултатите от Договора.

Описание на проектанската задача


Технология на проектиране и технологични изисквания и последователност на проектирането

ИЗХОДНИ ДАННИ И ДОКУМЕНТИ. ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

А. Изходните данни и документите, необходими за изработването и одобряването на проекта, са:

1. скица (виза) за проектиране по чл. 140 ЗУТ;
2. данни за специфичните условия на строителството, конструктивно обследване, обследване за енергийна ефективност, становища за констукцията и др.;
3. становища и данни от съответните експлоатационни дружества за свързване на вътрешните мрежи и инсталациите на обекта с мрежите на техническата инфраструктура за:
 - а) източника за водоснабдяване и изясняване на основните и спомагателните инсталации, мястото за заустване на отпадъчните води с посочване на категорията на водоприемника и др.;
 - б) източника за електроснабдяване;
 - в) източника за топлоснабдяване;
 - г) местоположението на пътната връзка на обекта към съответния път от републиканската или общинската пътна мрежа;
 - д) връзките с други мрежи на техническата инфраструктура, когато това се налага от спецификата на обекта;
4. геодезическата, картната, плановата и кадастралната основа, в т.ч. геодезически мрежи, респ. изходни точки и репери, които са необходими за проектирането и строителството;

Адем Юсейнов



5. опорния план на недвижимите паметници на културата и извадка от археологически кадастър (специализирана карта), когато съществува такъв;

6. предварителните (прединвестиционните) и/или обемно-устройствените проучвания за обекта, когато такива са разработени;

7. други изходни данни и документи, които се изискват с нормативен или административен акт.

Б. Изходните данни и документи се прилагат към заданието за проектиране.

Процесът на изготвяне на техническата документация ще се предшества от осигуряване на скица и виза за проектиране, ако е приложимо. Тези документи ще се осигуряват от Възложителя.

При изготвяне на проектна документация, екипът за разработване на инвестиционен проект ще ползва предписанията за обновяване, дадени в изготвените за сградата техническо и енергийно обследване.

Със заданието за проектиране се определят:

1. изискванията към обекта;
2. фазите на проектиране;
3. необходимите проектни части.

Заданието за проектиране включва:

1. основни технически, икономически, технологични, функционални и планово-композиционни изисквания към обекта;
2. основни функционални и композиционни параметри на обекта.

Основните технически, икономически, технологични, функционални и планово-композиционни изисквания към обекта могат да бъдат:

1. за целесъобразно и ефективно оразмеряване на застроените площи и обеми;
2. за осигуряване на единство и хармония между функционалното, технологичното и композиционното решение и с околната среда;
3. за използване на високоефективни материали, оборудване и технологии за осигуряване на качествено изпълнение на обекта;
4. за осигуряване съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 ЗУТ;
5. към благоустройството и паркоустройството на прилежащия терен;
6. към технологията и технологичното оборудване;
7. към показателите за икономическа ефективност, които трябва да бъдат постигнати;
8. за последователността на изработване на проектите за подобектите - при строителство на комплексни обекти;
9. други изисквания на инвеститора.

Като основни функционални и композиционни параметри за обекта могат да бъдат зададени необходимите:

1. вид, характер, специфика на обекта и свързаните с него основни, спомагателни и обслужващи подобекти;
2. функционални и/или технологични връзки между отделните обекти и подобекти;
3. площи на отделните обекти и подобекти;
4. застроени обеми за обекта и по отделни подобекти;
5. общ капацитет и/или необходим брой на обслужващия персонал - общо и по подобекти.

Адем Юсеинов



1117

Когато към заданието за проектиране са приложени предварителни проучвания, текстовата му част може да бъде съкратена с препращане към резултатите от проучванията.

Заданието за проектиране за първоначалната фаза служи за задание и на всяка следваща фаза заедно с проекта от предходната фаза.

РАБОТЕН ПРОЕКТ

Работните проекти за нуждите на обновяването ще бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба №4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите ще да бъдат придружени с подробни количествени сметки по приложимите части.

Работният проект се съгласува надлежно с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи и се одобрява от главния архитект на Общината.

В обяснителните записки проектантите подробно ще опишат необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение, количествени сметки. Работните проекти се изработват в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

С работния проект:

- се изясняват конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР и за доставка и монтаж на технологичното оборудване и обзавеждането на обекта;
- се осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 ЗУТ.

Работният проект се изготвя в съответствие със скицата (визата) за проектиране и заданието за проектиране.

Работният проект подлежи на съгласуване и на одобряване.


С работния проект се изработват проектни решения, които осигуряват:

1. съответствието с изискванията към строежите по чл. 169 ЗУТ;
2. ползването на работния инвестиционен проект като документация за договаряне на строителството и/или за доставка на оборудване, строителни материали и изделия;
3. започването и изпълнението на строителството до завършването на обекта.

Работният инвестиционен проект ще е с обхват и съдържание съгласно нормативните изисквания на Наредба №4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, а така също и специфичните изисквания на проекта.

В обхвата на работния проект ще се включват следните части:

- Част Архитектурна
- Част Конструктивна/конструктивно становище -с/с статистически изчисления и технически контрол по чл.139 от ЗУТ
- Част Водоснабдяване и Канализация
- Част Електро
- Част Енергийна ефективност



- 
- Част Пожарна Безопасност
 - Част ПБЗ /План безопаност и здраве/
 - Проект за организация и изпълнение на строителството
 - План за управление на строителните отпадъци
 - Част ПРОЕКТНО – СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Всяка проектна част на работния проект съдържа:

1. чертежи, по които може да се изпълняват СМР в следните препоръчителни мащаби:

- а) ситуационно решение - в М 1:500 или М 1:1000;
- б) разпределения, разрези - в М 1:50 или М 1:100;
- в) други чертежи - в подходящ мащаб, в зависимост от вида и спецификата на обекта;

2. обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения, към която се прилагат издадените във връзка с проектирането документи и изходните данни;

3. изчисления, обосноваващи проектните решения.

Количествена сметка се прилагат към изчисленията или се обособяват в част сметна документация, когато се изискват със заданието за проектиране.

Отделни части на работния проект могат да включват и макети, модели, фотомонтажи, компютърна анимация и др.

За времетраене за одобрение на работния инвестиционен проект ще се предърждаме тясно към съществуващата наредба и закони който действат в момента в Р. България.

Оценката за съответствие на работните проекти по всички части със съществените изисквания към строежите ще се осъществи съгласно чл. 142 от ЗУТ

Изпълнителят ще представи работен инвестиционен проект за енергийно обновяване в следния обхват по конкретно:

Част Архитектурна;

- Обяснителна записка - подробно да описва предлаганите проектни решения, във връзка и в съответствие изходните данни и да съдържа информация за необходимите строителни продукти с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти (материали, изделия, комплекти) за изпълнение на СМР и начина на тяхната обработка, полагане и/или монтаж;
- Разпределения- типов етаж/етажи;
- Характерни вертикални разрези на сградата;
- Фасади - графично и цветово решение за оформяне фасадите на обекта след изпълнение на предвидената допълнителна фасадна топлоизолация. Цветовото решение да бъде обвързано с цветовата гама на материалите, използвани за финално покритие. Графичното представяне на фасадите трябва да указва ясно всички интервенции, които ще бъдат изпълнени по обвивката на сградата вкл. дограмата по самостоятелни обекти и общи части, предвидена за подмяна и да дава решение за интегриране на вече изпълнени по обекта ЕСМ;
- Архитектурно-строителни детайли в подходящ мащаб, изясняващи изпълнението на отделни СМР, в т.ч. топлоизолационна система по елементи на сградата, стълбищна клетка и входно пространство, остъкляване/затваряне на балкони, външна дограма (прозорци и врати) и др. свързани със спецификата на конкретния обект на обновяване, разположение на

1227
климатизаторите (съобразено и с начина на отвеждане на конденза), сателитните антени, решетки, сенници, предпазни парапети и привеждането им към нормативите;

- Решение за фасадната дограма на обекта, отразено в подробна спецификация на дограмата;

Част Конструктивна /конструктивно становище

- Обяснителна записка съдържа подробна информация относно предвидените в работния проект СМР и тяхното влияние върху конструкцията на сградата във връзка с допълнителното натоварване и сеизмичната осигуреност на сградата. Към записката се прилага спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част конструктивна (ако е приложимо) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти;

- Детайли, които се отнасят към конструктивните/носещи елементи на сградата - остъкляване/затваряне балкони и лоджии, парапети и др. - които са приложими; Детайлите се изработват с подробност и конкретност, които следва да осигурят изпълнението на СМР;

- Проектът трябва да доказва носещата и сеизмичната осигуреност на сградата.

При липса на конкретно описани мерки по конструктивно укрепване /усилване/ в доклада от конструктивното обследване при установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на строежа, следва да се състави конструктивно становище относно общото състояние на сградата по отношение на нейната носимоспособност, устойчивост и сеизмична осигуреност.

Част Електро

- Обяснителна записка - описание на възприетите технически решения и спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част електро с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти;

- Графична част, вкл. детайли за изпълнение

Проектът трябва да осигурява привеждане на общата сградна електроинсталация в съответствие с действащите норми.

Част ВиК

- Обяснителна записка - описание на възприетите технически решения и спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част ВиК с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти;

- Графична част, вкл. детайли за изпълнение

Проектът трябва да осигурява привеждане на общата ВиК инсталация в съответствие с действащите норми.

Част Енергийна ефективност

- Обяснителна записка;

- Технически изчисления;

- Графична част - технически чертежи на архитектурно-строителни детайли и елементи с описание към всеки детайл на геометричните, топлофизичните и оптичните характеристики на продуктите, приложения технически спецификации и характеристики на вложените в строежа строителни и енергоефективни продукти.

Проектът трябва да осигурява привеждане на сградата в съответствие с действащите норми по отношение на енергийната ефективност.

Част ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ- с обхват и съдържание, определени съгласно Наредба №18-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и съобразно категорията на сградата

- Обяснителна записка;

- Графична част



Проектът трябва да осигурява привеждане на сградата за предотвратяване на пожарна опасност в съответствие с действащите норми.

Част ПБЗ /План за безопасност и здраве/- с обхват и съдържание, определени съгласно Наредба №2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

- Обяснителна записка;
- Графична част.

Част ПУСО/План за управление на строителни отпадъци/ - с обхват и съдържание, съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г.

Част ПРОЕКТНО - СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ- по всички части на проектната документация, в т.ч. количествена сметки за видовете СМР.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КРАЙНИТЕ ПРОДУКТИ

Дейности по изпълнението на строително-монтажните работи

При изпълнение на СМР се спазват изисквания на договора и описаните в Техническата спецификация. Техническата спецификация е неразделна част от тръжната документация / ТД / заедно с разпоредбите на договора, на подробни проектни чертежи и други документи, включени в договора. Спецификацията уточнява и доразвива изискванията за изпълнение на строителните работи по договора. В тази част на записката само ще допълним условията на изпълнение на база на нашия опит.

Предвиждаме да изпълним всички работи и дейности в съответствие с действащите закони и подзаконови нормативни актове, изискванията на Възложителя, посочени в ТС, договора или друг документ, проектните решения, заложи в одобрените инвестиционните проекти, както и добрите строителни практики.

Предложение за изпълнение на СМР

- Подмяна на дограма - дървената двукатна и единична дограма ще се подмени с подходяща, в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енерго-спестяващи мерки. Подмяната на фасадната дограма ще бъде извършена съвместно с полагането на топло изолационната система, с цел икономия на ресурси. При подмяната на фасадната дограма ще се монтират подпрозоречни поли- алуминиеви, от поцинкована ламарина, плочки или по друг подходящ начин и с подходящ материал. Подпрозоречните поли ще се монтират и при вече подменената фасадна дограма, при която все още няма такива. При изработката им ще се взема мярка от място. Съществуващите дървени врати на сутеренното ниво ще се подменят с подходящи. Съществуващата PVC дограма, която е на монтажна пана, с неизмазани fugи между каса на дограма и зид ще се измаже с разтвор качествено.

- Ще изпълни топлоизолация по ограждащите конструкции(фасадни елементи и покрив) с материали и параметри, в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енерго- спестяващи мерки. Преди монтажа на топло изолационната система по фасадите, компрометираните мазилки ще се очукат и свалят до основа, а след това възстановят след шприцоване на основата с циментов разтвор или други подходящи материали(за осигуряване на здрава и равна основа за топло изолационните плоскости. Ще се предвиди разделянето на топлоизолацията с негорими ивици

- Ще се измажат комините с варо - циментова мазилка и ще се направи нова бетонова шапка.

- Ще се подмени обшивката от ламарина по покрива с нова.

Адем Юсеинов

127

- Ще се вземат мерки за парапетите да отговарят на изискванията на чл.89 от Наредба №7.

- Полагане на хидроизолация на 100% от покрива и монтаж на нова обшивка от поцинкована ламарина по бордове.

- Укрепване на комини и възстановяване на бетонови шапки.

- Почистване на корозията по армировката и нейната защита.

- Обработка на местата с нарушено бетонно покритие и обрушен бетон и обмазване със лепилни разтвори по проектно решение. Пукнатините ще се запълват с готов разтвор за пукнатини.

- По сутеренната стена на Блок №45 вход Б, по северната фасада, ще се предприемат усилващи и укрепващи мерки. Вертикални пукнатини по сутеренната стена на източната фасада при Блок №45 вход А, също ще да се предприемат усилващи и укрепващи мерки ;

- Укрепване на неукрепени тухлени зидове и страници по тераси.

- Усилване на отвори на местата, където се налага.

- Подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи или LED осветители с датчик за движение в общите помещения;

- Монтиране на мълниезащита на сградата;

- Подмяна на кабелите за осветлението в общите помещения;

- Ще се монтират нови водосточни тръби.

- Ще се подменят водопроводните щрангове до водомер и хоризонталните водопроводни щрангове в сутерена

- Мерки по пожарна безопасност

Тук следва да поясним, че сме обхванали основните видове СМР, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, както и всички други дейности, необходими за постигане целите на договора и предвидени в техническите спецификации и договора.

ПОКРИВНИ РАБОТИ

Основната цел на покривната конструкция е да предпази сградата от атмосферните влияния като вятър, сняг, дъжд както и да удържа собствената си тежест.

Предвижда се пълна подмяна на хидроизолацията, включително полагане на топлоизолация, полагане на замазка за наклон, полагане на два слоя битумна хидроизолация /втори слой с посипка/. Нова обшивка по бордовете и покрай комините от ламарина с винилово покритие. Подмяна на водосточните тръби.

Покривните работи ще се извършват от високо квалифицирани работници под ръководството на техническия ръководител с цел осигуряване на ЗБУТ. Повдигането на тежки строителни материали на покрива ще се извършва механизирано, като за приемане и временно складиране ще се подготвят удобни площадки.

Ремонтът на покрива ще се изпълнява при съгласувани с проектанта и утвърдени от независимия строителен надзор (НСН) видове строителни работи и материали.


Първо се извършват демонтажните работи, при съблюдаване на всички условия за безопасност.

След извършване на демонтажните работи започва изграждане и възстановяване на покривната конструкция.

Подготовка

Хидроизолационните мембрани се произвеждат от висококачествени битумни материали, модифицирани с атактен полипропилен (АПП) или със Стирол-Бутадиен-Стирол (СБС).

Подходящи са както за плоски, така и за скатни или мансардни покриви. Хидроизолационните мембрани се използват и при изпълнение на хидроизолация върху вертикални стени, подземни резервоари и фундаменти.



Има три основни начина за полагане на Хидроизолационните мембрани към основата:

Начина на полагане зависи от различни фактори, като ветрово натоварване, премествания в покривната конструкция, наклони, наличие на влага и други. Правилното полагане на битумните мембрани е от съществено значение за ефективността на хидроизолацията.

Ръководството за монтаж е разработено, за да улесни при проектирането и изпълнението на хидроизолации. В него са посочени основните предпоставки и изисквания при работа с битумните мембрани.

1. Хидроизолационните мембрани се полагат по газопламъчен способ с газова горелка, при което е необходимо следното оборудване – газова горелка, шпакла, нож, защитни ръкавици и каска, четка и грунд.

2. Основата да е гладка и равна с препоръчителен минимален наклон 2%. Преди полагане трябва да се почисти от прах, маслени остатъци, листа и др.

3. При стара изолация, в състояние, позволяващо покриване с Хидроизолационните мембрани, да се отстранят всички налични мехури и гънки. Мехурът се разцепва, подсушава се и се залепва към повърхността.

4. Повърхността се грундира с битумен грунд при разход около 0.300 кг/м². Влажността на основата в момента на полагане на Хидроизолационните мембрани не трябва да е по-голяма от 5 %.

5. Грундирането подобрява адхезията на Хидроизолационните мембрани с основата. Преди полагане на Хидроизолационните мембрани трябва да се монтират всички водоприемници, отдушници, улуци и др.

6. Полагането на Хидроизолационните мембрани започва от ниската към високата част, като не се допуска застъпването да става срещу наклона на покрива.

7. Рулото се развива по цялата дължина и се подравняват страничните и челни застъпвания.

8. Рулото се навива от двата края и се залепва газопламъчно от средата към краищата.

9. През ред се започва с половин руло, за да не съвпадат челните застъпвания в една линия. При изпълнение на хидроизолация от два пласта, вторият се отмества спрямо първия на 50 см.

10. Равномерно се нагряват мембраната, ивицата на застъпване и грундираната повърхност. Застъпванията трябва да са: странични - 10 см; челни - 15 см. В зоните на застъпване да се получи битумен разлив от 0.5 - 1 см.

11. Хидроизолационните мембрани се нагряват докато битумът "протече" 1.5 - 2 см пред навитата ролка, след което рулото се развива и се притиска към повърхността. По време на полагането непрекъснато да се поддържа "протичането" от 1.5 - 2 см.

12. В зоните на бордове, улами и била се полага допълнителен, усилващ пласт Хидроизолационна мембрана.



Адем Юсеинов

13. При сгради с повишена влажност на въздуха, както и при ремонт на стари покриви, е необходимо да се направи пародренажна система, за да се отведе акумулираната влага.

14. След приключване на полагането повърхността да се огледа за незалепени участъци и при наличие на такива да се отстранят с газова горелка или нагрятата шпакла.

15. Странично оформяне на изолацията при покриви без страничен борд.

16. Външните ъгли се оформят от две парчета Хидроизолационна мембрана, изрязани, както е показано на схемата.

17. Вътрешните ъгли се оформят от три парчета Хидроизолационна мембрана, изрязани, както е показано на схемата.

18. При водоприемниците, в радиус от 1 - 1.5 м, мембраната да бъде залепена цялостно към повърхността.

19. При отдушниците се полага допълнително парче Хидроизолационна мембрана с размери 0.50 x 0.50 м.

20. При оформяне на дилатационни фуги, освен усилване да се предвиди и компенсатор (детайл "а").

21. Оформяне на дилатационна фуга (детайл "Б")

22. При висок борд хидроизолацията се изпълнява до височина минимум 15 см, като в горния край се закрепва механично и се покрива с ламаринена обшивка.

23. При нисък борд хидроизолацията се продължава и по хоризонталната част, след което се монтират обшивките.

24. При зенитно осветление се прави усилване, както е показано на схемата.

25. Конструкция на студен покрив

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СГРАДАТА

Предвижда се топлоизолиране на външните фасадни стени чрез доставка и монтаж на Интегрирана топлоизолационна система /ИТИС/ с характеристика съгласно изискванията; монтаж на вертикални конструктивни елементи за монтаж на външните тела на климатиките и сателитните чинии с цел осигуряване на подредба.

Монтаж на външно фасадно скеле

За извършването на строително – монтажните работи по фасада се предвижда монтаж на скеле. Същото се отличава преди всичко със своята простота и икономичност, за сметка на свеждане на теглото до минимум, като най-важното е - без загуба на устойчивост да се постигне безопасност и товароносимост.

Предвижда се монтажът на скелето да се извърши от опитни работници, ползващи предпазни колани, обувки с неплъзгащи се подметки, под непосредствен контрол.

Монтажа на скелето ще се изпълни при следната последователност на работа:

- ✓ подготовка на основата, определяне на местата за стабилно стъпване, разнасяне на елементите;
- ✓ монтаж на елементите на скелето, като същото се укрепва към сградата съгласно указанията на производителя;

Адем Юсеинов



- 127
- ✓ монтаж на парапетите, стълбите, бордовите елементи и защитната мрежа;
 - ✓ приемане на скелето с отделен протокол и разрешаване работа от него;
- Конструкцията, към която се закрепва скелето, както и връзката на закрепване ще се оразмери да понесе анкерните усилия.

Предвижда се скелето да послужи за разполагане на изпълнителите и основните и спомагателни материали за всички работи по фасадите.

Демонтаж на скеле

Демонтажът на скелето се предвижда да започне в технологичен ред, след като са завършени и приети изцяло всички довършителни видове работи по всяка от фасадите на сградите.

Същият ще се извърши от опитни работници, ползващи предпазни колани, обувки и не плъзгащи се подметки, под непосредствения контрол на Главния инженер на обекта и при стриктно опазване на извършените работи.

При спускането на демонтираните елементи от скелето, ще се ограничи движението на изпълнителен персонал и контролни специалисти от страна на Възложителя и Строителния надзор в зоната на фасадата, на която се извършва демонтаж на скеле.

Преместването на неговите елементи във вертикала, в посока спускане да се извършва по правило с товароподемни приспособления (скрипци, полиспасти и други). Няма да се допусне, и по същество изцяло се забранява хвърлянето на елементите от скелето.

По време на демонтажа на скелето всички врати и прозорци на първия етаж, както и прозорци на етажи в границите на разглобявания участък да са затворени.

Изкачването и слизането на хора по скелето, се допуска само по монтираните стационарни стълби.

Външна топлоизолация

Предвид заложените в проекта обеми, тази част от строително-монтажните работи е ключова за качествено и навременно изпълнение.

Направа на външна топлоизолация по стени:

При изпълнението на фасадните топлоизолационни системи най-уязвимите места са около отворите на прозорците и вратите, както и при цокъла на сградата. Проблемни места за изпълнение на топлоизолационната система са също краищата на плоските покриви, както и около връзката между тухления зид и покривната конструкция. Особено важно е в тези зони да се изпълняват предписанията на производителите на топлоизолационните системи. Общото при всички специфични решения е необходимостта от добро и дълготрайно уплътняване между тънкослойната мазилка и шпакловката под нея и рамките на прозорците и вратите или дъсчената обшивка на покрива. Материалите имат различни коефициенти на термично линейно разширение, поради което уплътнението трябва да се направи с еластични материали, които да поемат движенията, породени от тези различия.

Технологични стъпки за качествено изпълнение:


1. Подготовка на основата:

Преди започване на работа се проверява състоянието на основата - равнинността и якостта. Остатъчни материали като нестабилна и стара мазилка се отстраняват. Така се получава по-добро сцепление на лепилото с основата.

2. Лепене на външна топлоизолация

След важния избор на изолационния материал и добре подготвена основа следва лепенето на топлоизолационните плочи. При отклонение по хоризонтала и вертикала по-

Адем Юсеинов



malco от 2cm листoвете се мажат на „рамково-точкова схема“ - материалът се нанася по краищата на листа и се прибавят три „топки“ във вътрешността на листа. При неравни основи се налага топлоизолационните плочи да се мажат на „точкова схема“. Първия ред листове задължително се нивелира. Топлоизолационните плочи се редят по схема "тухлена зидария" като се разминават "шахматно", както по фасадата, така и по външните ръбове на фасадите. Листовете задължително се редят плътно един до друг като наличието на малки цепки и фуги получили се по време на работа се запълват с ивици топлоизолационен материал. Разстоянието горе и странично към прозорците се лепи с 3cm топлоизолационен материал, за да се скрие цепката от строителна пяна(ако има такава) и за да не се получават температурни разлики в областта стена-прозорец!

3. Дюбелиране на топлоизолация:

При работата по алпийски способ дюбелирането може да стане венага, поради спецификата на работата с алпинисти. При работата от скеле дюбелирането е след изсъхването на лепилната смес (поради разликата в технологиите на работа). Един от най-важните процеси е дюбелирането. Водещите фирми производители на продукти за топлоизолация гарантират за дълготрайност и здравина на системата при 6-8 правилно поставени дюбела за квадратен метър по определената за това схема. При дюбелиране на стиропор, неопор, фибран и други еднородни продукти се използва схема "Т-дюбелиране". За топлоизолация с каменна вата се използва схема "W-дюбелиране".

4. Водооткапващ завършващ ъгъл на системата за топлоизолация:

Съгласно техническия проект се монтират водооткапващи ланси в долната част на топлоизолацията, в горното обръщане на прозореца, на ъгъла получен между стена и таван, както и навсякъде където може да се получи "подлизване" на дъждовна вода. Водооткапващите ланси предотвратяват последващо нарушаване цялостта на топлоизолацията като откапват дъждовната вода.

5. Монтаж на ръбохранители PVC ъгли с мрежа за топлоизолация:

Ръбовете на сградата трябва да бъдат защитени от наранявания. Най-походящи за целта са PVC ъглите с фабрично залепена стъклотекстилна мрежа. Ръбохранителите се монтират и за да се получи изправяне на всички хоризонтални и вертикални ъгли на сградата.


6. Шпакловка за топлоизолация:

След монтажа на ръбохранителните ъгли следва шпакловка на фасадата. За шпакловане използваме шпакловка с фибри + стъклотекстилна армираща мрежа. За предотвратяване на напуквания по фасадата, мрежите се застъпват с по 5-10cm една с друга. Ъглите на прозорците от фасадата изискват допълнително подсилване с диагонално залепени парчета стъклотекстилна армираща мрежа. Това подсилване на ъгъла предотвратява последващи диагонални напуквания.

7. Подготовка на основата и грундиране

Преди нанасяне на мазилката всички повърхности задължително се грундират.

8. Полагане на мазилката



Адем Юсеинов

677
Преди да разгледаме полагането на различните видове декоративни мазилки, трябва да подчертаем, че е необходима добра предварителна подготовка, обмислена организация и технологичен план, защото изискване за получаване на качествена мазилка е да се осигури непрекъснат процес на полагане. Повърхността на дадена фасада се измазва в рамките на един работен ден, като се спазва принципът „мокро върху мокро“, а разтворът се полага с еднаква дебелина. Ако се допусне засъхване на вече измазан участък, границите му отчетливо ще личат и това не може да бъде избегнато чрез навлажняване преди продължаване на измазването. Това означава, че цялата фасада трябва да бъде достъпна от скеле, а мазилката да се полага на разположени в съседство полета от няколко опитни работници.

Сполучливо решение на проблема, особено при големи фасади и недостатъчен брой работници, е площта да се раздели на архитектурно оформени полета, които се измазват поотделно. Освен това за изравняване на разликите в цветовете нюанси, които се наблюдават по-често при драсканите мазилки и дължащи се на повърхностната обработка, на недобре подготвена основа с нееднаква попиваща способност или в резултат на атмосферни влияния, се препоръчва боядисване на мазилката с подходяща фасадна боя – силикатна или силиконова. Тя се нанася най-малко 14 дни след полагане на мазилката.

Вече стана дума, че цялото количество мазилка трябва да бъде от една и съща производствена партия, за да няма различия в оцветяването.

Мазилките не бива да се полагат при горещо време и силно слънчево греење, както и при температури по-ниски от 5 °C. За всички мазилки важи изискването да се работи с неръждаеми инструменти.

Дограма.

1. Монтажът на дограмата трябва да се осъществи, особено при ново строителство, при много добре оформени отвори, така че дограмата да не виси във въздуха седмици наред след поставянето ѝ в очакване майсторът да подзида отвора.

2. Поставянето на дограмата става чрез захващане на касите с рамкови метални дюбели към зида и цялостно уплътняване на прозореца с полиуретанова пяна като е нужно да се подчертае, че пяната се поставя, за да изолира влагата и температурата между прозореца и зида. Важно е да се напомни, че пяната не трябва да се пипа 24 ч. след приключване на монтажните работи.


3. Поставянето на дюбелите е задължително както при отваряемите, така и при неотваряемите части на дограмата. При бялата PVC дограма е препоръчително дюбелите да се поставят през 80/90 см, докато при цветната - на всеки 60/70 см.

4. Като всеки материал и PVC профилите се разширяват при постигането на определена температура. При нормални температурни условия цветните профили се разширяват до 2 мм на метър, затова при извършването на монтажа трябва да се предвидят от 1,5 до 2 см разстояние между касата и зида.

5. Шпакловането и затварянето на пяната отвън и отвътре не трябва да бъде отлагано повече от 2 до 3 седмици след поставянето ѝ.

6. Майсторите, които извършват довършителните работи около дограмата следва да уплътнят добре връзката на прозорците с зида отвън и около подпрозоречния перваз, за да не се просмуква влага през недобре уплътнените фуги при дъждовните месеци. В противен случай може да се появи мухъл.

7. Отстраняването на монтажното фолио по профилите е задължително след изтичането на 2 до 3 седмици след монтажа, в противен случай отлепването му става невъзможно, особено при цветна дограма.



Програма за осигуряване на качеството

Програмата за осигуряване на качеството трябва да бъде одобрена преди започването на Задачите по изпълнение на Договора и разработването на крайните продукти. Тя ще обхване всички изисквания и условия, поставени в договора за изпълнение на обществена поръчка между страните.

Програмата за осигуряване на качеството намира приложение в следните основни направления:

- 1) Осигуряване на качествено изпълнение на предмета на обществената поръчка;
- 2) Представяне на процедурите, по които ще се осъществява работата по Договора;
- 3) Представяне на Задачите по Договора;
- 4) Установяване на процедурите по управление, организация, докладване, планиране, валидиране и управление на промените;
- 5) Дефиниране на процеса на управление, подпомагане и разработване на крайните продукти.

С цел да се осигури навременното и адекватно изпълнение на резултатите непосредствено преди започването ще бъде съгласуван с Възложителя детайлен план-график на Задачите и съпътстващите ги Задачи при изпълнението на всеки компонент от Договора. Всяка Задача ще бъде извършвана в пряко взаимодействие и активна комуникация с Възложителя, за да се подсилят висококачествени резултати. Освен комуникативния подход за осигуряване на качествени и навременни резултати, Изпълнителя на Договора ще осигури и ДВА ЕТАПА с по ТРИ НИВА на качествен контрол при изпълнението на всяка Задача и постигането на всеки резултат.

1. ПЪРВИ ЕТАП - КОНТРОЛ В ХОДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧАТА

1.1. Първо Ниво - Осъществяване на контрол от Ръководителя на Договора и/или от съответния ръководител на съответния екип/звено;

1.2. Второ Ниво - Осъществяване на контрол от отговорните лица за качество на Изпълнителя, както и от вътрешните одитори на Изпълнителя одитиращи интегрираната система за управление на качество;

1.3. Трето Ниво - Осъществяване на контрол на място/офиса на Изпълнителя от отговорните лица на Възложителя и неговите представители, както и от трети страни

2. ВТОРИ ЕТАП - КОНТРОЛ ПРИ ВЕЧЕ ИЗПЪЛНЕНА ЗАДАЧА

2.1. Първо Ниво - Преди предоставяне на Възложителя и/или трети страни се Осъществява контрол от Ръководителя на Договора и/или от съответния ръководител на съответния екип/звено, така и от отговорните лица за качество на Изпълнителя;

2.2. Второ Ниво - При предоставяне на Задачата на Възложителя за съгласуване/одобряване от него и/или неговите представители, чиито ангажименти за съгласуване произтичат от договора и/или законодателството;

2.3. Трето Ниво - При предоставяне на Задачата на трети страни (компетентни органи, акредитирани лица и заинтересовани страни по смисъла на ЗУТ) за съгласуване или друго изисквано от законодателството и на които ангажимента произтича от законодателството.

Програмата за осигуряване на качеството следва да бъде одобрена от Възложителя преди започване на Задачата по изпълнение на Договора, като тя трябва да бъде изпълнявана както от Изпълнителя, така и от Възложителя. Одобрената финална версия на програмата за осигуряване на качеството се превръща в основен документ за управление на Договора.

Съгласно изискванията на Възложителя и за осигуряване правилното функциониране на системата за управление и контрол на качеството на обекта ще бъдат на разположение минимум екип от експерти за изпълнението на задачите, описани в техническите спецификации.

Мерки за намаляване и преодоляване затрудненията за обслужване дейността на живущите

Фирмата си поставя основна цел- да извърши договорените работи в срока по договора при създаване на най- малки неудобства за тях.

- Идентифицирани възможни затруднения за живущите в сградата:
- ◆ Стриктно спазване на сроковете за изпълнение с оглед освобождаване на обекта на определената дата, без удължаване на срока.

№	РИСК	МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
I	Оперативни РИСКОВЕ:	
1	Непълнота и неточности на Проектно сметната документация.	Изпълнителят има много голям опит в изпълнението на подобни обекти и разполага с високо квалифицирани специалисти по всички части на проекта. За всеки проблем, съгласуван с Надзора, ще предложи на Възложителя най-доброто решение, без да се нарушава графика за изпълнение на обекта.
2	Прекалено оптимистичен срок за изпълнение на СМР по проекта.	Изпълнителят ще отчита изпълнените СМР и дали те са в съответствие с линейния график на обекта. При различия на предвиденото, те ще бъдат отразявани на актуализиран график.
3	Осигуряване на безпрепятствен достъп за изпълнение на задълженията на законово регламентираните институции със специален режим до съответните части на обекта.	За избягване на рисковите ситуации Изпълнителят ще предостави своя одобрен от Инвеститора подробен график на всички институции със специален режим. При обективна промяна на графика същия ще бъде актуално представен на институциите. Строителят ще съдейства с възможностите си на институциите при възникнали ситуации.
II	Технически РИСКОВЕ	
1	Нарушаване технологичната последователност за изпълнение на обекта.	Изпълнителят ще изготви подробен график за изпълнението на обекта, съобразен с етапите на изпълнение. Ежеседмично на оперативни срещи с Възложителя и Надзора ще се отчита изпълнението на програмата за гарантиране спазване технологичната последователност и качеството на строителните работи. За всяка промяна в изпълнението Изпълнителят ще предостави коригирана програма съобразена с крайния срок на обекта.
III	Договорни РИСКОВЕ	
1	Неизпълнение на договорни условия на партньорите на Изпълнителя, вкл. Лошо качество на оставените материали или забавяне по време.	Изпълнителят разработва графици за доставка на материали, които стават неразделна част от договорите с доставчиците. При неизпълнение на ангажиментите, Строителят разполага с достатъчен брой алтернативни доставчици, които могат да доставят продуктите със същите технически параметри.

- Други мерки

№	РИСК	МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
I	Стратегически РИСКОВЕ:	
1	Риск по възможна смяна на политически приоритети при правителствени промени, или породен от външно политическо влияние. Пренасочване или забавяне на финансови ресурси.	Изпълнителят предвижда изграждането на обекта да се извърши в най-кратки срокове, с цел минимизиране на риска. Изпълнителят запазва строго професионално отношение към Обекта, без ненужни допълнителни политически инициативи.
2	Икономическа криза - промяна на цените на основните суровини и ресурси, енергийни източници.	Изпълнителят ще сключи договори за доставки на всички основни строителни материали и енергоизточници, веднага след сключване на Договора за Изпълнение на Обекта.
3	Риск от промяна на Нормативната Уредба, засягаща проекта.	Изпълнителят разполага с високо квалифициран персонал - ръководен, изпълнителски (в това число и юридически), за най-бърза адаптация в променени условия на изпълнение. Това ще гарантира изпълнение по срок и цена на Обекта.
II	Оперативни РИСКОВЕ:	
1	Трудности при координацията и съгласуването на изпълнението с различните експлоатационни дружества	Съгласувано с Наредба, преди започване на строителството ще се определят въпросите, изискващи координация с различните експлоатационни дружества, сроковете и отговорниците за изпълнението.
2	Риск за управление на процедурите, документите и финансовите средства по проекти от Европейския Съюз	Преди започване на същинските СМР Изпълнителят, заедно с Инвеститора и Консултанта ще се запознае с конкретиката относно ЕС процедурите на обекта и ще изготви списък с изискуемите документи, с цел обезпечаването им в оптимални срокове.
3	Разкриване по време на изпълнението на подземни инженерни мрежи, не отразени в проекта	Изпълнителят разполага с необходимата техника за откриване на подземни мрежи и тяхното най-точно маркиране върху терена. Преди започване на строителството, съвместно с Надзора ще се проведе среща с всички експлоатационни дружества за определяне изискванията им и контрола по време на строителството.
4	Пълно изпълнение на изискванията, произтичащи от НАРЕДБА за съществените изисквания към строежите и оценяване на строителните продукти и НАРЕДБА №3	Преди започване на строителството с Надзора определен за обекта ще се определи реда за представяне и одобрение на материалите за влагане в строителството; реда за съставяне, проверка и подписване на всички актове изискващи се за доказване съответствието на изпълнените работи с проекта и нормативните документи. Изпълнителят ще осигури на обекта необходимите специалисти с достатъчен опит за тази дейност.
5	Задължения, произтичащи от НАРЕДБА за минималните изисквания за здравословни условия на труд при	Изпълнителят ще назначи на обекта лице отговарящо за контрола и спазване на изискванията по ЗБУТ. Преди започване на строителството съвместно с Надзора ще се набележат конкретни

	извършване на СМР	мерки и задължения отнасящи се за обекта.
III	РИСК за репутация	
1	В процеса на взаимодействие с административни органи, медии и недобри връзки с обществеността е налице риск от негативни последствия за изпълнението на проекта	Изпълнителят ще поддържа възможно най- добри взаимоотношения с администрацията, медиите и обществото. Това става с подходящ избор на висококвалифициран управленски персонал и постоянна информираност на жителите, заинтересованите лица относно развитието на Обекта и възможните неудобства, които ще се създават по време на СМР.
2	Обществени високочувствителни мероприятия- тип „спиране на вода” Забава при изпълнението на ВиК мрежите и в частност при превключвания на водопровод.	Изпълнителят ще предостави базирани на линейния график всички необходими прозорци за спирането на водоподаването. Всички дата и времетраения ще бъдат съгласувани с ВиК и жителите ще бъдат предварително уведомени посредством медиите.
IV	Управленски РИСКОВЕ:	
1	Некомпетентност на служителите, неспазване на йерархичната структура, неосъществяване на вътрешен контрол, липса на екипност.	При създаване на предпоставки за този риск Изпълнителят налага разрешаване на проблема за кратък срок от конкретния екип, или прибегва до смяна с друг квалифициран такъв. Поради масовото естество на подобни обекти Строителят разполага с няколко екипа специализирани в такива дейности.
2	Напускане или отстраняване от работа по проекта на опитни експерти, които го познават добре.	Изпълнителят разполага с голяма база данни от специалисти в областта на Инфраструктурното строителство, а също така и с достатъчно голям брой висококвалифициран персонал в сферата на управление на подобни обекти. При създаване на подобен риск Строителят ще реагира много бързо с наемане на нов кадър или взаимстване на такъв от друг обект с по- нисък приоритет.
V	РИСКОВЕ за здравето и безопасността при работа:	
1	Удар от падащи предмети	Всички работници ще носят каски, а при необходимост и предпазни очила.
2	Пресилване при пренасяне на тежести	Тежките материали, инструменти, малка механизация ще се пренасят от повече работници. Задължително на обекта ще има аптечка с пресни медикаменти и превързочни средства.
3	Удар при маневриране на механизация или при стоене в неразрешения обсег на строителната машина	Строителната механизация се поддържа в изправност и работеща звукова и светлинна сигнализация.
4	Ел. Удар при работа в близост с небезопасни кабели или при изпълняване на изкоп механизирани в близост до кабели и при скъсването им.	Изкопните работи в непосредствена близост до електро, газопреносни, канализационни и други системи се изпълняват вечно и при осигуряване на допълнителен специализиран непосредствен надзор на изпълнението.

12/23

Мерки за замърсяване на околната среда

I. Емисии на вредни газове:

1. Ще бъде извършван периодичен надзор и преглед на използваната техника.
2. Ще бъдат инсталирани катализатори.
3. Ще се работи само с изправни и регулирани ДВГ.

II. Прах:

1. Ще бъдат извършвани периодични замервания на нивото на прах.
2. Транспортните средства и механизацията преди напускане на обекта ще бъдат почиствани.

III. Шум:

1. Движението на техниката ще се извършва по определени маршрути и няма да се допуска работа на празен ход.
2. Ще се прави периодична проверка и анализи на машините (котли, генераторни групи и др.), топлоизолацията на инсталациите, смазочните масла.

IV. Растителност:

1. Обезопасяване на съществуващите водопроводни и канализационни системи за предотвратяване на евентуални пробиви и разливи.
2. Предотвратяване на вреди върху фауната чрез контрол на достъпа до района на обитаване на сухоземни гръбначни животни и образуване на гнезда в района на действие.

Транспортирането на отпадъците ще се извършва по начин, който няма да възпрепятства тяхното последващо рационално оползотворяване и е в съответствие с международните правни актове за превоз на товари.

Всички товарни автомобили са закрити, което предпазва отпадъците от разпиляване по време на транспорт и осигурява безопасното им транспортиране. Превозването на отпадъци ще се извършва само с изправни превозни средства, снабдени с пожарогасител и чувал с пясък или пръст за своевременно почистване на евентуално допуснати разливи. Отпадъците ще се транспортират до специализирани сметища.

Автопаркът е съобразен с действащите екологични норми и няма замърсяване на въздуха с емисии над допустимите норми.

Технически мерки, предвиждащи изключване на възможността за въздействие на обекта върху компонентите на околната среда като:

- Ежедневно почистване на площадката и събиране на отпадъците в специално обозначен контейнер;
- Забрана за изгаряне в обекта на всякакъв вид отпадъци;
- Стриктно спазване правилата за безопасност при работа, използване на работно облекло и лични предпазни средства;
- Обозначение на съдовете и контейнерите за разделно събиране на приетите и третирани отпадъци.

КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО се осъществява при завършването на всяка технологична операция, както и по определените работни места в процеса на производството (строително-монтажни работи).



Адем Юсеинов

ТЕХНИЧЕСКИЯТ РЪКОВОДИТЕЛ на съответният обект осъществява контрол за съответствие типа на продукта, целостта на опаковката, видими повреди и наличието на придружаващи документи.

БРИГАДИРЪТ НА БРИГАДАТА проверява периодично качествено изпълнение на строително-монтажните работи извършени от членовете на бригадата и следи за спазване изискванията в техническата документация (ТД), и информира техническия ръководител.

ТЕХНИЧЕСКИЯТ РЪКОВОДИТЕЛ, ИЗВЪРШВА ПОСТОЯНЕН КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВЕНОТО изпълнение на строително-монтажните работи на ръководените от него бригади и следи за правилното протичане на производствения процес.

КОНТРОЛЪТ ПРИ СМР (строително-монтажните работи) се извършва чрез измерване и сравняване, съгласно изискванията определени в Технологични инструкции за отделните видове СМР.

КРАЙНИЯТ КОНТРОЛ ЗА ИЗПИТВАНЕ в ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е указан в инструкции за отделните видове СМР;

Контролът на влаганите в строежа строителни продукти се осъществява от консултанта при извършване оценката на съответствие на инвестиционните проекти и при упражняване на строителен надзор по реда на ЗУТ.

Качеството на изпълнените СМР и замерването им се извършва съгласно изискванията на Правилата за изпълнение и приемане на СМР и изискванията в предоставените чертежи

План - графикът е обезпечена с необходимия и оптимален човешки и машинен ресурс, като е спазено условието за непрекъснатост и последователност при изпълнение на отделните СМР.

Ако по непредвидени обстоятелства (лоши метеорологични условия, аварии и др.) се получи изоставане от графика имаме ресурсите и възможността да се преминем на шестдневна работна седмица с цел спазване на срока на изпълнение на поръчката по договор.

Етап на управление на договора

Процесът по управление на договора е представен в приложената по – горе тблица. С цел да избегнем повторенията няма да описваме наново етапите включени в управлението на договора.

Етап на приключване

При завършване на договора ще изготвим окончателен доклад за изпълнението.

При реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания


В съответствие с действащото в страната законодателство, съгласно Наредба №3 за тази категория строежи ще се съставят следните актове и протоколи:

1. Протокол за предаване и приемане на одобрения проект и разрешение за строеж за изпълнение на конкретния строеж - **Приложение № 1**

2. Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво - **Приложение № 2** (Изм., ДВ, бр. 37 от 2004 г., изм., ДВ, бр. 29 от 2006 г.) и **Приложение №2а** (Ново, ДВ, бр. 29 от 2006 г.)

3. Констативен акт за установяване съответствието на строежа с издадените

Адем Юсеинов



32

4. Заповедна книга на строежа - Приложение № 4

5. Акт за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения инвестиционен проект и даване на основен репер на строежа - Приложение №5

6. Акт за приемане на земната основа и действителните коти на извършените изкопни Работи - Приложение № 6

7. Акт за приемане на извършените СМР по нива и елементна строителната конструкция - Приложение №7 (Доп., ДВ, бр. 29 от 2006 г.)

8. Акт за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта - Приложение №12

9. Акт за приемане на конструкцията - Приложение № 14

10. Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа/част, етап от него - Приложение № 15

11. Протокол за установяване годността за ползване на строежа - Приложение №16

Всички актове и протоколи се подписват съгласно изискванията.

При изпълнение на всички видове СМР по договора ще следваме следните вътрешни изисквания:

- Пълно съдействие при взимането на проби от акредитираната лаборатория;
- Извършване на всички необходими лабораторни изпитвания съгласно ТС на материалите, влагани в обекта;
- Извършване всички необходими геодезически измервания;
- Информирание на Възложителя /или неговия представител/ за възникнали проблеми при изпълнение на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване;
- Изготвяне на екзекутивна документация за целия строителен процес за периода на изпълнение на договорното споразумение;

2

29



Адем Юсеинов



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ОБРАЗЕЦ №12

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции

Обособена позиция № 23. Многофамилна жилищна сграда – блок № 45 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Еленово”

От:

"ЕВРОСИСТЕМ" ЕООД

(наименование на участника)

с адрес: гр. Кричим, ул. "Кирил и Методий" № 44

тел.: 0897 995 400, факс, e-mail: evrosistem@abv.bg

регистриран по ф.д. № _____ / _____ г. по описа на _____ съд,
ЕИК / Булстат: 160086706,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

I. Ние предлагаме да изпълним поръчката за обща цена в размер на 882 202,39 лв. (осемстотин осемдесет и две хиляди дваеста и два лева и тридесет и девет стотинки) без ДДС или 1 058 642,87 лв. (един милион петдесет и осем хиляди шестстотин четирдесет и два лева и осемдесет и седем стотинки) с ДДС, както следва:

За изготвяне на работен проект по всички части: 45 680,00 лв. (четирдесет и пет хиляди шестстотин и осемдесет лева) без ДДС или 54 816,00 лв. (петдесет и четири хиляди осемстотин и шестнадесет лева) с ДДС; (В предлаганата цена за изготвяне на работните проекти, Участникът следва да калкулира всички разходи включително и тези за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта)

За изпълнение на СМР 760 474,90 лв. (седемстотин и шестдесет хиляди четиристотин седемдесет и четири лева и десетдесет стотинки) без ДДС или 912 569,88 лв. (деветстотин и дванадесет хиляди петстотин шестдесет и десет лева и осемдесет и осем стотинки) с ДДС съгласно приложените КСС.

Както и 76 047,49 лв. без ДДС или 91 256,99 лв. с ДДС представляващи **непредвидени разходи*** по време на изпълнение на СМР. (Непредвидените разходи следва да са в размер на максимум 10% от стойността на СМР) *Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по програмата.

II. Елементи на ценообразуване за видовете РСМР са както следва:

- | | |
|--|--------------|
| 1. П1 – Средна часова ставка | 2,70 лв./час |
| 2. П2 - Допълнителни разходи върху труд | 95 % |
| 3. П3 – Допълнителни разходи върху механизация | 30 % |
| 4. П4 – Доставно -складови разходи | 6 % |
| 5. П5 – Печалба | 7 % |

Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите и нормативите за такъв вид РСМР, предвижданията и изискванията на Документацията за участие, предложените от нас условия за изпълнение на РСМР, проектодоговора, както и всички законови изисквания за осъществяване на строителство на обекти от вида и обема предмет на горепосочената обществена поръчка.

*посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на строителните работи в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.

Име и фамилия: Адем Юсеинов

Длъжност: Управител

Подпис и печат:



ВАЖНО!!!

Участникът изготвя работните проекти съгласно техническият паспорт и енергийното обследване. При изготвяне на ценовата оферта Участникът следва да предвиди в Количествено стойностните сметки всички задължителни мерки предписани в техническият паспорт и енергийното обследване, както и съпътстващите ги дейности.

*Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект




О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Всяка страница от ценовото предложение трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

При оферирание на цена над прогнозната УЧАСТНИКЪТ ще бъде отстранен от участие в процедурата.

ЗАБЕЛЕЖКА:: Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен - ПЛИК №3 .



Адем Юсейнов

Обект: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции

Обособена позиция № 23. Многофамилна жилищна сграда – блок № 45 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Еленово”


КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Видове работи	мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
I	Проектиране				
1	Изготвяне на проекти и авторски надзор	бр.	1,00	45 680,00	45 680,00
	Общо проектиране без ДДС:				45 680,00
II	СМР				
1	Направа на варо - циментова мазилка по комини	м2	42,00	34,20	1 436,40
2	Направа нова бетонова шапка за комин	бр	8,00	890,00	7 120,00
3	Почистване на корозията по армировката и нейната защита	компл.	1,00	16 250,00	16 250,00
4	Обработка на местата с нарушено бетонно покритие и обрушен бетон и обмазване със лепилни разтвори	компл.	1,00	17 690,00	17 690,00
5	Усилващи и укрепващи мерки по сутеренната стена на Блок №45 вход Б, по северната фасада и по сутеренната стена на източната фасада при Блок №45 вход А	компл.	1,00	13 890,00	13 890,00
6	Укрепване на неукрепени тухлени зидове и страници по тераси	компл.	1,00	6 800,00	6 800,00
7	Усилване на отвори	компл.	1,00	5 230,00	5 230,00
8	Демонтаж на водосточни тръби	м'	38,00	12,60	478,80
9	Доставка и монтаж на водосточни тръби	м'	38,00	39,50	1 501,00
10	Подмянат водопроводните щрангове до водомер и хоризонталните водопроводни щрангове в сутерена	компл.	1,00	29 800,00	29 800,00
11	Мерки по пожарна безопасност	компл.	1,00	15 890,00	15 890,00
12	Фасадно скеле	м2	1 985,00	8,60	17 071,00
13	Очукване на външна мазилка	м2	1 230,00	9,20	11 316,00
14	Външна мазилка	м2	1 230,00	28,60	35 178,00
15	Топлоизолационна система по фасади	м2	2 697,00	92,40	249 202,80
16	Обшивка с ламарина	м2	150,00	35,89	5 383,50
17	Топлоизолационна система по тавана на сутерена	м2	474,00	73,20	34 696,80
18	Демонтаж на технически съоръжения	компл.	1,00	1 600,00	1 600,00
19	Доставка и полагана на топлоизолация с XPS по покрив	м2	474,00	62,80	29 767,20
20	Доставка и полагане на замазка по покрив	м2	474,00	29,80	14 125,20
21	Доставка и полагане на хидроизолация по покрив	м2	474,00	45,60	21 614,40
22	Монтаж на технически съоръжения	компл.	1,00	1 680,00	1 680,00
23	Демонтаж на дограма	м2	572,00	26,20	14 986,40
24	Доставка и монтаж на PVC дограма с пола	м2	566,00	289,60	163 913,60
25	Доставка и монтаж на алуминиева дограма	м2	6,00	285,70	1 714,20
26	Демонтаж осветителни тела	бр	22,00	11,20	246,40

ЕВРОСИСТЕМ
ООД
Адем Юсеинов

№	Видове работи	мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
27	Доставка и монтаж на енергоспестяващо осветително тяло	бр	22,00	98,60	2 169,20
28	Направа на лампен излаз	бр	22,00	84,50	1 859,00
29	Направа на мълниезащитна инсталация	компл.	1,00	37 865,00	37 865,00
	Общо СМР без ДДС:				760 474,90
	Непредвидени 10:				76 047,49
	Всичко СМР без ДДС:				836 522,39
	ВСИЧКО БЕЗ ДДС:				882 202,39

Подпис и печат:




Адем Юсеинов

